

X15

671-2022-SYE



Cálidda

CÓDIGO DEL PROYECTO: PPE0-21-1075, 1076, 1078-1085

Lima, 28 de Noviembre de 2022

Señores

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Presente.

Asunto : Solicitamos autorización para la ejecución de obras del proyecto denominado "**CAL - SECTOR 001701 MALLA 002 ET02 - SECTOR 2303 MALLA 001, 003 - SECTOR 002304 MALLA 001, 002 ET02, 003 ET02 - SECTOR 003203 MALLA 001 ET02, 002, 003 ET03, 004 ET03**".

Radicado : R2022-063911

De nuestra consideración:

Gas Natural de Lima y Callao S.A. - Cálidda, identificada con RUC N° 20503758114, debidamente representada por su apoderado el Señor Roberto Franco Gianoli Hanke, Identificado con DNI N° 10609610, con poderes inscritos en la partida electrónica N° 11352499 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, ante usted respetuosamente, nos presentamos y decimos:

Que, en el marco del proyecto de masificación del servicio público de gas natural promovido por el Gobierno Central (Proyecto Camisea) y en base a lo establecido en la Ley N° 30056, comunicamos la interferencia de vías para la ejecución de obras del proyecto denominado "**CAL - SECTOR 001701 MALLA 002 ET02 - SECTOR 2303 MALLA 001, 003 - SECTOR 002304 MALLA 001, 002 ET02, 003 ET02 - SECTOR 003203 MALLA 001 ET02, 002, 003 ET03, 004 ET03**", ubicado en el distrito de **Callao**, tal como se detalla en los planos de ubicación, memoria descriptiva y cronograma de obra que se adjuntan.

Es así que de acuerdo al Decreto Supremo N° 042-99-EM (Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos), el concesionario de distribución podrá abrir los pavimentos, calzadas y aceras de las vías públicas que se encuentren dentro del área de concesión, previa notificación a la Municipalidad respectiva, quedando obligado a efectuar la reparación que sea menester dentro del plazo otorgado por dicha Municipalidad.

Por su parte, informamos la contratación de la empresa **Comercializadora S&E Perú SAC** identificada con **RUC N° 20511535612** para la elaboración de dichos trabajos, contando como responsable por parte de la empresa contratista con el Ingeniero John Campos Castillo, con registro del Colegio de Ingenieros N°48335; asimismo, nuestra representada designa como persona responsable al ingeniero Raúl García con registro del Colegio de Ingenieros N°64179.

En ese sentido, en conformidad con lo dispuesto en el numeral 126.1 del artículo 126° del TUO de la Ley N° 27444, otorgamos poder general para efectos de la tramitación ordinaria de este procedimiento al señor **EDER RULY MERA LEÓN** identificado con DNI N° 10214048 y/o **URI MERA LEON** con DNI N° 08715163, a fin de que, en nombre y representación de nuestra empresa, pueda realizar las gestiones correspondientes hasta la finalización del proyecto.



Asimismo, señalamos que de acuerdo con el numeral 20.4 del artículo 20° del TUO de la Ley N° 27444, vuestro despacho nos podrá notificar a los siguientes correos electrónicos:

- casilla.electronica@proveedores.calidda.com.pe
- Gestion.Permisos@calidda.com.pe
- emera@meraasesores.com

POR LO EXPUESTO

Presentamos la presente comunicación para los fines pertinentes y en el marco de la normativa aplicable.

Atentamente,

Firmado Digitalmente por:
ROBERTO FRANCO GIANOLI
HANKE
Fecha: 29/11/2022 14:57:01

Roberto Franco Gianoli Hanke
Sub Gerente Legal



RED DE DISTRIBUCIÓN EN PE
PROYECTO CALLAO: ETAPAS

Id	Nombre de tarea	Duración	Ene 1, 2023		
			ene	feb	mar
1	CALLAO:	30 días			
2	ETAPA 05: SECTOR 002304 MALLAS 002 ET 02	8 días			
3	PERIMETRO EXTERNO	8 días			
4	CA S/N FRENTE A MZ B	8 días			
5	CA S/N FRENTE A MZ B	8 días			
6	CA S/N FRENTE A MZ B	8 días			
7	CA S/N FRENTE A MZ B	8 días			
8	RECORRIDO INFORMATIVO	2 días			
9	SEÑALIZACIÓN	5 días			
10	CALICATAS, EXCAVACIÓN Y TENDIDO DE TUBERÍA	5 días			
11	RELLENO Y COMPACTACIÓN	5 días			
12	REPOSICIÓN Y LIMPIEZA	5 días			
13	PRUEBA Y GASIFICACIÓN	3 días			
14	ETAPA 06: SECTOR 002304 MALLAS 003 ET 02	12 días			
15	PERIMETRO INTERNO	12 días			
16	Av. LOS ALISOS - Av. LOS OLIVOS - CA S/N - CA LOS ALISOS - CA S/N - CA S/N	12 días			
17	PERIMETRO EXTERNO	12 días			
18	AV LOS ALISOS FRENTE A MZ A, E, A, C	12 días			
19	AV LOS OLIVOS FRENTE A MZ C, B, A, C	12 días			
20	CA LOS ALISOS FRENTE A MZ E, C, B	12 días			
21	RECORRIDO INFORMATIVO	2 días			
22	SEÑALIZACIÓN	8 días			
23	CALICATAS, EXCAVACIÓN Y TENDIDO DE TUBERÍA	8 días			
24	RELLENO Y COMPACTACIÓN	8 días			
25	REPOSICIÓN Y LIMPIEZA	8 días			
26	PRUEBA Y GASIFICACIÓN	4 días			
27	ETAPA 07: SECTOR 002303 MALLAS 001	10 días			
28	PERIMETRO INTERNO	10 días			
29	Av... LOS ALISOS - CA. S/N - CA. S/N. - CA S/N - Av. LOS OLIVOS	10 días			
30	PERIMETRO EXTERNO	10 días			
31	AV LOS ALISOS FRENTE A MZ D	10 días			
32	AV LOS OLIVOS FRENTE A MZ D, F, E, C, A	10 días			
33	CA S/N FRENTE A MZ C, H	10 días			
34	RECORRIDO INFORMATIVO	2 días			
35	SEÑALIZACIÓN	6 días			
36	CALICATAS, EXCAVACIÓN Y TENDIDO DE TUBERÍA	6 días			
37	RELLENO Y COMPACTACIÓN	6 días			
38	REPOSICIÓN Y LIMPIEZA	6 días			
39	PRUEBA Y GASIFICACIÓN	4 días			
40	ETAPA 08: SECTOR 002304 MALLAS 001	12 días			
41	PERIMETRO INTERNO	12 días			
42	CA LOS ALISOS- CA S/N - CA LOS ROSALES - CA S/N - CA LAS MAGNOLIAS - CA S/N - CA LOS EUCALIPTOS - CA S/N	12 días			
43	PERIMETRO EXTERNO	12 días			
44	CA LOS ALISOS FRENTE A MZ D, A	12 días			
45	CA LOS ROSALES FRENTE A MZ A, F, F	12 días			
46	CA LAS MOGNALIS FRENTE A MZ A, B, D, H	12 días			
47	CA LOS EUCALIPTOS FRENTE A MZ F, A, D, C, B	12 días			
48	RECORRIDO INFORMATIVO	2 días			
49	SEÑALIZACIÓN	8 días			
50	CALICATAS, EXCAVACIÓN Y TENDIDO DE TUBERÍA	8 días			
51	RELLENO Y COMPACTACIÓN	8 días			
52	REPOSICIÓN Y LIMPIEZA	8 días			
53	PRUEBA Y GASIFICACIÓN	4 días			
54	ETAPA 09: SECTOR 002303 MALLAS 003	8 días			
55	PERIMETRO INTERNO	8 días			
56	CA S/N – CA. S/N - CA. S/N. - CA S/N	8 días			
57	PERIMETRO EXTERNO	8 días			
58	CA S/N FRENTE A MZ J, D, E,	8 días			
59	CA S/N FRENTE A MZ C	8 días			
60	CA S/N FRENTE A MZ I, D, B, A, E, A	8 días			
61	RECORRIDO INFORMATIVO	2 días			
62	SEÑALIZACIÓN	5 días			
63	CALICATAS, EXCAVACIÓN Y TENDIDO DE TUBERÍA	5 días			
64	RELLENO Y COMPACTACIÓN	5 días			
65	REPOSICIÓN Y LIMPIEZA	5 días			
66	PRUEBA Y GASIFICACIÓN	3 días			

PROYECTO: REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO


Tarea		Hito externo		Manual :
División		Inactive Task		Manual :
Hito		Inactive Milestone		Start-on
Resumen		Inactive Summary		Finish-o
Resumen del proyecto		Manual Task		Progres
Tareas externas		Duration-only		Fecha lí

JOHN ROBINSON CAMPOS CASTILLO
INGENIERO CIVIL
REG. SIP. N° 48335


RED DE DISTRIBUCIÓN EN PE
PROYECTO CALLAO: ETAPAS

Id	Nombre de tarea	Duración	dic '22					ene '23					feb '23		
			21	28	5	12	19	26	2	9	16	23	30	6	
1	CALLAO:	30 días													
2	ETAPA 01: SECTOR 003203 MALLAS 001 ET 02	15 días													
3	PERIMETRO INTERNO	15 días													
4	Av. SANTA ROSA - Av.. PACASMAYO - CA. S/N- CA S/N- Av. ALEJANDRO BERTELLO	15 días													
5	PERIMETRO EXTERNO	15 días													
6	AV SANTA ROSA FRENTE A MZ A,H	15 días													
7	RECORRIDO INFORMATIVO	2 días													
8	SEÑALIZACIÓN	10 días													
9	CALICATAS, EXCAVACIÓN Y TENDIDO DE TUBERÍA	10 días													
10	RELLENO Y COMPACTACIÓN	10 días													
11	REPOSICIÓN Y LIMPIEZA	10 días													
12	PRUEBA Y GASIFICACIÓN	5 días													
13	ETAPA 02: SECTOR 003203 MALLAS 002	15 días													
14	PERIMETRO INTERNO	15 días													
15	AV. LOS ALISOS- AV. PACASMAYO - CA. S/N- AV. 200 MILLAS- CA S/N.	15 días													
16	PERIMETRO EXTERNO	15 días													
17	AV LOS ALISOS FRENTE A MZ A, A	15 días													
18	AV 200 MILLQAS FRENTE A MZ A, B	15 días													
19	AV SANTA ROSA FRENTE A MZ E, C, D, C, B, A	15 días													
20	AV PACASMAYO FRENTE A MZ A, H, C	15 días													
21	CRUCE AV. PACASMAYO ALTURA CA. S/N	15 días													
22	RECORRIDO INFORMATIVO	2 días													
23	SEÑALIZACIÓN	10 días													
24	CALICATAS, EXCAVACIÓN Y TENDIDO DE TUBERÍA	10 días													
25	RELLENO Y COMPACTACIÓN	10 días													
26	REPOSICIÓN Y LIMPIEZA	10 días													
27	PRUEBA Y GASIFICACIÓN	5 días													
28	ETAPA 03: SECTOR 001701 MALLA 002 ET 02	10 días													
29	PERIMETRO EXTERNO	10 días													
30	CA S/N FRENTE A MZ D, B	10 días													
31	CA S/N FRENTE A MZ B	10 días													
32	CA S/N FRENTE A MZ E	10 días													
33	AV LOS ALISOS FRENTE A MZ D	10 días													
34	AV PACASMAYO FRENTE A MZ B, B	10 días													
35	RECORRIDO INFORMATIVO	2 días													
36	SEÑALIZACIÓN	5 días													
37	CALICATAS, EXCAVACIÓN Y TENDIDO DE TUBERÍA	5 días													
38	RELLENO Y COMPACTACIÓN	5 días													
39	REPOSICIÓN Y LIMPIEZA	5 días													
40	PRUEBA Y GASIFICACIÓN	5 días													
41	ETAPA 04: SECTOR 003203 MALLAS 003-004	11 días													
42	PERIMETRO INTERNO	11 días													
43	Av.. PACASMAYO – Av.. LOS ALISOS - CA. S/N - CA. S/N - Av. SANTA ROSA	11 días													
44	PERIMETRO EXTERNO	11 días													
45	AV PACASMAYO FRENTE A MZ D, E, F, G, F, F	11 días													
46	CA S/N FRENTE A MZ A, D, G, D	11 días													
47	CA S/N FRENTE A MZ D	11 días													
48	RECORRIDO INFORMATIVO	2 días													
49	SEÑALIZACIÓN	6 días													
50	CALICATAS, EXCAVACIÓN Y TENDIDO DE TUBERÍA	6 días													
51	RELLENO Y COMPACTACIÓN	6 días													
52	REPOSICIÓN Y LIMPIEZA	6 días													
53	PRUEBA Y GASIFICACIÓN	5 días													

PROYECTO: REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO

Tarea		Inactive Summary	
División		Manual Task	
Hito		Duration-only	
Resumen		Manual Summary Rollup	
Resumen del proyecto		Manual Summary	
Tareas externas		Start-only	
Hito externo		Finish-only	
Inactive Task		Progreso	
Inactive Milestone		Fecha límite	


JOHN ROBINSON CAMPOS CASTILLO
INGENIERO CIVIL
REG. SIP. N° 48335

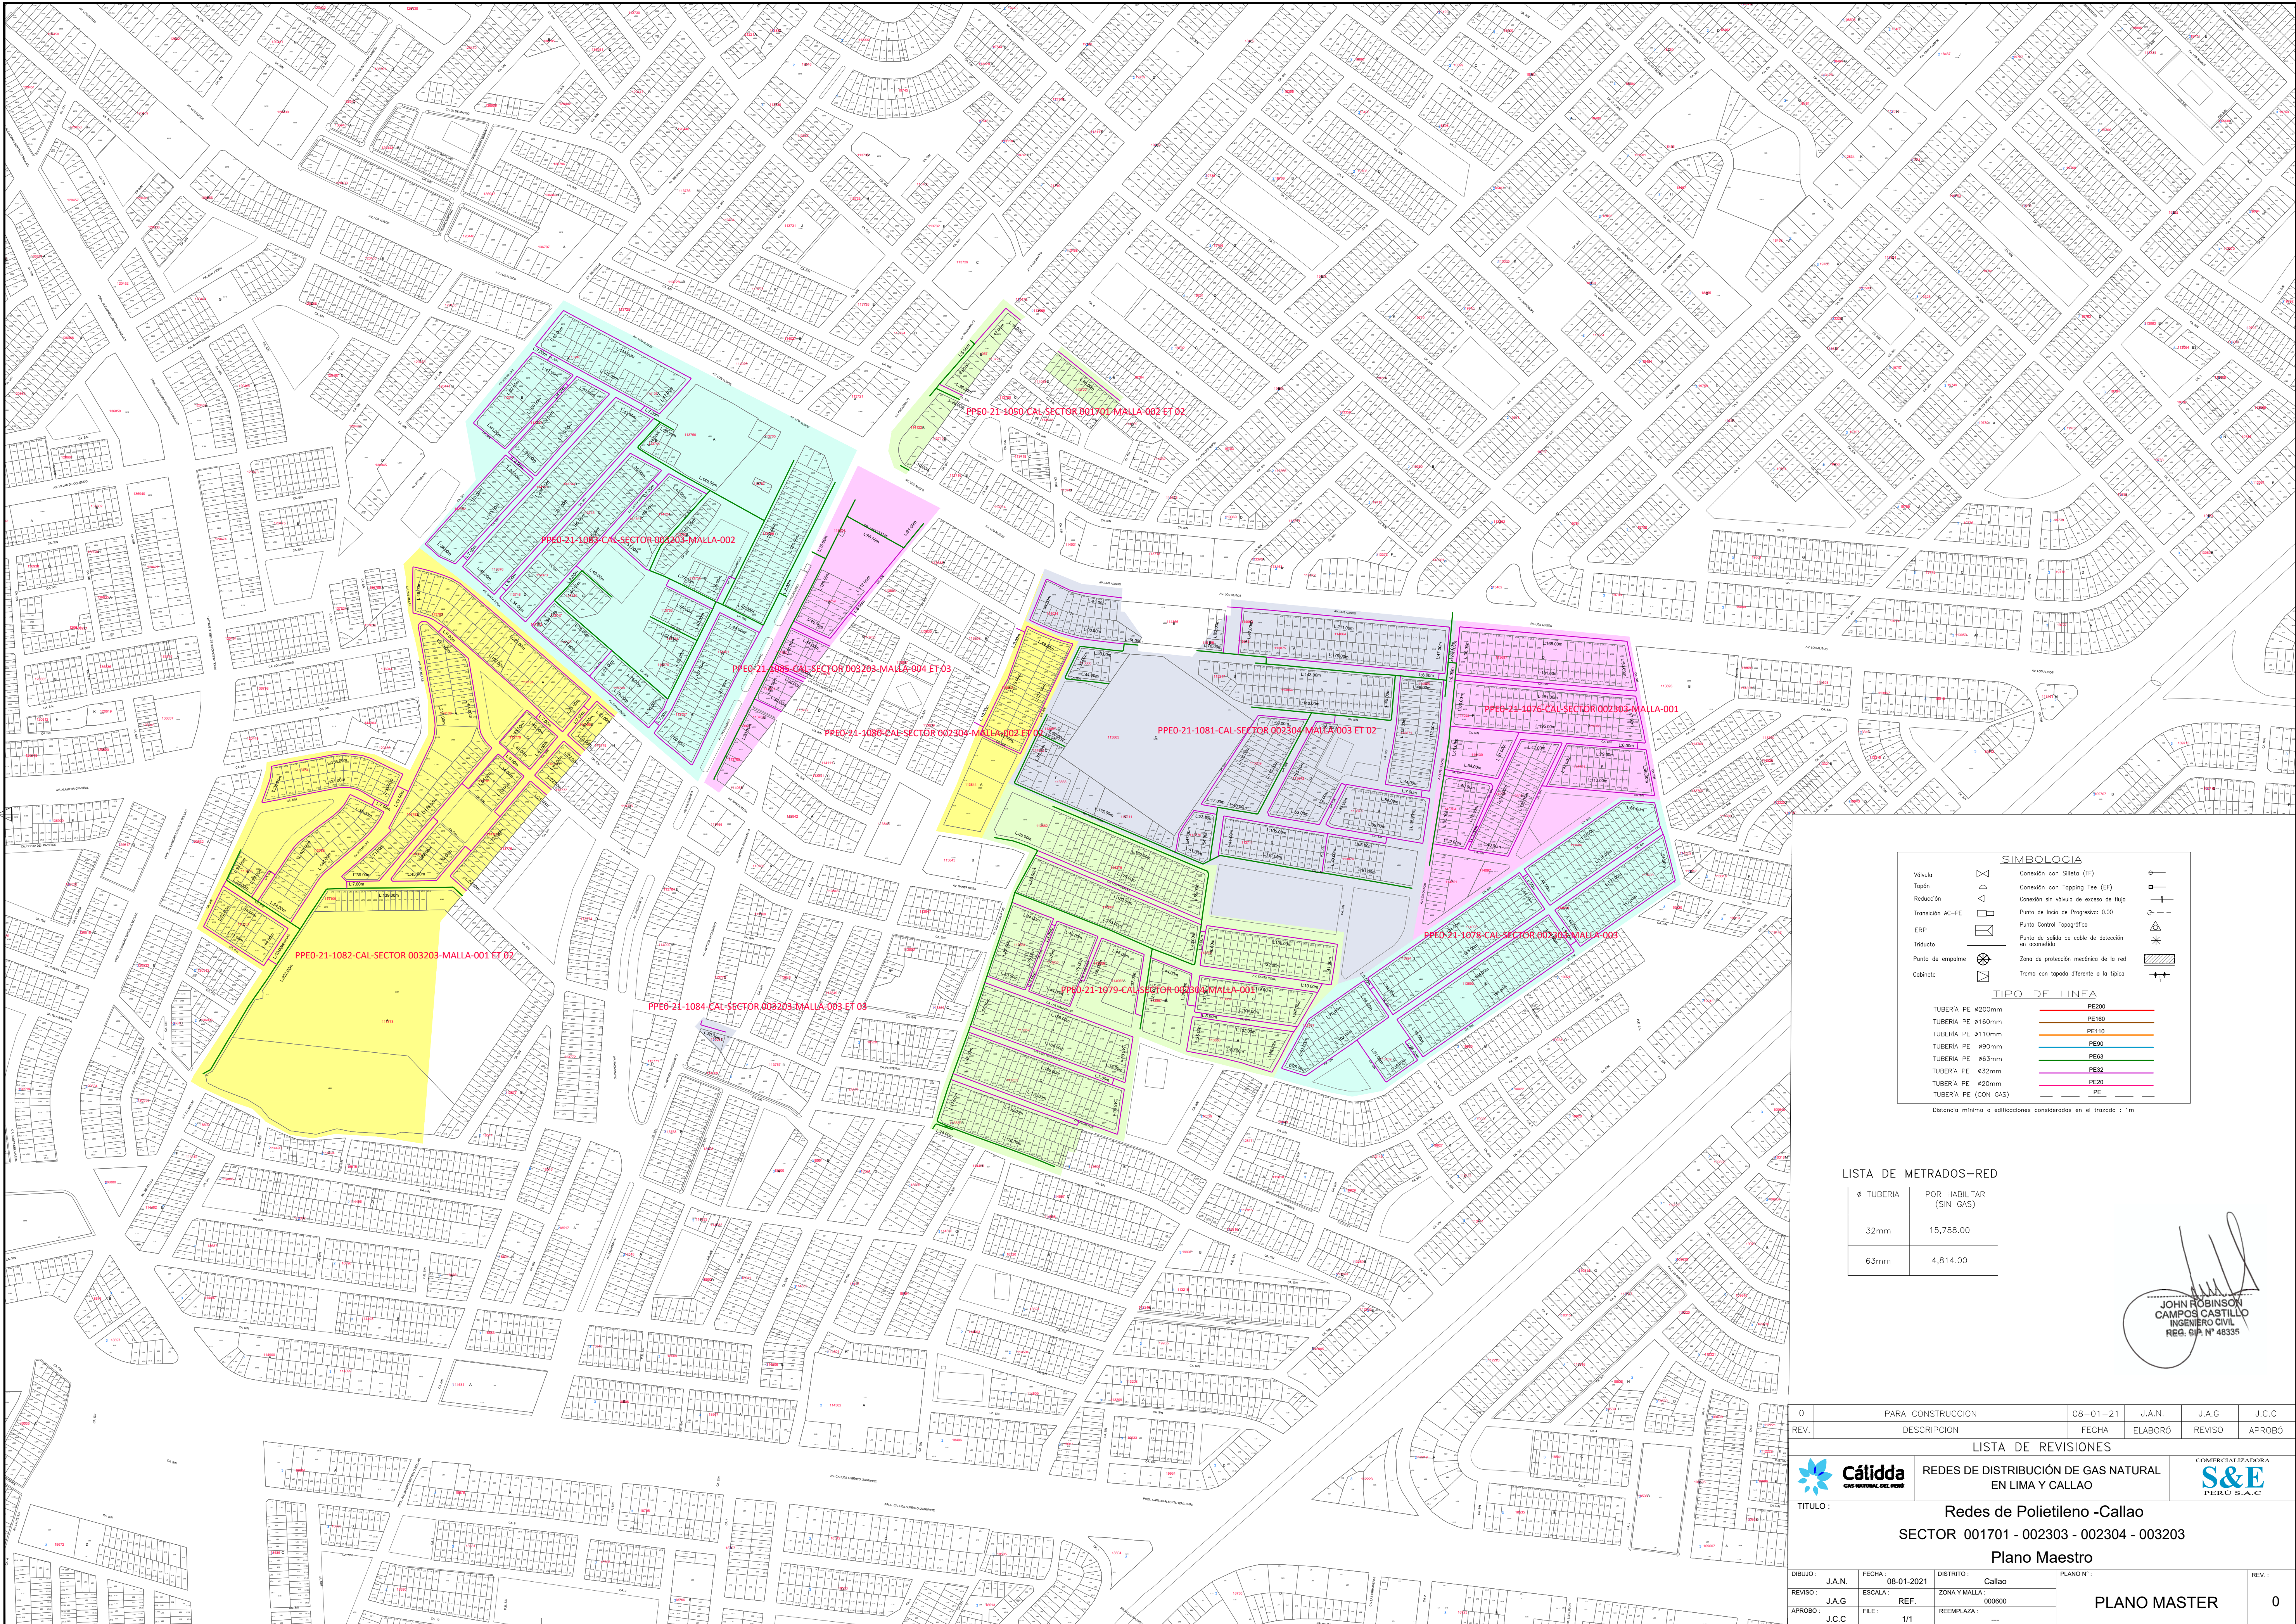

SIMBOLOGIA

Válvula		Conexión con Sileta (TF)	
Tapón		Conexión con Tapping Tee (EF)	
Reducción		Conexión sin válvula de exceso de flujo	
Transición AC-PE		Punto de inicio de Progresivo: 0.00	
ERP		Punto Control Topográfico	
Triducto		Punto de salida de cable de detección en acometida	
Punto de empalme		Zona de protección mecánica de la red	
Gabinete		Tramo con tapado diferente a la típica	

TIPO DE LINEA

TUBERIA PE #200mm	PE200
TUBERIA PE #160mm	PE160
TUBERIA PE #110mm	PE110
TUBERIA PE #90mm	PE90
TUBERIA PE #63mm	PE63
TUBERIA PE #32mm	PE32
TUBERIA PE #20mm	PE20
TUBERIA PE (CON GAS)	PE

Distancia mínima a edificaciones consideradas en el trazado : 1m

LISTA DE METRADOS-RED

Ø TUBERIA	POR HABITAR (SIN GAS)
32mm	15,788.00
63mm	4,814.00

JOHN ROBINSON
CAMPOS CASTILLO
INGENIERO CIVIL
REG. G.P. N° 48335

PARA CONSTRUCCION		08-01-21	J.A.N.	J.A.G	J.C.C				
REV.	DESCRIPCION	FECHA	ELABORÓ	REVISO	APROBÓ				
LISTA DE REVISIONES									
 Cálidda COMERCIALIZADORA DEL PERU		REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL EN LIMA Y CALLAO		COMERCIALIZADORA S&E PERU S.A.C					
TITULO :									
Redes de Polietileno -Callao									
SECTOR 001701 - 002303 - 002304 - 003203									
Plano Maestro									
DIBUJO:	J.A.N.	FECHA:	08-01-2021	DISTRITO:	Callao	PLANO N°:	PLANO MASTER	REV.:	0
REVISO:	J.A.G	ESCALA:	REF.	ZONA Y MALLA:	000600				
APROBÓ:	J.C.C	FILE:	1/1	REEMPLAZA:	---				
