

Cargo de Recepción



Firmado digitalmente por:
ventanillavirtual.osinerghmin.gob.pe
Motivo: Cargo de
Recepción
Fecha: 28/04/2023 23:17:13-0500

Su documento ha sido ingresado satisfactoriamente, por favor tome nota del número de expediente generado para realizar el seguimiento correspondiente.

Número de expediente: 202300100654 Fecha y hora de presentación: 28/04/2023 23:17

RUC: 20503758114

Nombre/Razón social: GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO S.A.

Correo electrónico: Casilla.Electronica@proveedores.calidda.com.pe

Nro. telefónico: 994571824

Documento: CARTA - 2023-111239 Nro. Folios: 2

Asunto: PPE0-23-0229 Inicio de construcción – Proyecto Ext. de Red a Av Nicolas de Rivera Cdr 5 Sector 0200 Malla 06 ubicado en el distrito de San Isidro.

Anexos: SI

Tipo	Documento	Nombre	Folio	Peso
Documento Principal	OSI-2023-111239_28042023231633.pdf	PPE0-23-0229 Inicio de construcción – Proyecto Ext. de Red a Av Nicolas de Rivera Cdr 5 Sector 0200 Malla 06 ubicado en el distrito de San Isidro.	2	230 Kb
Anexo	OSI-2023-111239_1_28042023231654.zip	Adjunto de archivo - OSI-2023-111239.pdf con fecha 2023-04-28	1	19 Mb

Usted podrá hacer el seguimiento de su trámite a través de <https://consultaexpedientes.osinerghmin.gob.pe/consulta-docs/>, de tener alguna consulta puede efectuarla a través de: ventanillavirtual@osinerghmin.gob.pe

ATENCIÓN: Usted se encuentra afiliado al Sistema de Notificaciones Electrónicas del Osinerghmin - SNE, cualquier notificación se realizará por ese medio, exceptuando las Solicitudes de Acceso a la Información Pública, cuya atención se realizará por el canal seleccionado.

En caso el cliente registrado en el formulario virtual corresponda a un tercero (persona natural o jurídica distinta al solicitante del trámite), el Osinerghmin creará una casilla electrónica de oficio al solicitante en la cual se realizará toda notificación.

Para ingresar a su casilla electrónica, actualizar sus datos y/o revisar sus notificaciones, sírvase ingresar al siguiente link: <https://notificaciones.osinerghmin.gob.pe/>


NOTA IMPORTANTE:

Para fines del cómputo de plazos, los documentos presentados los sábados, domingos y feriados o cualquier otro día inhábil, se consideran presentadas al primer día hábil siguiente.

El cargo de recepción del expediente no significa aceptación, aprobación o autorización al ejercicio de alguna actividad sujeta a supervisión o fiscalización del Osinerghmin, resultando de aplicación lo dispuesto en los numerales 33.2 y 136.6 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.


CRONOGRAMA DE OBRA DISTRITO DE SAN ISIDRO

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	do	lu	ma	ju	vi	sá	do	lu	ma	ju	vi	sá	do	lu	ma	ju	vi	sá	do	lu	ma	ju	vi	sá	do	lu	ma	ju
1	ACTIVIDADES - DISTRITO DE SAN ISIDRO	45 días	lun 29/05/23	mié 12/07/23																												
2	PPE0-23-0229 - SIS – SECTOR 000200 MALLA 006 EXT. DE RED A AV. NICOLAS DE RIVERA CDR 5	45 días	lun 29/05/23	mié 12/07/23																												
3	Recorrido informacion y Difusión	2 días	lun 29/05/23	mar 30/05/23																												
4	Replanteo de trazo	2 días	mié 31/05/23	jue 1/06/23																												
5	Señalización	42 días	mié 31/05/23	mar 11/07/23																												
6	Calicatas	11 días	mié 31/05/23	sáb 10/06/23																												
7	Corte y Demolición	19 días	jue 1/06/23	lun 19/06/23																												
8	Excavación	19 días	jue 1/06/23	lun 19/06/23																												
9	Tendido de tuberías	19 días	jue 1/06/23	lun 19/06/23																												
10	Relleno y Compactacion	19 días	jue 1/06/23	lun 19/06/23																												
11	Acabado vereda y/o pista (resane)	19 días	jue 1/06/23	lun 19/06/23																												
12	Fin de construccion	1 día	mar 20/06/23	mar 20/06/23																												
13	Prueba de hermeticidad	2 días	mié 21/06/23	jue 22/06/23																												
14	Gasificacion	1 día	vie 23/06/23	vie 23/06/23																												
15	Resanes y limpieza	41 días	jue 1/06/23	mar 11/07/23																												
16	Entrega de obra	1 día	mié 12/07/23	mié 12/07/23																												

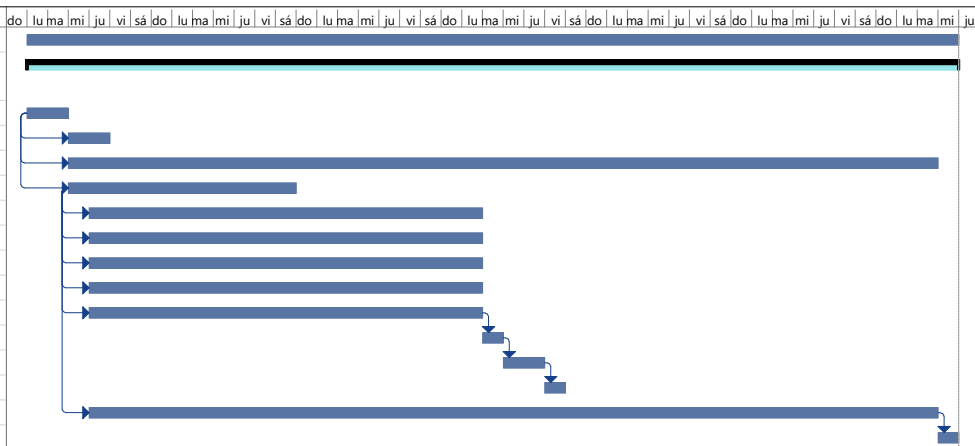

[Firma]
**WILLIAM JOSE
TORRES VILLARROEL**
Ingeniero Civil
CIP N° 2925-T

Tarea		Agrupar por síntesis		Hito externo		solo duración		Fecha límite	
División		Tarea resumida		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Progreso	
Hito		Hito resumido		Hito inactivo		Resumen manual			
Resumen		Progreso resumido		Resumen inactivo		solo el comienzo			
Resumen del proyecto		Tareas externas		Tarea manual		solo fin			

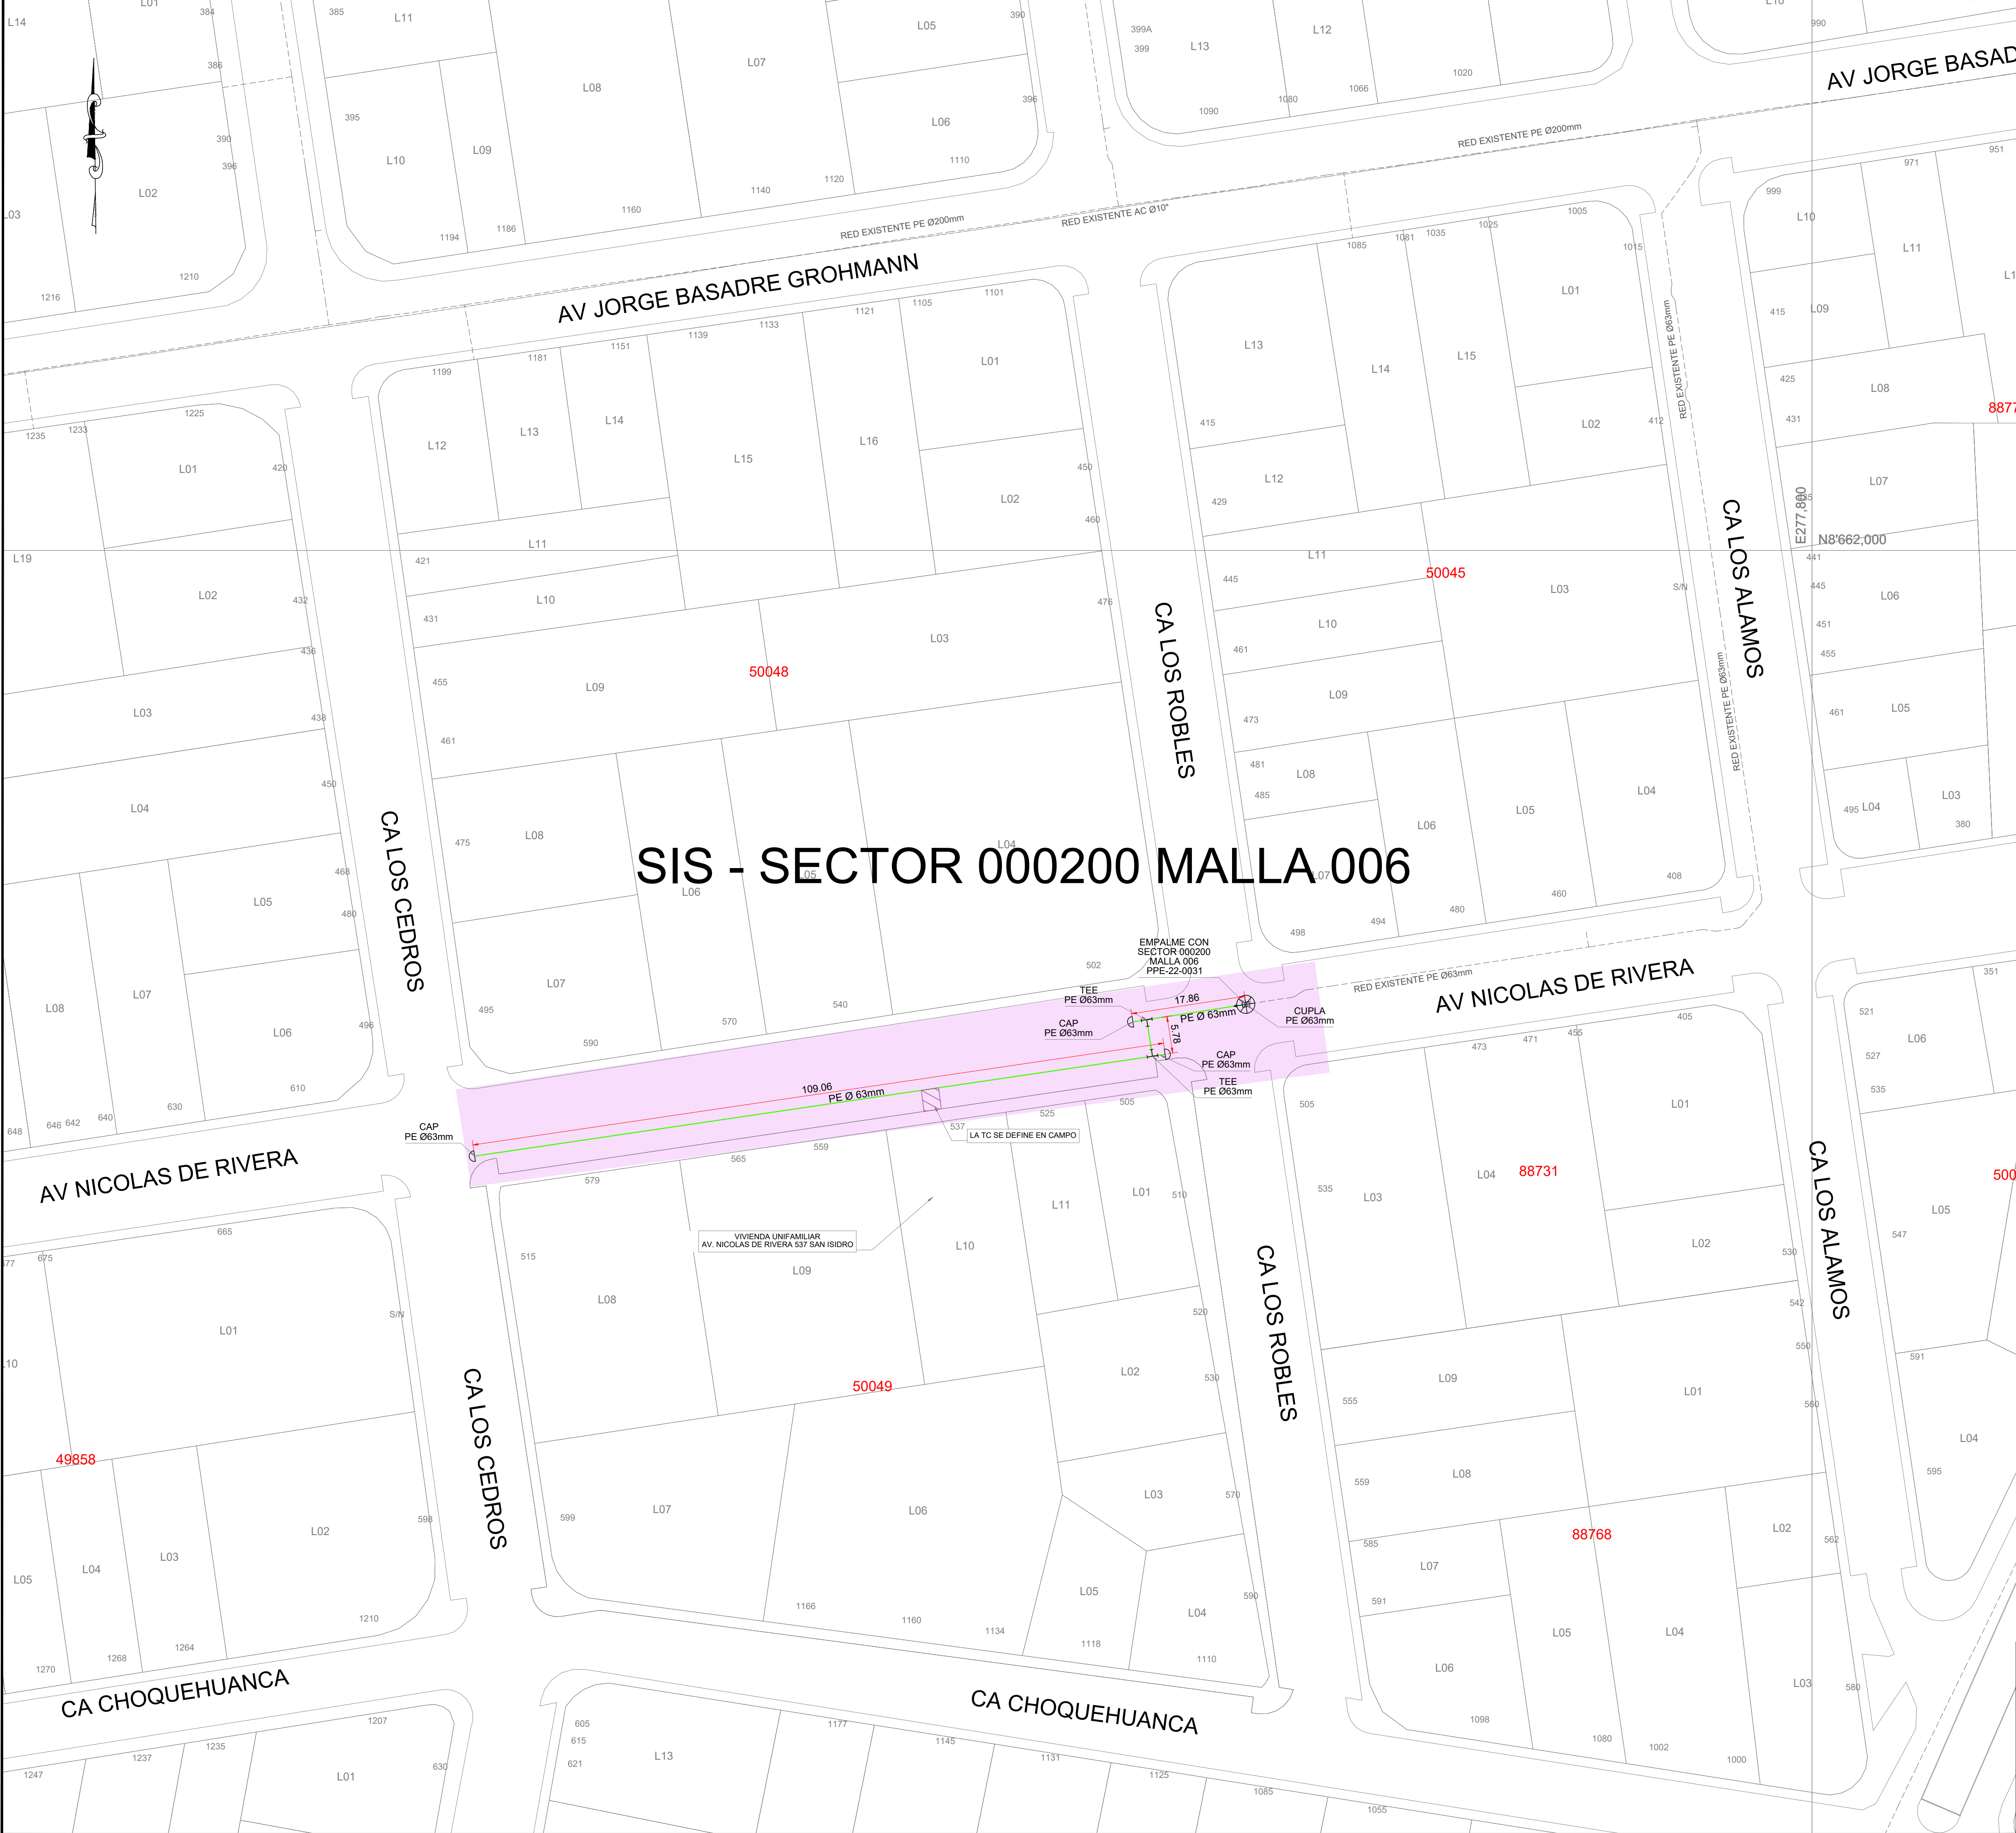

CROQUIS DE UBICACIÓN

CUADRANTE E11

A B C D E F G H I J

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0km.1,800m

ESCALA GRAFICA

Sistema de Coordenadas: UTM-WGS84

Hemisferio Sur - ZONA 18

SIMBOLOGIA

Válvula

TEE de Todo Diametro

Conexión con Silleta (TF)

Conexión con Tapping Tee (EF)

Conexión sin válvula de exceso de flujo

Punto de Inicio de Progresiva: 0.00

Punto Control Topográfico

Punto de salida de cable de detección en acometida

Zona de protección mecánica de la red

Tramo con tapada diferente a la típica

Cupla

Tapón

Reducción

Transición AC-PE

ERP

Triducto

Punto de empalme

Gabinete

PE200

PE160

PE110

PE90

PE63

PE32

PE20

PE

ZONA ARQUEOLOGICA

Distancia mínima a edificaciones consideradas en el trazado : 1m

METRADOS

DIAMETRO DE TUBERIA	LONGITUD (m)
PE Ø 32 mm	---
PE Ø 63 mm	132.70
PE Ø 110 mm	---
PE Ø 160 mm	---
PE Ø 200 mm	---
TOTAL:	132.70

WILLAN JOSE

TORRES VILLARROEL

Ingeniero Civil

CIP N° 2925-T

Representante Técnico

A PLANO PARA PERMISO

11-04-2023

DRG

WTV

WTV

REV.

DESCRIPCION

FECHA

ELABORÓ

REVISO

APROBO

LISTA DE REVISIONES

Cálidda

GAS NATURAL DEL PERU

REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL EN LIMA Y CALLAO

CR

CONSTRUIREDES S.A.C.

TITULO :

PPE0-23-0229-Redes de Polietileno - San Isidro

EXT. DE RED A AV NICOLAS DE RIVERA CDR 5.

SIS - SECTOR 000200 MALLA 006

Plano Maestro

DIBUJO : D.R.G.

FECHA : 11-04-2023

DISTRITO : SAN ISIDRO

PLANO N° :

REV. :

REVISO : W.T.V.

ESCALA : 1/500

ZONA Y MALLA : SECTOR 000200 MALLA 006

PPE0-23-0229-00-PM-01

A

APPROBO : W.T.V.

FILE :

REEMPLAZA :
