



Cálidda

CÓDIGO DEL PROYECTO: PPE-22-0162

Lima, 12 de Agosto de 2022

Señores

**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO**

Presente. -

Asunto: Solicita autorización para la ejecución de obras del proyecto "EXT RED AV OSCAR R. BENAVIDES (CUADRA 41) _ BLL - SECTOR 000600 MALLA 001"

Radicado: R2022-042871

De nuestra consideración:

Gas Natural de Lima y Callao S.A. - Cálidda, identificada con RUC N° 20503758114, debidamente representada por su apoderado el Señor Roberto Franco Gianoli Hanke, Identificado con DNI N° 10609610, con poderes inscritos en la partida electrónica N° 11352499 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, ante usted respetuosamente, nos presentamos y decimos:

Que, en el marco del proyecto de masificación del servicio público de gas natural promovido por el Gobierno Central (Proyecto Camisea), venimos a solicitar autorización para la ejecución de obras del proyecto denominado **"EXT RED AV OSCAR R. BENAVIDES (CUADRA 41) _ BLL - SECTOR 000600 MALLA 001"** ubicado en el distrito de Bellavista, tal como se señala en los planos de ubicación y la memoria descriptiva que se adjuntan.

Conforme a lo señalado en el Art. 81 de Decreto Supremo N° 042-99-EM (Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos), el concesionario de distribución podrá abrir los pavimentos, calzadas y aceras de las vías públicas que se encuentren dentro del área de concesión, previa notificación a la Municipalidad respectiva, quedando obligado a efectuar la reparación que sea menester dentro del plazo otorgado por dicha Municipalidad.

El estudio de Impacto Ambiental del mencionado proyecto ha sido aprobado mediante R.D N°0116-2004-MEM/AAM de fecha 13 de agosto del 2004, expedida por la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y Minas.

En virtud de lo antes expuesto, y de conformidad con lo establecido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad, adjuntamos la siguiente documentación:

1. Plano de Ubicación
2. Planos de planta y perfil
3. Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas
4. Cronograma de Obra

CÁLIDDA
C. Mario 150
C.C. La Rambla Norte 2
Teléfono: 011-887-7500
San Juan, Lima Perú





Por su parte, informamos la contratación de la empresa **CONSTRUREDES SAC** identificada con RUC N°20518509391 para la elaboración de dichos trabajos contando como responsable por parte de la empresa contratista con el Ingeniero Edwin Yair Uribe Salazar, con registro del Colegio de Ingenieros N° 238838; asimismo, nuestra representada designa como persona responsable al Ingeniero Leyla G. Eugenio Sarmiento, con Registro del Colegio de Ingenieros N° 170305.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 126° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General, otorgamos poder general para efectos de la tramitación ordinaria de éste procedimiento al Señor EDER MERA LEON con DNI N° 10214048 Y/O el Sr. ROBERT VALVERDE ALVARADO con DNI N° 41195791, a fin que en nombre y representación de nuestra empresa, pueda revisar el expediente, realizar las gestiones necesarias orientadas a la obtención de los permisos y en su oportunidad proceder al recojo de la autorización que corresponda.

Asimismo, señalamos que de acuerdo con el numeral 20.4 del artículo 20° del TUO de la Ley N° 27444, vuestro despacho nos podrá notificar a los siguientes correos electrónicos:

- casilla.electronica@proveedores.calidda.com.pe
- Gestion.Permisos@calidda.com.pe
- emera@meraasesores.com

POR TANTO:

A usted señor Gerente, mucho agradeceremos se sirva disponer lo necesario a efecto se nos proporcione la autorización solicitada, por corresponder a derecho.


Atentamente,

Firmado Digitalmente por:
ROBERTO FRANCO GIANOLI
HANKE
Fecha: 12/08/2022 17:28:48

Roberto Franco Gianoli Hanke
Sub Gerente Legal




Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	vi	sá	do	lu	ma	mi	ju	vi	sá	do	lu	ma	mi	ju	vi	sá	do	lu	ma	mi	ju	vi	sá	do	lu	ma	mi	ju
1	ACTIVIDADES - DISTRITO DE BELLAVISTA	45 días	lun 29/08/22	mié 12/10/22																												
2	PPE-22-0162 BLL - SECTOR 000600 MALLA 001 EXT RED AV OSCAR R. BENAVIDES (CUADRA 41)_ BLL	45 días	lun 29/08/22	mié 12/10/22																												
3	Recorrido informacion y Difusión	2 días	lun 29/08/22	mar 30/08/22																												
4	Replanteo de trazo	4 días	mié 31/08/22	sáb 3/09/22																												
5	Señalización	42 días	mié 31/08/22	mar 11/10/22																												
6	Calicatas	14 días	mié 31/08/22	mar 13/09/22																												
7	Corte y Demolición	15 días	jue 1/09/22	jue 15/09/22																												
8	Excavación	15 días	jue 1/09/22	jue 15/09/22																												
9	Tendido de tuberías	15 días	jue 1/09/22	jue 15/09/22																												
10	Relleno y Compactacion	15 días	jue 1/09/22	jue 15/09/22																												
11	Acabado vereda y/o pista (resane)	15 días	jue 1/09/22	jue 15/09/22																												
12	Fin de construccion	1 día	vie 16/09/22	vie 16/09/22																												
13	Prueba de hermeticidad	2 días	sáb 17/09/22	dom 18/09/22																												
14	Gasificacion	1 día	lun 19/09/22	lun 19/09/22																												
15	Resanes y limpieza	41 días	jue 1/09/22	mar 11/10/22																												
16	Entrega de obra	1 día	mié 12/10/22	mié 12/10/22																												

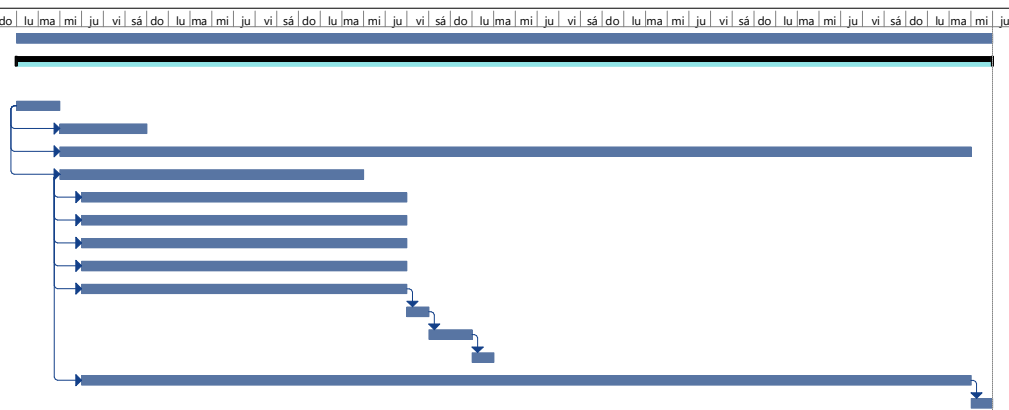


EDWIN YAIR URIBE SALAZAR
 Ingeniero Civil
 CIP N° 2514-T

Tarea		Resumen del proyecto		Progreso resumido		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Fecha límite	
División		Agrupar por síntesis		Tareas externas		Resumen inactivo		Resumen manual		Progreso	
Hito		Tarea resumida		Hito externo		Tarea manual		solo el comienzo			
Resumen		Hito resumido		Tarea inactiva		solo duración		solo fin			

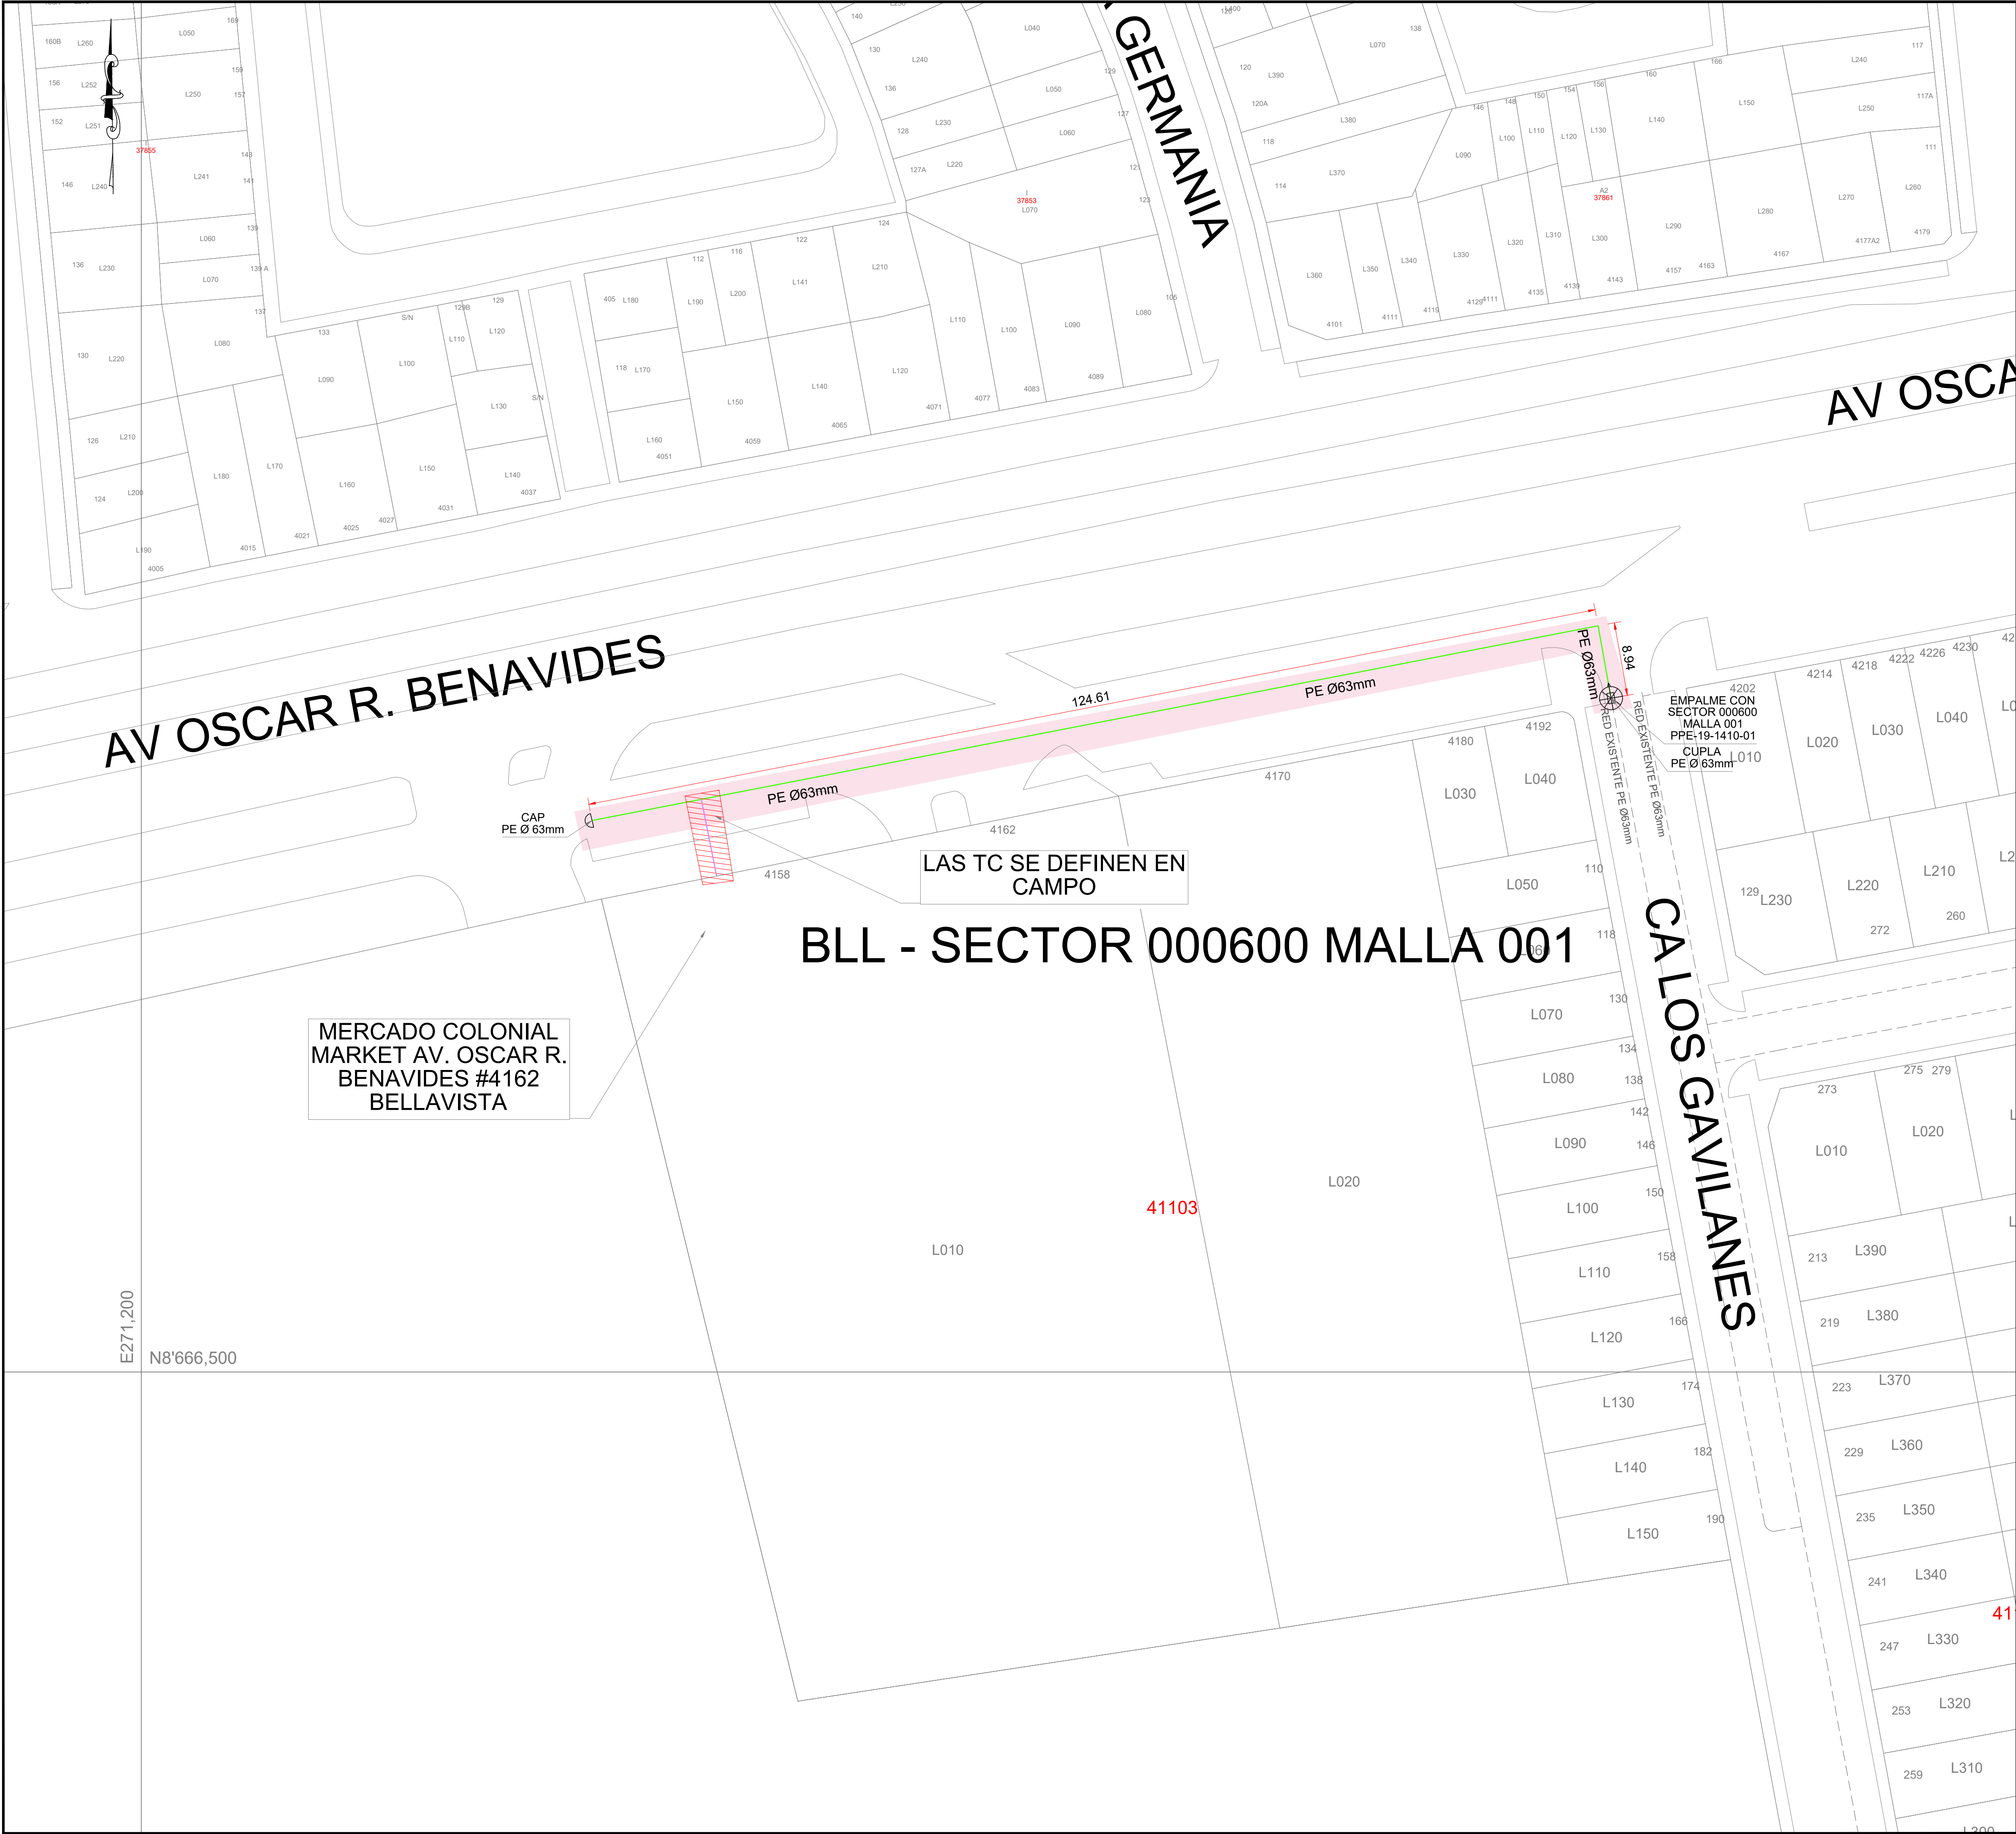

CROQUIS DE UBICACIÓN

CUADRANTE C09

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

ESCALA GRAFICA 1,500m

Sistema de Coordenadas: UTM-WGS84
Hemisferio Sur - ZONA 18

SIMBOLOGIA

Válvula		Conexión con Silleta (TF)	
Tapón		Conexión con Tapping Tee (EF)	
Reducción		Conexión sin válvula de exceso de flujo	
Transición AC-PE		Punto de inicio de Progresiva: 0.00	
ERP		Punto Control Topográfico	
Triducto		Punto de salida de cable de detección en acometida	
Punto de empalme		Zona de protección mecánica de la red	
Gabinete		Tramo con tapada diferente a la típica	

TIPO DE LINEA

TUBERÍA PE Ø200mm	PE200
TUBERÍA PE Ø160mm	PE160
TUBERÍA PE Ø110mm	PE110
TUBERÍA PE Ø90mm	PE90
TUBERÍA PE Ø63mm	PE63
TUBERÍA PE Ø32mm	PE32
TUBERÍA PE Ø20mm	PE20
TUBERÍA PE (CON GAS)	PE

Distancia mínima a edificaciones consideradas en el trazado : 1m

ZONA ARQUEOLOGICA

METRADOS	
DIAMETRO DE TUBERIA	LONGITUD (m)
PE Ø 32 mm	---
PE Ø 63 mm	133.55
PE Ø 110 mm	---
PE Ø 160 mm	---
PE Ø 200 mm	---
TOTAL:	133.55

EDWIN YAIR URIBE SALAZAR
Ingeniero Civil
CIP N° 2514-T

Representante Técnico

A	PLANO PARA PERMISO	10-08-2022	MSF	EUS	EUS
REV.	DESCRIPCION	FECHA	ELABORÓ	REVISÓ	APROBO

LISTA DE REVISIONES

	REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL EN LIMA Y CALLAO			
TITULO : PPE-22-0162 - Redes de Polietileno - Bellavista EXT RED AV OSCAR R. BENAVIDES (CUADRA 41)_BLL BLL - SECTOR 000600 MALLA 001 Plano Maestro				
DIBUJO : M.S.F.	FECHA : 10-08-2022	DISTRITO : BELLAVISTA	PLANO N° :	REV. :
REVISO : E.U.S.	ESCALA : S/E	ZONA Y MALLA : SECTOR 000600 MALLA 001	PPE-22-0162-00-PM-01	A
APROBO : E.U.S.	FILE : -	REEMPLAZA : -		
