


★2022-106991★



CÓDIGO DEL PROYECTO: PPE-18-0432

Lima, 6 de Abril de 2022

Señores  
**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC**  
**GERENCIA DE DESARROLLO URBANO**  
 Presente. -



Asunto: Solicita autorización para la ejecución de obras del proyecto "PAC-SECTOR 001900 MALLA 009 ETAPA 02"

Radicado : R2022-017533

De nuestra consideración:

**Gas Natural de Lima y Callao S.A. - Cálidda**, identificada con RUC N° 20503758114, debidamente representada por su apoderado el Señor Roberto Franco Gianoli Hanke, Identificado con DNI N° 10609610, con poderes inscritos en la partida electrónica N° 11352499 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, ante usted respetuosamente, nos presentamos y decimos:

Que, en el marco del proyecto de masificación del servicio público de gas natural promovido por el Gobierno Central (Proyecto Camisea), venimos a solicitar autorización para la ejecución de obras del proyecto denominado "**PAC-SECTOR 001900 MALLA 009 ETAPA 02**" ubicado en el distrito de Pachacamac, tal como se señala en los planos de ubicación y la memoria descriptiva que se adjuntan.

Conforme a lo señalado en el Art. 81 de Decreto Supremo N° 042-99-EM (Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos), el concesionario de distribución podrá abrir los pavimentos, calzadas y aceras de las vías públicas que se encuentren dentro del área de concesión, previa notificación a la Municipalidad respectiva, quedando obligado a efectuar la reparación que sea menester dentro del plazo otorgado por dicha Municipalidad.


El estudio de Impacto Ambiental del mencionado proyecto ha sido aprobado mediante R.D N°0116-2004-MEM/AAM de fecha 13 de agosto del 2004, expedida por la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y Minas.

En virtud de lo antes expuesto, y de conformidad con lo establecido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad, adjuntamos la siguiente documentación:

1. Plano de Ubicación
2. Planos de planta y perfil
3. Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas
4. Cronograma de Obra

CÁLIDDA  
 C. Morejil 150  
 C.C La Rambla, Torre 2,  
 Teléfono: (51-1) 61-7500  
 San Borja, Lima, Perú





Por su parte, informamos la contratación de la empresa **P.A PERU SAC**, empresa identificada con RUC. N° 20549011196, para la elaboración de dichos trabajos contando como responsable por parte de la empresa contratista con la Ingeniera Diana Cayo Rivas, con registro del Colegio de Ingenieros N°122261; asimismo, nuestra representada designa como persona responsable al Ingeniero Leyla G. Eugenio Sarmiento, con Registro del Colegio de Ingenieros N° 150305.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 126° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General, otorgamos poder general para efectos de la tramitación ordinaria de éste procedimiento al Señor **EDER MERA LEON** con DNI N° 10214048 Y/O el Sr. **ROBERT VALVERDE ALVARADO** con DNI N° 41195791, a fin que en nombre y representación de nuestra empresa, pueda revisar el expediente, realizar las gestiones necesarias orientadas a la obtención de los permisos y en su oportunidad proceder al recojo de la autorización que corresponda.

**POR TANTO:**

A usted señor Gerente, mucho agradeceremos se sirva disponer lo necesario a efecto se nos proporcione la autorización solicitada, por corresponder a derecho.

Atentamente,

Firmado Digitalmente por:  
**ROBERTO FRANCO GIANOLI  
HANKE**  
Fecha: 06/04/2022 15:07:25

**Roberto Franco Gianoli Hanke**  
Sub Gerente Legal

**CÁLIDDA**  
C. Morelli 150  
C. C. La Rembla, Torre 2,  
Teléfono: (51-1) 611-7500  
San Borja, Lima, Perú
























## CRONOGRAMA DE OBRA


### PROYECTO: PPE-18-0432-PAC-SECTOR 001900 MALLA 009\_ETAPA 02 PACHACAMAC

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	mayo 2022																																
					S	D	11 abr '22	L	M	X	J	V	S	D	18 abr '22	L	M	X	J	V	S	D	25 abr '22	L	M	X	J	V	S	D	2 may '22	L	M	X	J	V	S
1	<b>ACTIVIDADES DE OBRA</b>	<b>21 días</b>	<b>lun 11/04/22</b>	<b>lun 9/05/22</b>																																	
2	<b>INSTALACIÓN DE TUBERÍA</b>	<b>21 días</b>	<b>lun 11/04/22</b>	<b>lun 9/05/22</b>																																	
3	<b>PPE-18-0432-PAC-SECTOR 001900 MALLA 009_ETAPA 02</b>	<b>21 días</b>	<b>lun 11/04/22</b>	<b>lun 9/05/22</b>																																	
4	Inicio de Obra	0 días	lun 11/04/22	lun 11/04/22																																	
5	Recorrido Informativo y Difusión	3 días	lun 11/04/22	mié 13/04/22																																	
6	Replanteo de Trazo	2 días	mar 12/04/22	mié 13/04/22																																	
7	Señalización	15 días	mar 12/04/22	lun 2/05/22																																	
8	Calicatas	10 días	mar 12/04/22	lun 25/04/22																																	
9	Corte y Demolición	10 días	mar 12/04/22	lun 25/04/22																																	
10	Excavación	10 días	mié 13/04/22	mar 26/04/22																																	
11	Tendido de tubería	15 días	mié 13/04/22	mar 3/05/22																																	
12	Relleno y Compactación	15 días	mié 13/04/22	mar 3/05/22																																	
13	Acabado vereda y/o pista (Resane)	15 días	jue 14/04/22	mié 4/05/22																																	
14	<b>FIN - CONSTRUCCION</b>	0 días	mié 4/05/22	mié 4/05/22																																	
15	Prueba de hermeticidad (Puntos de Venteo y Prueba de 24 horas)	2 días	jue 5/05/22	vie 6/05/22																																	
16	Gasificación	1 día	lun 9/05/22	lun 9/05/22																																	
17	Limpieza y Aseo	20 días	mar 12/04/22	lun 9/05/22																																	
18																																					
19																																					
20																																					
21																																					

Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			


## CRONOGRAMA DE OBRA

### PROYECTO: PPE-18-0432-PAC-SECTOR 001900 MALLA 009\_ETAPA 02 PACHACAMAC

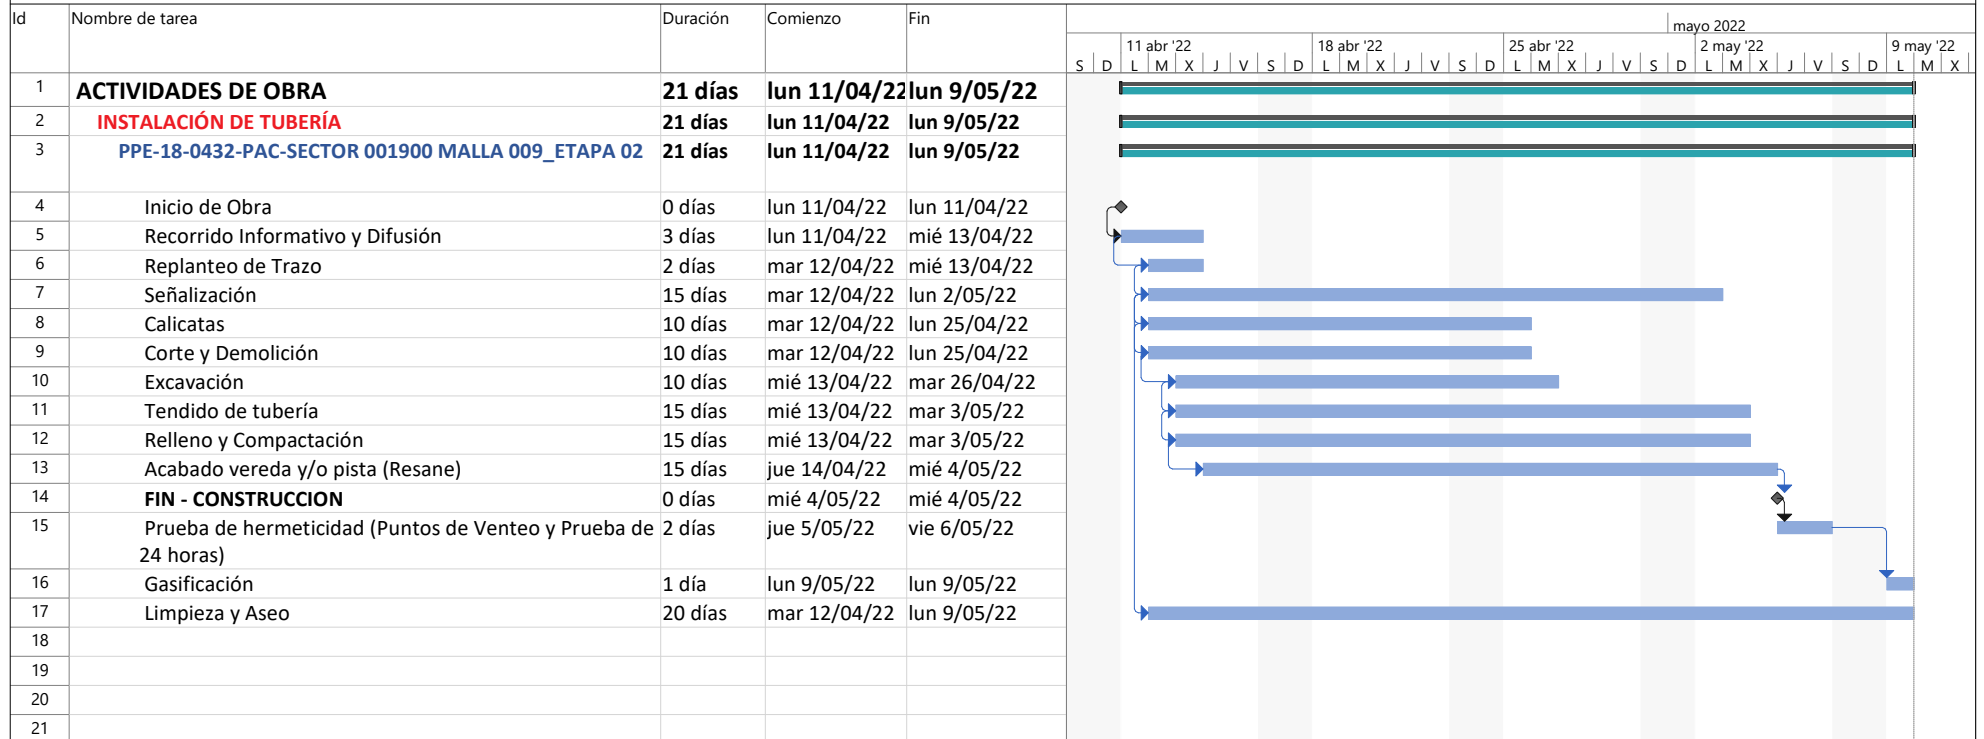

Tarea	[Barra azul]	Tarea inactiva	[Barra blanca]	Informe de resumen manual	[Barra azul con borde]	Hito externo	[Diamante]
División	[Puntos azules]	Hito inactivo	[Diamante]	Resumen manual	[Barra azul con borde]	Fecha límite	[Flecha verde]
Hito	[Diamante]	Resumen inactivo	[Barra blanca]	solo el comienzo	[Barra azul con borde]	Progreso	[Barra azul]
Resumen	[Barra verde]	Tarea manual	[Barra azul]	solo fin	[Barra azul con borde]	Progreso manual	[Barra azul]
Resumen del proyecto	[Barra gris]	solo duración	[Barra azul]	Tareas externas	[Barra azul con borde]		

CROQUIS DE UBICACION  
CUADRANTE J13-K13

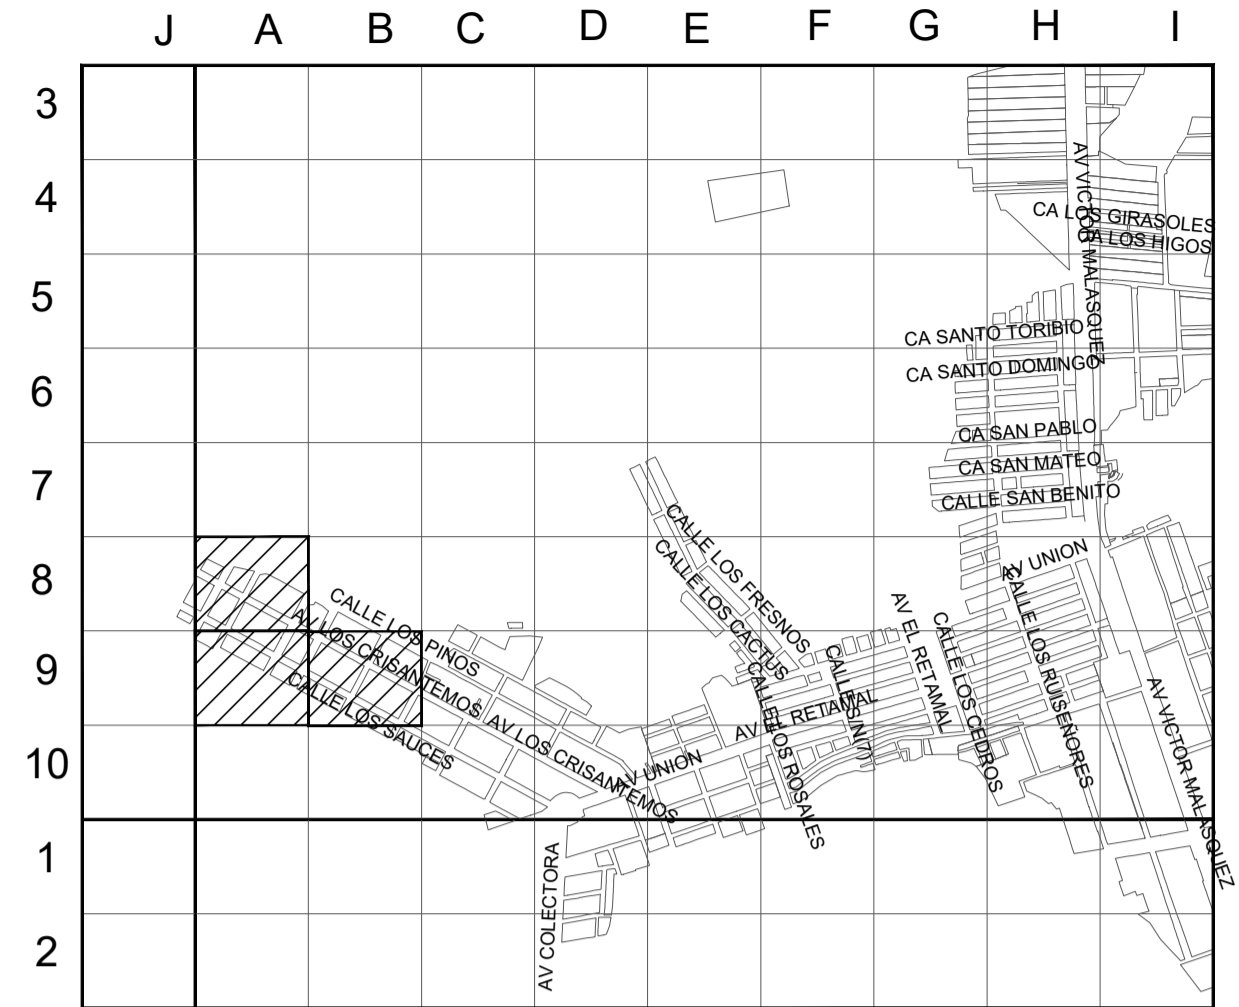

CUADRANTE J14-K14



ESCALA GRAFICA  
Sistema de Coordenadas: UTM-WGS84  
Hemisferio Sur - ZONA 18

SIMBOLOGIA

Válvula		Conexión con Silleta (TF)	
Tapón		Conexión con Tapping Tee (EF)	
Reducción		Conexión sin válvula de exceso de flujo	
Transición AC-PE		Punto de inicio de Progresiva: 0,00	
ERP		Punto Control Topográfico	
Triducto		Punto de salida de cable de detección en acometidas	
Punto de emplante		Zona de protección mecánica de la red	
Cabinete		Tramo con tapada diferente a la típica	

TIPO DE LINEA


TUBERIA PE ø200mm	PE200
TUBERIA PE ø160mm	PE160
TUBERIA PE ø110mm	PE110
TUBERIA PE ø90mm	PE90
TUBERIA PE ø63mm	PE63
TUBERIA PE ø32mm	PE32
TUBERIA PE ø20mm	PE20
TUBERIA PE (CON GAS)	PE

Distancia mínima a edificaciones consideradas en el trazado : 1m

LISTA DE METRADOS

ø TUBERIA	LONGITUD
ø 20 mm	---
ø 32 mm	2098,35
ø 63 mm	---
ø 90 mm	---
ø 110 mm	---
ø 160 mm	---
Total	2098,35

TRAMO PENDIENTE POR CONSTRUCCIÓN

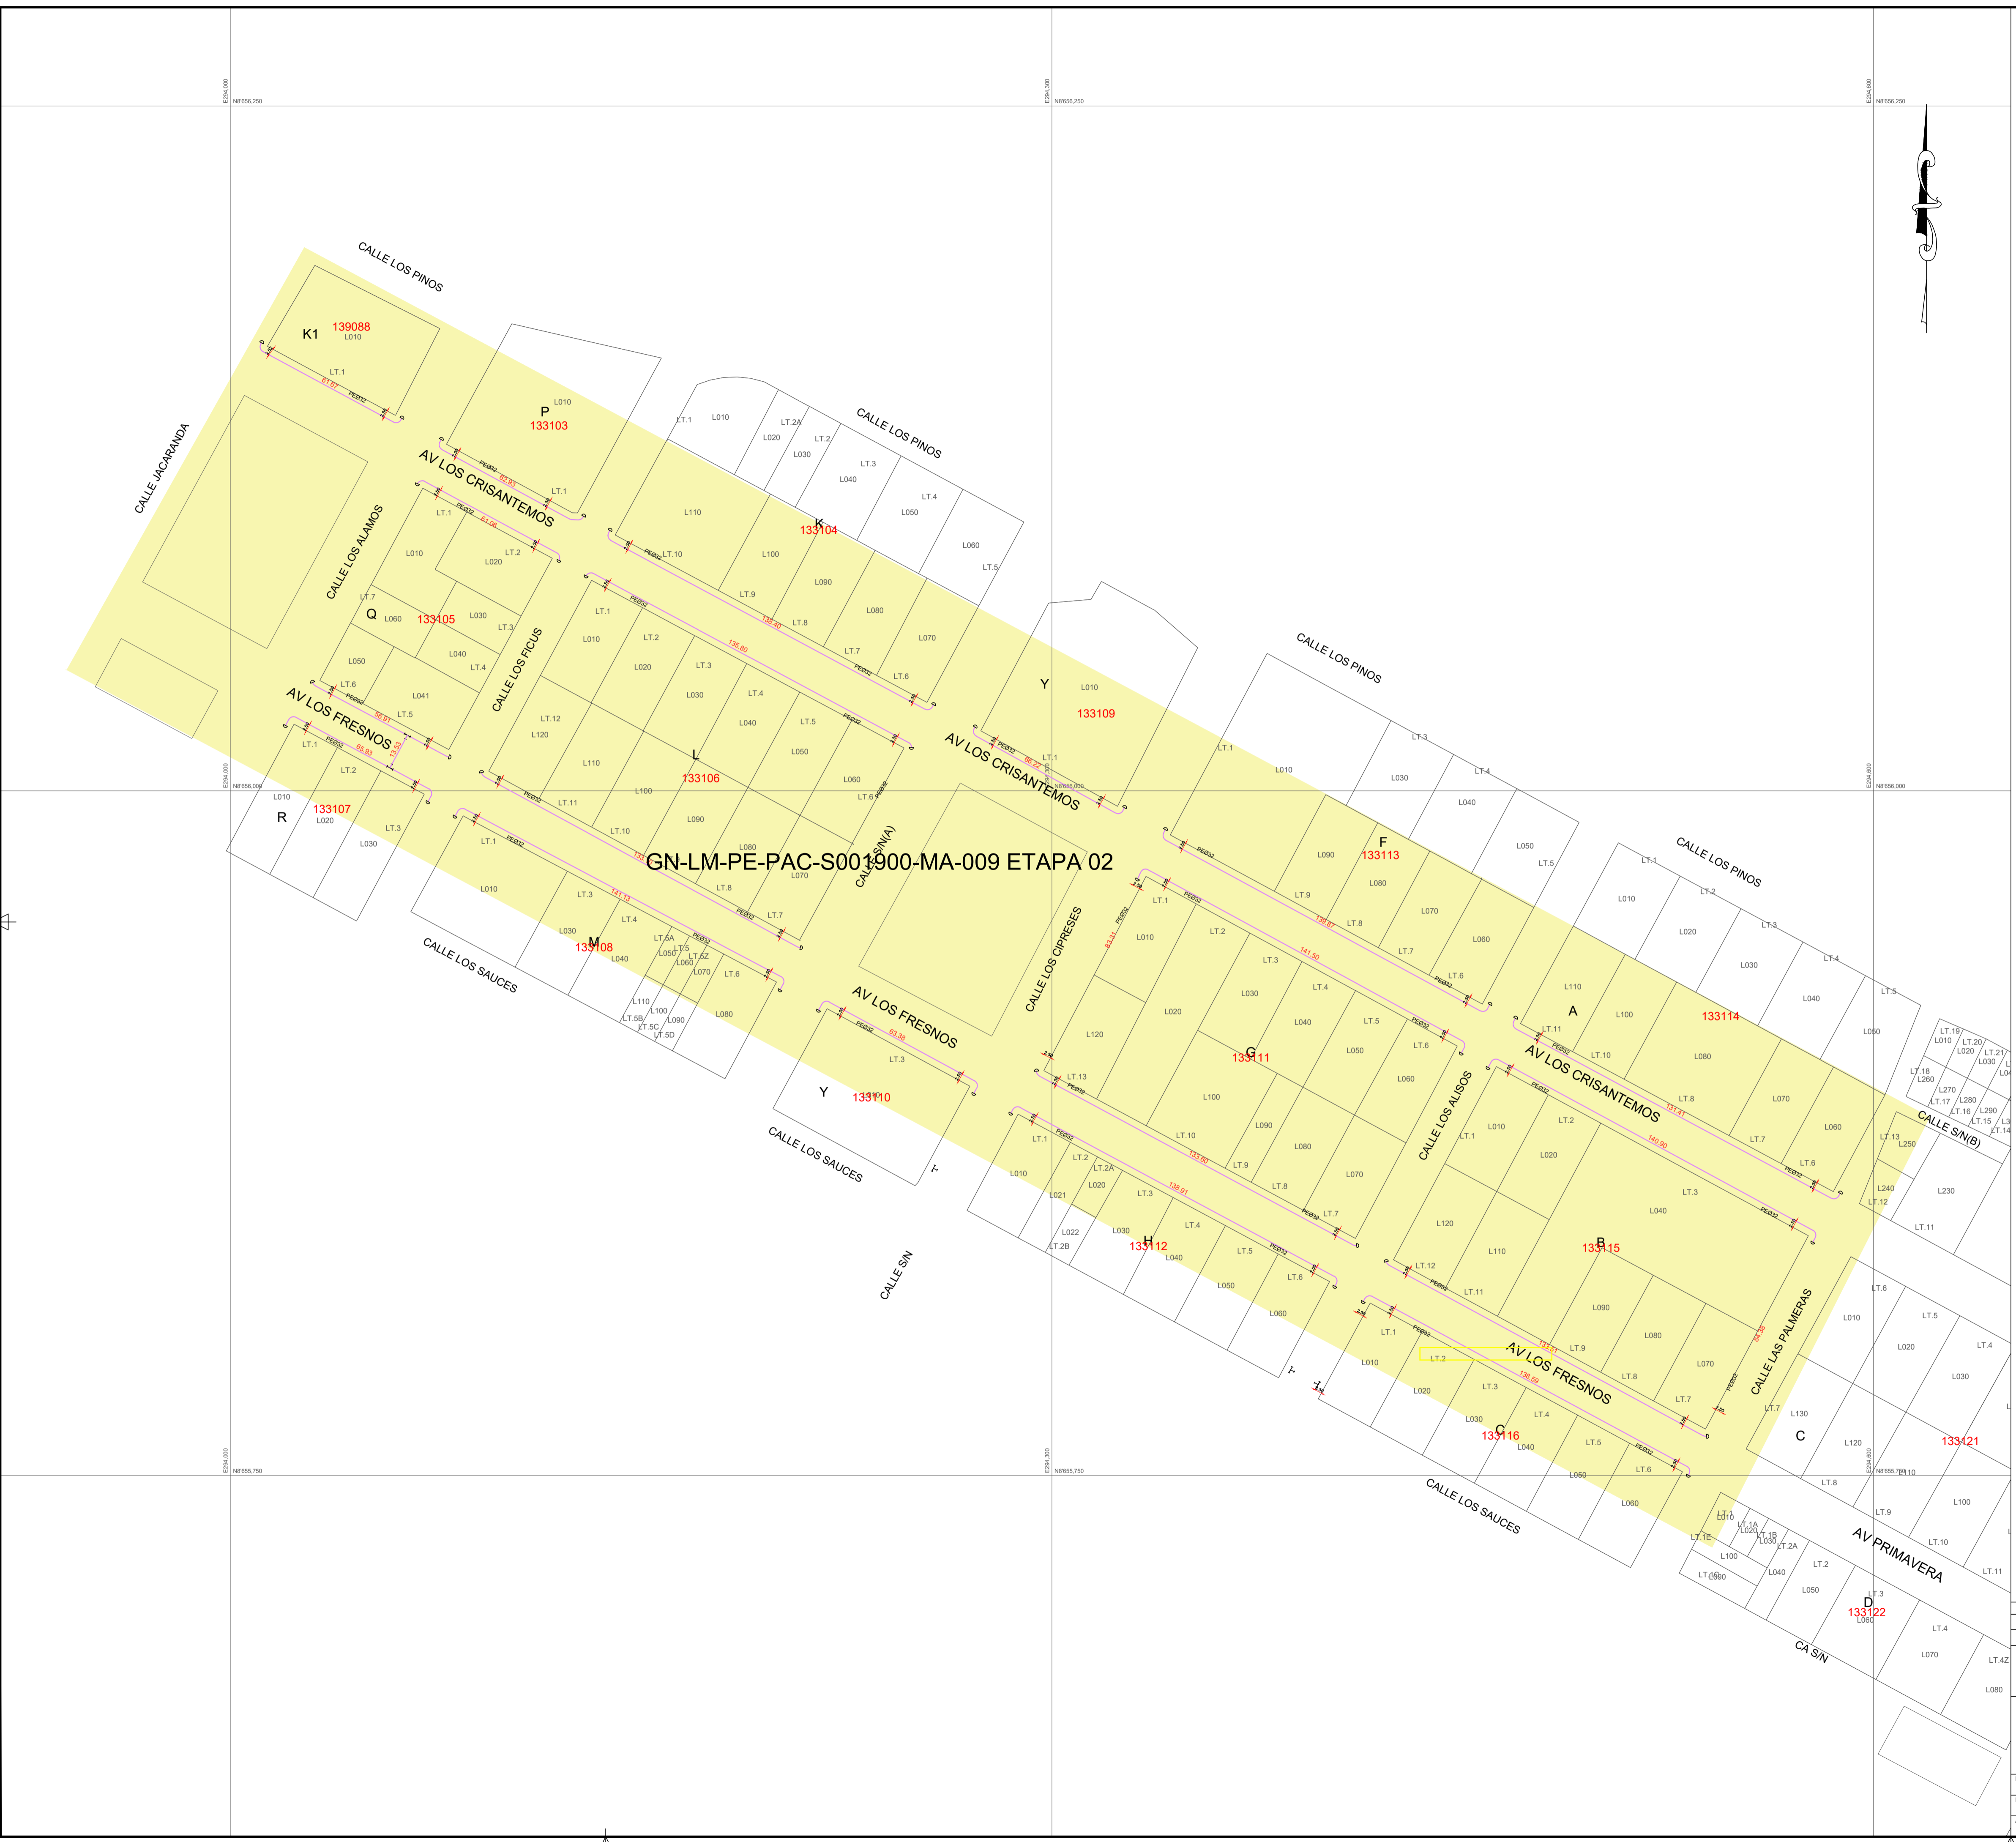

Representante Técnico  
(Contratista)

A	PARA PERMISOS	01/04/2022	APS	JMAE	CDPM
REV.	DESCRIPCIÓN	FECHA	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
LISTA DE REVISIONES					
		REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL EN LIMA Y CALLAO			
TITULO: PPE-18-0432- REDES DE POLIETILENO - PACHACAMAC PAC - SECTOR 001900 MALLA 009 ETAPA 02 PLANO MAESTRO					
DIBUJO:	APS	FECHA:	01/04/2022	DISTRITO:	PACHACAMAC
REVISO:	JMAE	ESCALA:	S/E	ZONA Y MALLA:	SECTOR 001900 MALLA 009 ETAPA 02
APROBÓ:	CDPM	FILE:	1/1	REEMPLAZA:	---
PPE-18-0432-02-PM-01					A
