



Cálidda

CÓDIGO DEL PROYECTO: PPE0-21-2675

Lima, 22 de Agosto de 2022

Señores
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO



Presente. -

Asunto: Solicita autorización para la ejecución de obras del proyecto "VMT - SECTOR 003500 MALLA 003 ETAPA 02"

Radicado: R2022-044154

De nuestra consideración:

Gas Natural de Lima y Callao S.A. - Cálidda, identificada con RUC N° 20503758114, debidamente representada por su apoderado el Señor Roberto Franco Gianoli Hanke, Identificado con DNI N° 10609610, con poderes inscritos en la partida electrónica N° 11352499 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, ante usted respetuosamente, nos presentamos y decimos:

Que, en el marco del proyecto de masificación del servicio público de gas natural promovido por el Gobierno Central (Proyecto Camisea), venimos a solicitar autorización para la ejecución de obras del proyecto denominado "**VMT - SECTOR 003500 MALLA 003 ETAPA 02**", ubicado en el distrito de **Villa María del Triunfo**, tal como se señala en los planos de ubicación y la memoria descriptiva que se adjuntan.

Conforme a lo señalado en el Art. 81 de Decreto Supremo N° 042-99-EM (Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos), el concesionario de distribución podrá abrir los pavimentos, calzadas y aceras de las vías públicas que se encuentren dentro del área de concesión, previa notificación a la Municipalidad respectiva, quedando obligado a efectuar la reparación que sea menester dentro del plazo otorgado por dicha Municipalidad.

El estudio de Impacto Ambiental del mencionado proyecto ha sido aprobado mediante R.D N°0116-2004-MEM/AAM de fecha 13 de agosto del 2004, expedida por la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y Minas.

En virtud de lo antes expuesto, y de conformidad con lo establecido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad, adjuntamos la siguiente documentación:

1. Plano de Ubicación
2. Planos de planta y perfil
3. Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas
4. Cronograma de Obra

CALIDAD
C. MORALES
Calle La Victoria 1002
Lima, Perú 15103
Tel: 011 426 1200



Por su parte, informamos la contratación de la empresa **CONSTRUREDES SAC** identificada con RUC N°20518509391 para la elaboración de dichos trabajos contando como responsable por parte de la empresa contratista con el Ingeniero Edwin Yair Uribe Salazar, con registro del Colegio de Ingenieros N° 238838; asimismo, nuestra representada designa como persona responsable al Ingeniero Leyla G. Eugenio Sarmiento - Ing. Civil - CIP 170305.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 126° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General, otorgamos poder general para efectos de la tramitación ordinaria de este procedimiento al Señor EDER MERA LEON con DNI N° 10214048 Y/O el Sr. ROBERT VALVERDE ALVARADO con DNI N° 41195791, a fin de que, en nombre y representación de nuestra empresa, pueda realizar las gestiones correspondientes hasta la finalización del proyecto.

Asimismo, señalamos que de acuerdo con el numeral 20.4 del artículo 20° del TUO de la Ley N° 27444, vuestro despacho nos podrá notificar a los siguientes correos electrónicos:

- casilla.electronica@proveedores.calidda.com.pe
- Gestion.Permisos@calidda.com.pe
- emera@meraasesores.com

POR LO EXPUESTO

Presentamos la presente comunicación para los fines pertinentes y en el marco de la normativa aplicable.

Atentamente,

Firmado Digitalmente por:
ROBERTO FRANCO GIANOLI
HANKE
Fecha: 23/08/2022 08:27:28

Roberto Franco Gianoli Hanke
Sub Gerente Legal




CRONOGRAMA DE OBRA DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO


Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X
1	ACTIVIDADES - DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO	44 días	lun 5/09/22	mar 18/10/22	
2	PPE0-21-2675 VMT - SECTOR 003500 MALLA 003 ETAPA 02	44 días	lun 5/09/22	mar 18/10/22	
3	Recorrido informacion y Difusión	3 días	lun 5/09/22	mié 7/09/22	
4	Replanteo de trazo	10 días	mar 6/09/22	jue 15/09/22	
5	Señalización	42 días	mar 6/09/22	lun 17/10/22	
6	Calicatas	15 días	mar 6/09/22	mar 20/09/22	
7	Corte y Demolición	16 días	mié 7/09/22	jue 22/09/22	
8	Excavación	16 días	mié 7/09/22	jue 22/09/22	
9	Tendido de tuberías	16 días	mié 7/09/22	jue 22/09/22	
10	Relleno y Compactacion	16 días	mié 7/09/22	jue 22/09/22	
11	Acabado vereda y/o pista (resane)	16 días	mié 7/09/22	jue 22/09/22	
12	Fin de construccion	1 día	vie 23/09/22	vie 23/09/22	
13	Prueba de hermeticidad	2 días	sáb 24/09/22	dom 25/09/22	
14	Gasificacion	1 día	lun 26/09/22	lun 26/09/22	
15	Resanes y limpieza	41 días	mié 7/09/22	lun 17/10/22	
16	Entrega de obra	1 día	mar 18/10/22	mar 18/10/22	

EDWIN YAIR URIBE SALAZAR
 Ingeniero Civil
 CIP N° 2514-T

Tarea		Agrupar por síntesis		Hito externo		solo duración		Fecha límite	
División		Tarea resumida		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Progreso	
Hito		Hito resumido		Hito inactivo		Resumen manual			
Resumen		Progreso resumido		Resumen inactivo		solo el comienzo			
Resumen del proyecto		Tareas externas		Tarea manual		solo fin			

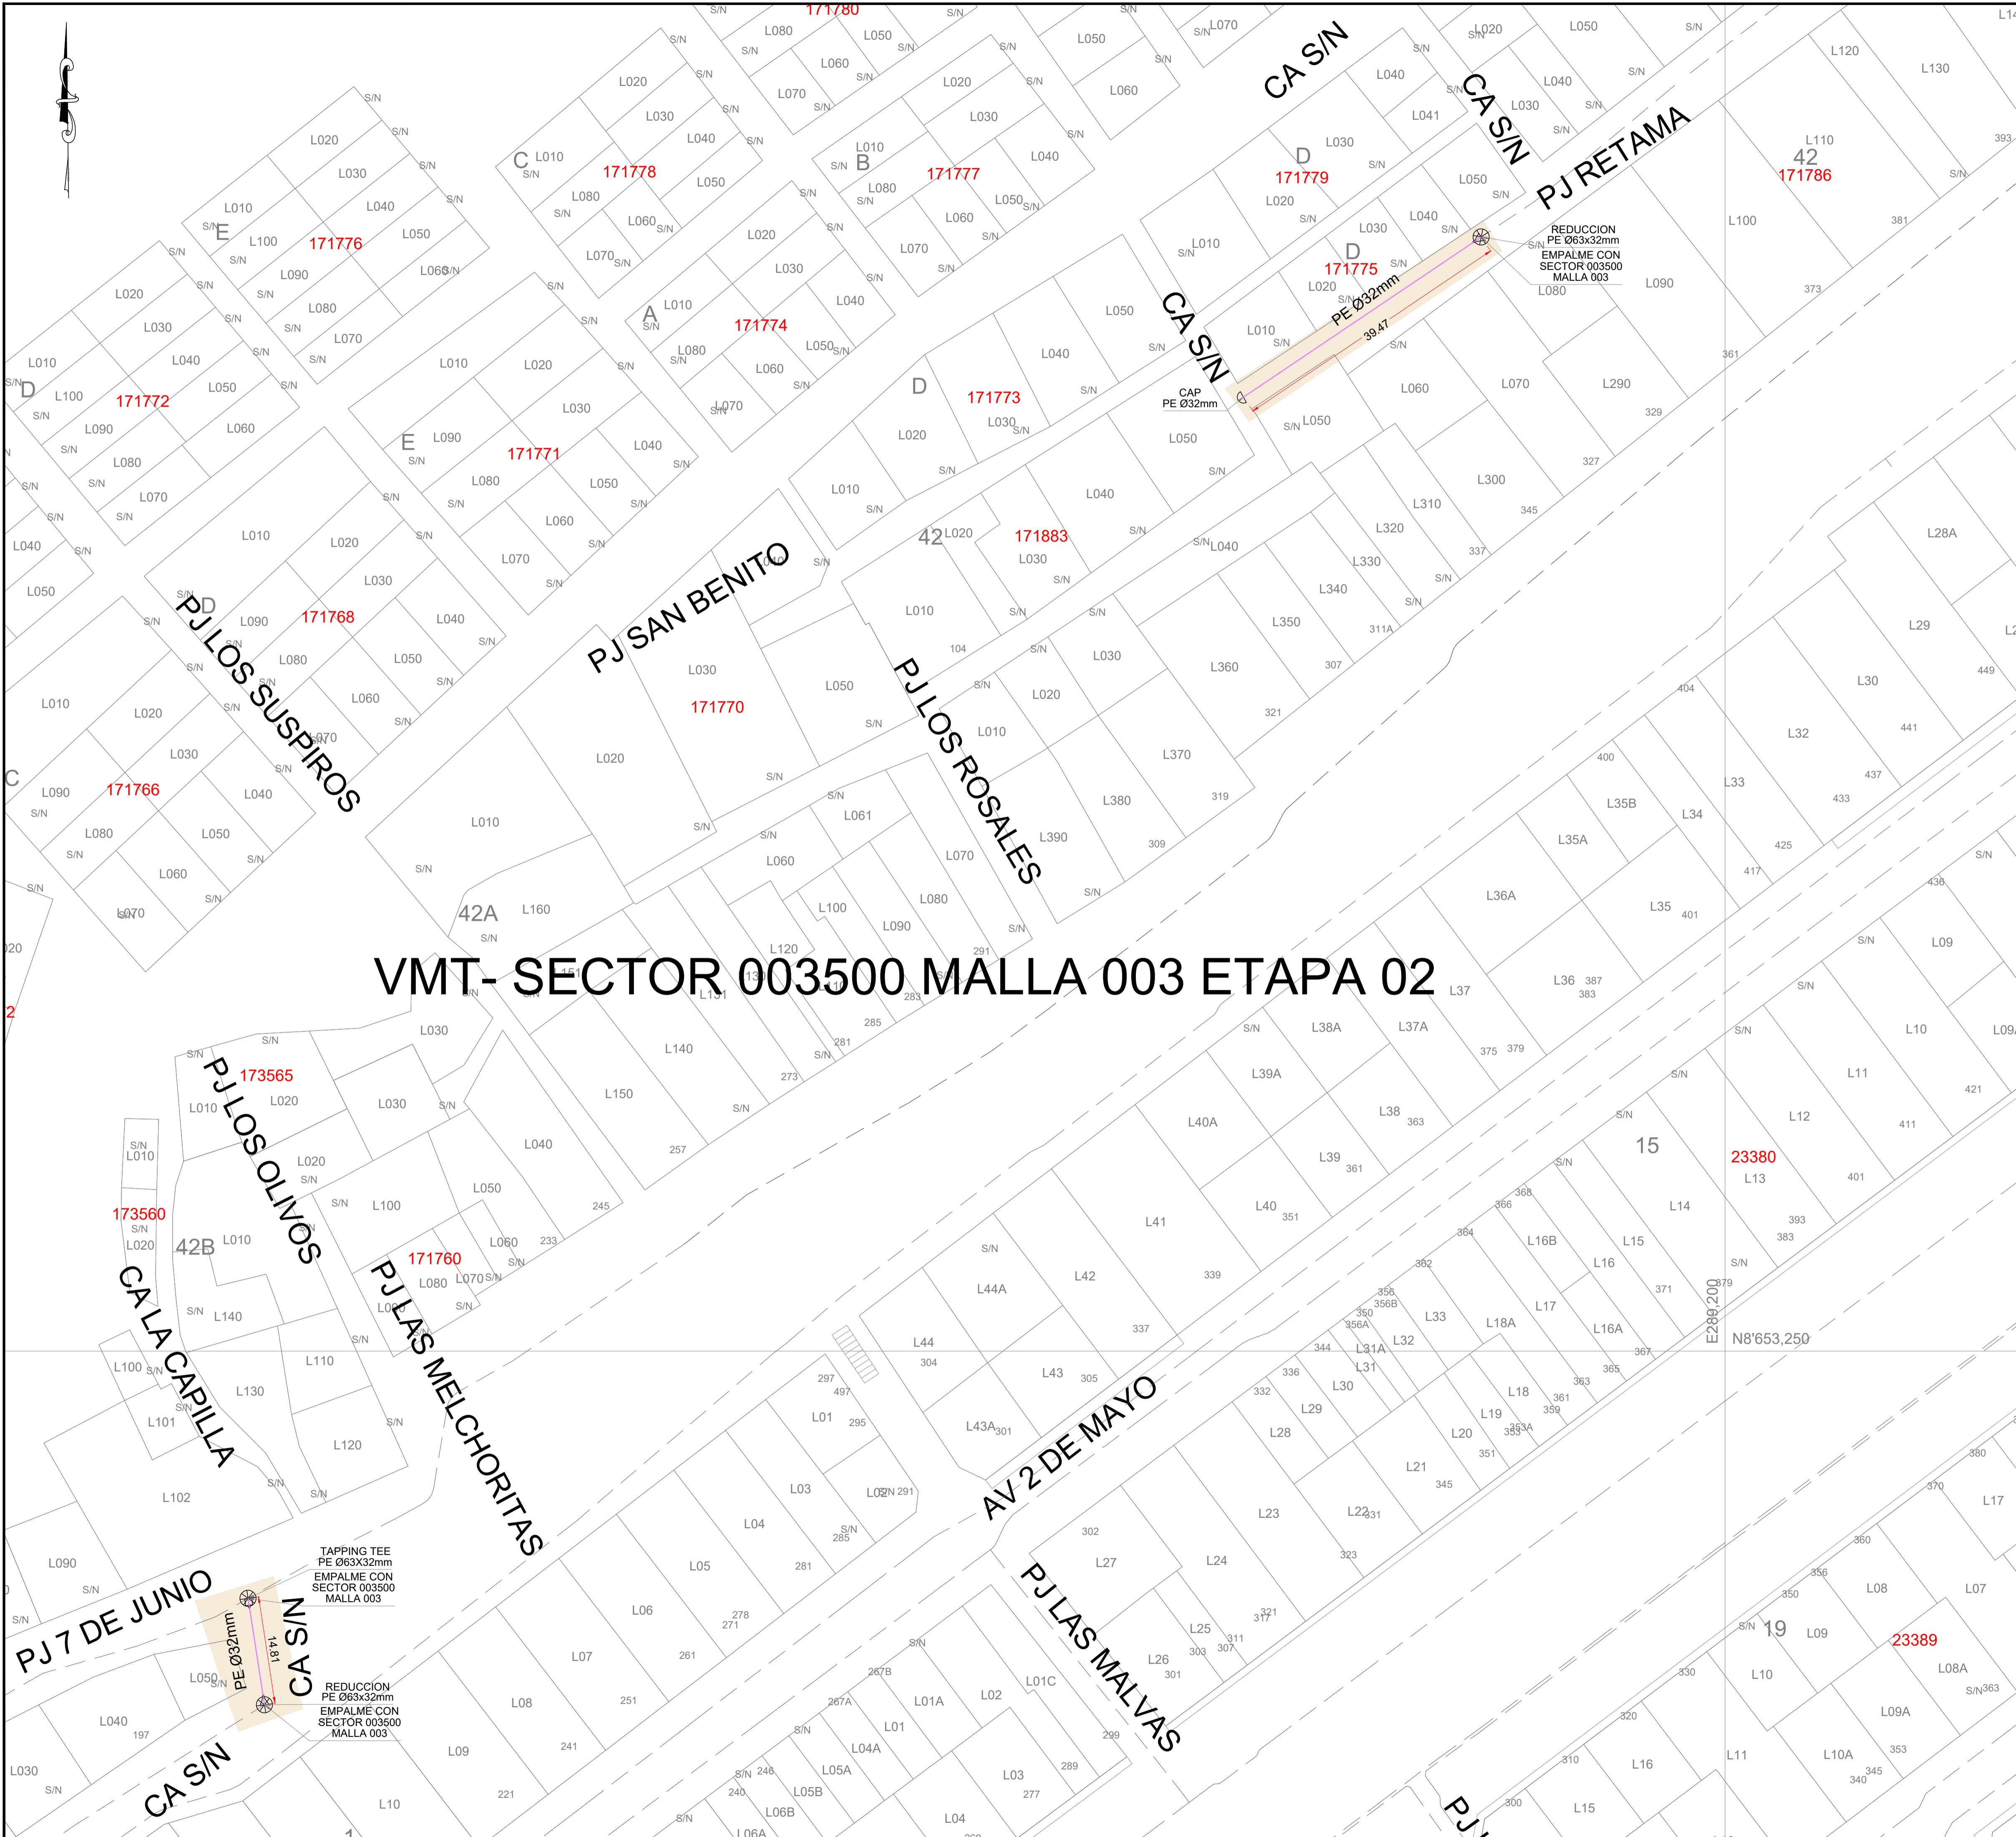

VMT- SECTOR 003500 MALLA 003 ETAPA 02

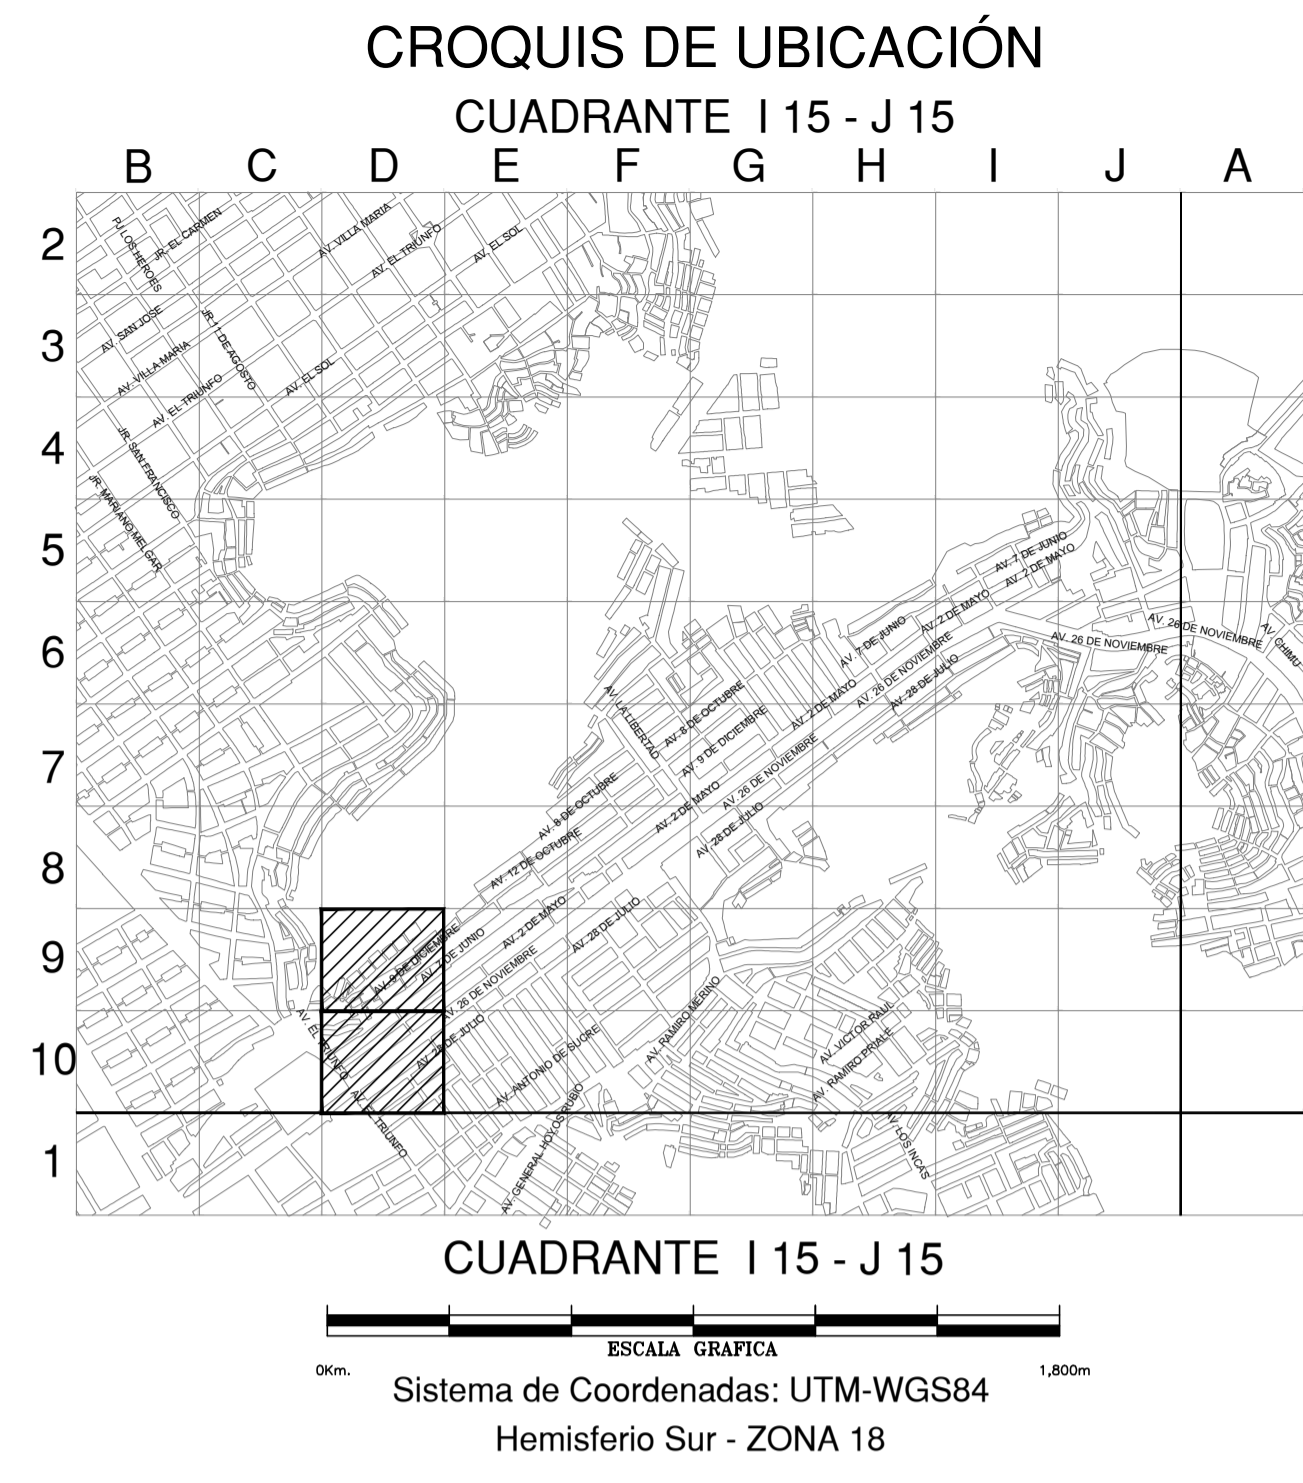

SIMBOLOGIA

Válvula		TEE de Todo Diámetro	
Tapón		Conexión con Silleta (TF)	
Reducción		Conexión con Tapping Tee (EF)	
Transición AC-PE		Conexión sin válvula de exceso de flujo	
ERP		Punto de Inicio de Progresiva: 0.00	
Triducto		Punto Control Topográfico	
Punto de emplante		Punto de salida de cable de detección en acometida	
Gabinete		Zona de protección mecánica de la red	
		Tramo con tapada diferente a la típica	

TIPO DE LINEA

TUBERÍA PE Ø200mm	PE200
TUBERÍA PE Ø160mm	PE160
TUBERÍA PE Ø110mm	PE110
TUBERÍA PE Ø90mm	PE90
TUBERÍA PE Ø63mm	PE63
TUBERÍA PE Ø32mm	PE32
TUBERÍA PE Ø20mm	PE20
TUBERÍA PE (CON GAS)	PE

Distancia mínima a edificaciones consideradas en el trazado : 1m

ZONA ARQUEOLOGICA

METRADOS	
DIAMETRO DE TUBERIA	LONGITUD (m)
PE Ø 32 mm	54.28
PE Ø 63 mm	---
PE Ø 90 mm	---
PE Ø 110 mm	---
PE Ø 160 mm	---
PE Ø 200 mm	---
TOTAL:	54.28

EDWIN YAUR URIBE SALAZAR
Ingeniero Civil
CIP N° 2514-T

Representante Técnico

A	PLANO PARA PERMISO	15-08-2022	MSF	EUS	EUS
REV.	DESCRIPCION	FECHA	ELABORÓ	REVISO	APROBO
LISTA DE REVISIONES					
		REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL EN LIMA Y CALLAO			
TITULO : PPE0-21-2675 - Redes de Polietileno - Villa Maria del Triunfo					
VMT - SECTOR 003500 MALLA 003 ETAPA 02					
Plano Maestro					
DIBUJO	M.S.F.	FECHA	15-08-2022	DISTRITO	VILLA MARIA DEL TRIUNFO
REVISO	E.U.S.	ESCALA	S/E	ZONA Y MALLA	SECTOR 003500 MALLA 003 ETAPA 02
APPROBÓ	E.U.S.	FILE	-	REEMPLAZA	-
				PLANO N°	PPE0-21-2675-02-PM-01
				REV.:	A
