

Lima, 15 de Febrero de 2022

TIPO Y NÚMERO	DOCUMENTO SOLICITANTE	FECHA DE REGISTRO	MESA DE PARTES	ENVIADO A	TRÁMITE	REFERENCIA	Nº DE FOLIOS	ESTADO
EXPEDIENTE 2022- 0024572	AUTORIZACIONES DE OBRAS EN VIAS PUBLICAS 2022	15/02/2022 03:43:28 PM	MESA DE PARTES VIRTUAL - GDU		26 EJECUCIÓN DE OBRAS EN ÁREAS DE USO PÚBLICO EN EL CERCADO DE LIMA Y EN VÍAS EXPRESAS, ARTERIALES Y COLECTORAS DE LA PROVINCIA DE LIMA 26.1 TRABAJOS DE EMERGENCIA MANTENIMIENTO Y/O AMPLIACION DE REDES		34	PAGADO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 126° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General, otorgamos poder general para efectos de la tramitación ordinaria de éste procedimiento al Señor EDER MERA LEON con DNI N° 10214048 Y/O el Sr. ROBERT VALVERDE ALVARADO con DNI N° 41195791, a fin que en nombre y representación de nuestra empresa, pueda revisar el expediente, realizar las gestiones necesarias orientadas a la obtención de los permisos y en su oportunidad proceder al recojo de la autorización que corresponda.

Asimismo, señalamos que de acuerdo al numeral 20.4 del artículo 20° del TUO de la Ley N° 27444, vuestro despacho nos podrá notificar a los siguientes correos electrónicos:

- casilla.electronica@proveedores.calidda.com.pe
- Gestion.Permisos@calidda.com.pe
- emera@meraasesores.com


POR TANTO:

A usted señor Gerente, mucho agradeceremos se sirva disponer lo necesario a efecto se nos proporcione la autorización solicitada, por corresponder a derecho.

Atentamente,




Roberto Franco Gianoli Hanke
Sub Gerente Legal




CÁLIDDA

C. Morelli 150
C.C La Rambla, Torre 2,
Teléfono: (51-1) 611-7500
San Borja, Lima, Perú



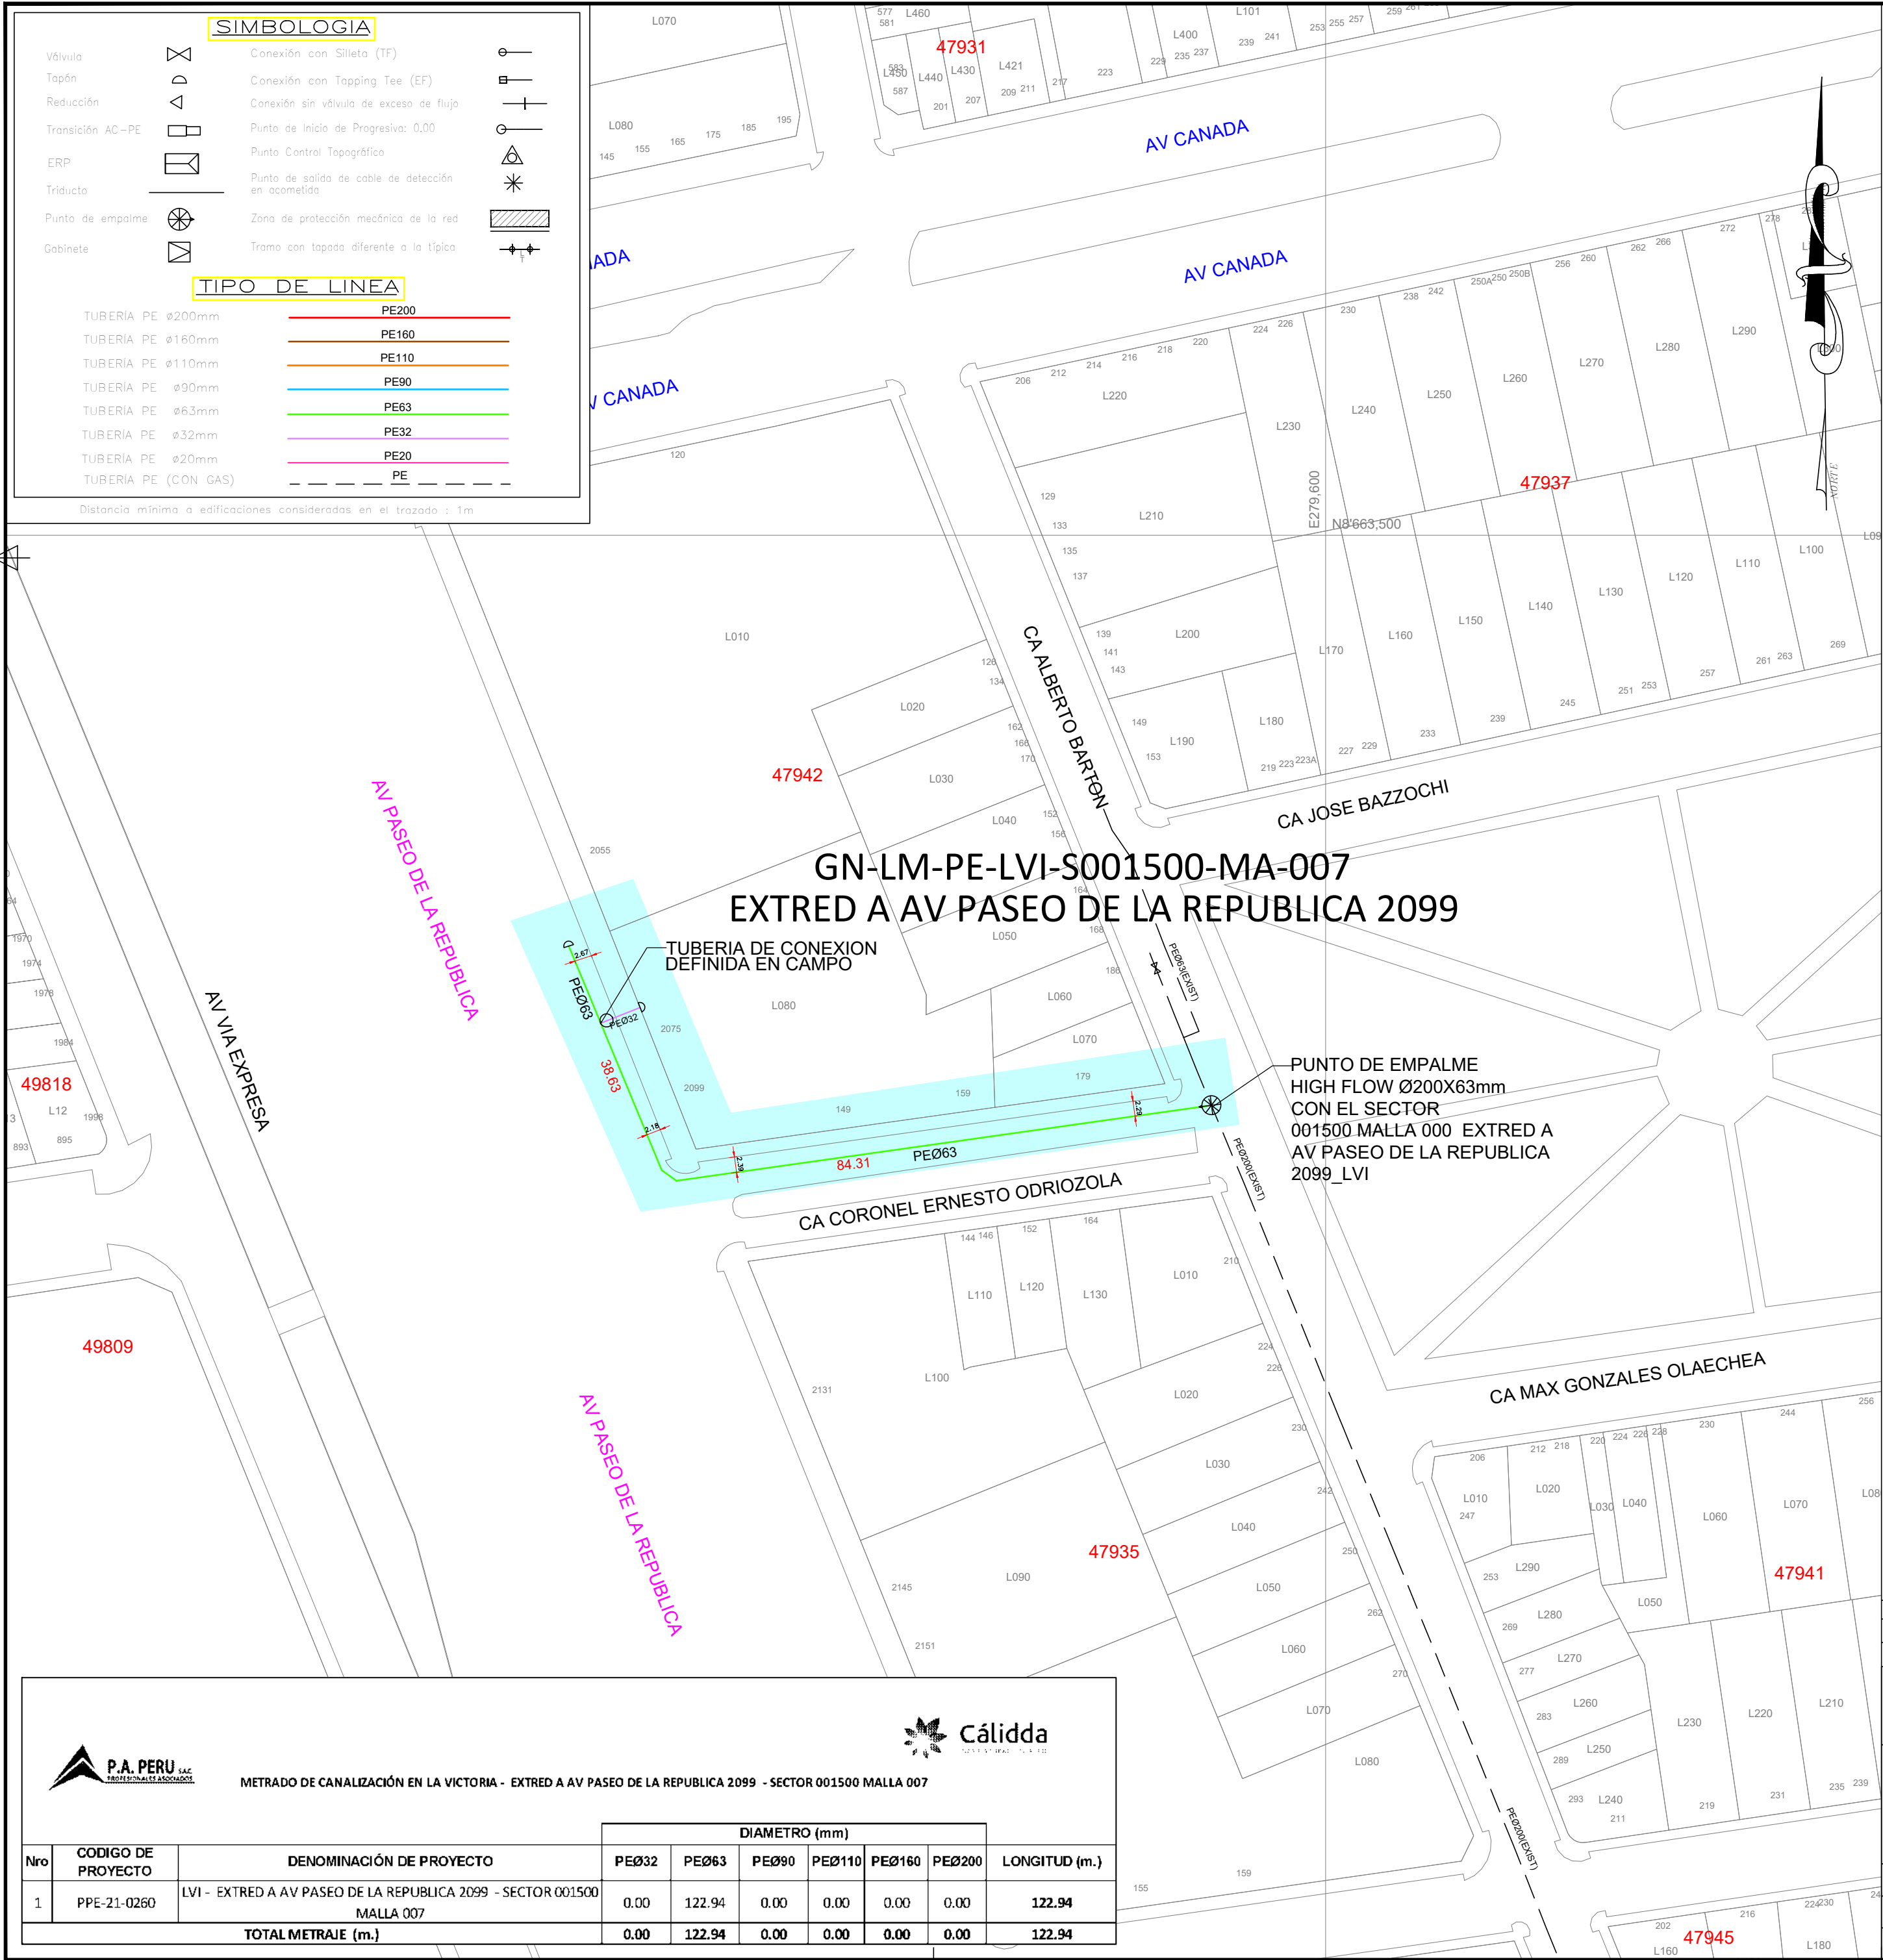

CROQUIS DE UBICACION
CUADRANTE E9-F9

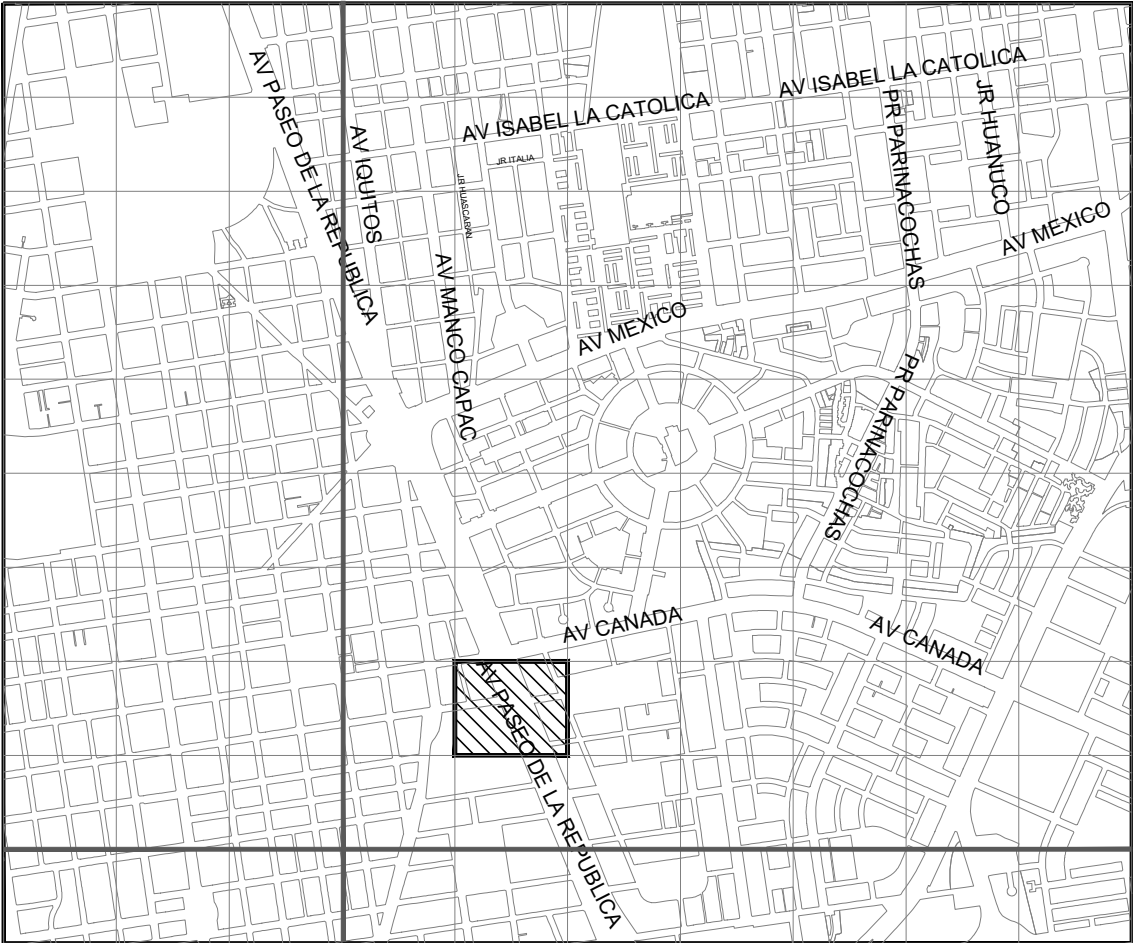

CUADRANTE E10-F10



ESCALA GRAFICA

Sistema de Coordenadas: UTM-WGS84
Hemisferio Sur - ZONA 18


César Daniel Peron Medina
INGENIERO MECÁNICO DE FLUIDOS
Reg. CIP N° 151706

Representante Técnico
(Contratista)

A	PARA PERMISOS	19/10/2021	LMOC	JMGV	CDPM
REV.	DESCRIPCIÓN	FECHA	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
LISTA DE REVISIONES					
 Cálidda GAS NATURAL DEL PERÚ		REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL EN LIMA Y CALLAO			
 P.A. PERU PROFESIONALES ASOCIADOS					
TITULO :		PPE-21-0260 REDES DE POLIETILENO - LA VICTORIA LVI - EXTRED A AV PASEO DE LA REPUBLICA 2099 LVI-SECTOR 001500 MALLA 007 PLANO MAESTRO			
DIBUJO :	LMOC	FECHA :	19/10/2021	DISTRITO :	LA VICTORIA
REVISO :	JMGV	ESCALA :	S/E	ZONA Y MALLA :	SECTOR 001500 MALLA 007
APROBO :	CDPM	FILE :	1/1	REEMPLAZA :	---
		PLANO N° :			REV. :
		PPE-21-0260-00-PM-01			A



P.A. PERU
SAC
PROFESIONALES ASOCIADOS



Cálidda
GAS NATURAL DEL PERÚ


METRADO DE CANALIZACIÓN EN LA VICTORIA - EXTRED A AV PASEO DE LA REPUBLICA 2099 - SECTOR 001500 MALLA 007

Nro	CODIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN DE PROYECTO	DIAMETRO (mm)						LONGITUD (m.)
			PEØ32	PEØ63	PEØ90	PEØ110	PEØ160	PEØ200	
1	PPE-21-0260	LVI - EXTRED A AV PASEO DE LA REPUBLICA 2099 - SECTOR 001500 MALLA 007	0.00	122.94	0.00	0.00	0.00	0.00	122.94
TOTAL METRAJE (m.)			0.00	122.94	0.00	0.00	0.00	0.00	122.94

CRONOGRAMA DE OBRA

PROYECTO: "EXTRED A AV PASEO DE LA REPUBLICA 2099- LVI- SECTOR 001500 MALLA 007"

Distrito: LA VICTORIA

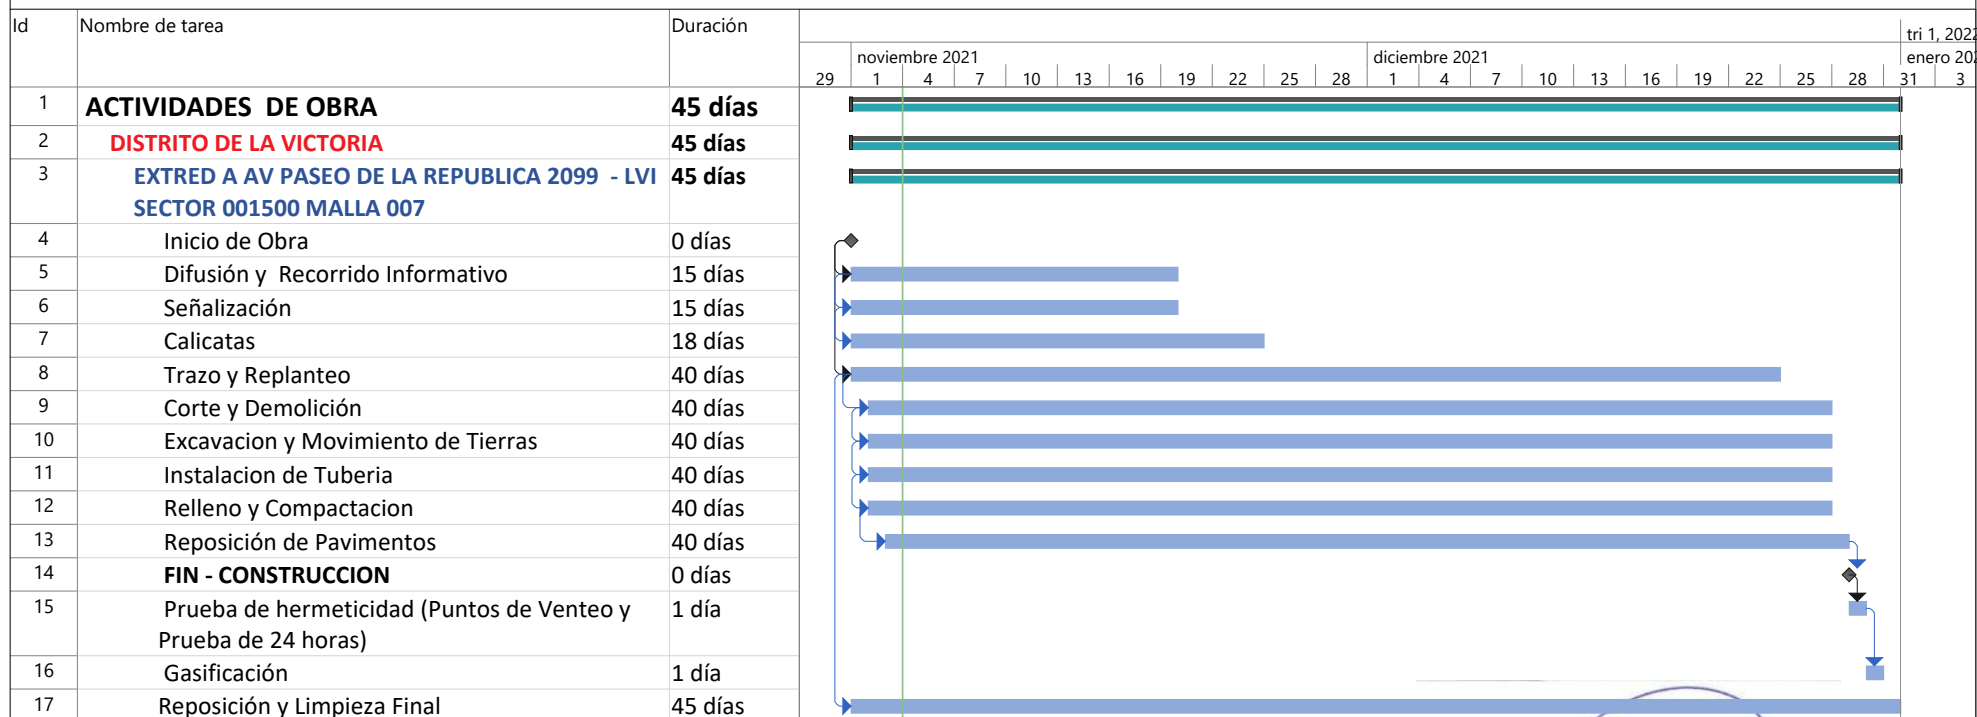


César Daniel Peron Medina
 INGENIERO MECÁNICO DE FLUIDOS
 REG. Nº 1706


Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual	
División		Hito inactivo		Resumen manual	
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo	
Resumen		Tarea manual		solo fin	
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas	

CRONOGRAMA DE OBRA

PROYECTO: "EXTRED A AV PASEO DE LA REPUBLICA 2099 - LVI - SECTOR 001500 MALLA 007"

Distrito: LA VICTORIA

Id	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración	diciembre 2021 19 22 25 28 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 03 06 09 12 15 18 21 24 tri 1, 2022 enero 2022																											
1	ACTIVIDADES DE OBRA	lun 22/11/21	vie 21/01/22	45 días																												
2	DISTRITO DE LA VICTORIA	lun 22/11/21	vie 21/01/22	45 días																												
3	AV PASEO DE LA REPUBLICA (SN) DESDE CA CORONEL ERNESTO ODRIOLZOLA HASTA UBIGEO 47942 L080	lun 22/11/21	vie 21/01/22	45 días																												
4	Inicio de Obra	lun 22/11/21	lun 22/11/21	0 días																												
5	Difusión y Recorrido Informativo	lun 22/11/21	vie 10/12/21	15 días																												
6	Señalización	lun 22/11/21	vie 10/12/21	15 días																												
7	Calicatas	lun 22/11/21	mié 15/12/21	18 días																												
8	Trazo y Replanteo	lun 22/11/21	vie 14/01/22	40 días																												
9	Corte y Demolición	mar 23/11/21	lun 17/01/22	40 días																												
10	Excavacion y Movimiento de Tierras	mar 23/11/21	lun 17/01/22	40 días																												
11	Instalacion de Tuberia	mar 23/11/21	lun 17/01/22	40 días																												
12	Relleno y Compactacion	mar 23/11/21	lun 17/01/22	40 días																												
13	Reposición de Pavimentos	mié 24/11/21	mar 18/01/22	40 días																												
14	FIN - CONSTRUCCION	mar 18/01/22	mar 18/01/22	0 días																												
15	Prueba de hermeticidad (Puntos de Venteo y Prueba de 24 horas)	mié 19/01/22	mié 19/01/22	1 día																												
16	Gasificación	jue 20/01/22	jue 20/01/22	1 día																												
17	Reposición y Limpieza Final	lun 22/11/21	vie 21/01/22	45 días																												



César Daniel Peres Medina
INGENIERO MECÁNICO DE FLUIDOS
Reg. CIP N° 151706

Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			
