



CODIGO DE PROYECTO: PPE-19-(1616-1618), 1621, 1623

Lima, 2 de febrero de 2022

Señores

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Presente. -



Asunto: Solicita autorización para la ejecución de obras del proyecto denominado "SRQ - SECTOR - 000700 - MALLA (000-002), 005, 007"

Radicado : R2022-004204

De nuestra consideración:

Gas Natural de Lima y Callao S.A. - Cálidda, identificada con RUC N° 20503758114, debidamente representada por su apoderado el Señor Roberto Franco Gianoli Hanke, Identificado con DNI N° 10609610, con poderes inscritos en la partida electrónica N° 11352499 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, ante usted respetuosamente, nos presentamos y decimos:

Que, en el marco del proyecto de masificación del servicio público de gas natural promovido por el Gobierno Central (Proyecto Camisea), venimos a solicitar autorización para la ejecución de obras del proyecto denominado **"SRQ - SECTOR - 000700 - MALLA (000-002), 005, 007"** ubicado en el **Distrito de Surquillo**, tal como se señala en los planos de ubicación y la memoria descriptiva que se adjuntan.

Conforme a lo señalado en el Art. 81 de Decreto Supremo N° 042-99-EM (Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos), el concesionario de distribución podrá abrir los pavimentos, calzadas y aceras de las vías públicas que se encuentren dentro del área de concesión, previa notificación a la Municipalidad respectiva, quedando obligado a efectuar la reparación que sea menester dentro del plazo otorgado por dicha Municipalidad.

El estudio de Impacto Ambiental del mencionado proyecto ha sido aprobado mediante R.D N°0116-2004-MEM/AAM de fecha 13 de agosto del 2004, expedida por la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y Minas.

En virtud de lo antes expuesto, y de conformidad con lo establecido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad, adjuntamos la siguiente documentación:

1. Plano de Ubicación
2. Planos de planta y perfil
3. Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas
4. Cronograma de Obra

CÁLIDDA
C. Morelli 150
C.C. La Rambla, Torre 2,
Teléfono: (51-0) 611-7500
San Borja, Lima, Perú





Por su parte, informamos la contratación de la empresa **GYA CONSTRUCCIONES SAC** identificada con RUC N° 20392466275, para la elaboración de dichos trabajos contando como responsable por parte de la empresa contratista con el Ingeniero Jairo Cordero Olivera, con registro del Colegio de Ingenieros N° 230690; asimismo, nuestra representada designa como persona responsable al Ingeniero Raúl García, con Registro del Colegio de Ingenieros N° 64179.

En ese sentido, en conformidad con lo dispuesto en el numeral 124.1 del artículo 124° del TUO de la Ley N° 27444, otorgamos poder general para efectos de la tramitación ordinaria de este procedimiento al señor **EDER RULY MERA LEÓN** identificado con DNI N° 10214048 Y/O el Sr. **ROBERT VALVERDE ALVARADO** con DNI N° 41195791, a fin que en nombre y representación de nuestra empresa, pueda revisar el expediente, realizar las gestiones necesarias orientadas a la obtención de los permisos y en su oportunidad proceder al recojo de la autorización que corresponda, hasta la finalización del proyecto.

POR TANTO:

A usted señor Gerente, mucho agradeceremos se sirva disponer lo necesario a efecto se nos proporcione la autorización solicitada, por corresponder a derecho.

Atentamente,

Firmado Digitalmente por:
**ROBERTO FRANCO GIANOLI
HANKE**
Fecha: 02/02/2022 18:52:04

Roberto Franco Gianoli Hanke
Sub Gerente Legal



CÁLIDDA
C. Morelli 150
C.C. La Rambla, Torre 2,
Teléfono: (51-1) 611-7500
San Borja, Lima, Perú




CRONOGRAMA DE OBRA
Proyecto: "SRQ - S000700 M000-001-002-005-007"
Distrito: SURQUILLO

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	febrero 2022					marzo 2022					abril 2022			
					5	10	15	20	25	2	7	12	17	22	27	1	6	11
1	ACTIVIDADES DE OBRA	45 días	jue 10/02/22	mié 13/04/22														
2	Inicio de Obra	0 días	jue 10/02/22	jue 10/02/22														
3	Recorrido Informativo y Difusión	45 días	jue 10/02/22	mié 13/04/22														
4	Replanteo de Trazo	44 días	jue 10/02/22	mar 12/04/22														
5	Señalización	45 días	jue 10/02/22	mié 13/04/22														
6	SURQUILLO	45 días	jue 10/02/22	mié 13/04/22														
7	SRQ - S000700 M000-001-002-005-007	45 días	jue 10/02/22	mié 13/04/22														
8	Calicatas	37 días	jue 10/02/22	vie 1/04/22														
9	Corte y Demolición	37 días	vie 11/02/22	lun 4/04/22														
10	Excavación	37 días	lun 14/02/22	mar 5/04/22														
11	Tendido de tubería	37 días	mar 15/02/22	mié 6/04/22														
12	Relleno y Compactación	37 días	mié 16/02/22	jue 7/04/22														
13	Acabado vereda y/o pista (Resane)	37 días	jue 17/02/22	vie 8/04/22														
14	FIN - CONSTRUCCION	0 días	vie 8/04/22	vie 8/04/22														
15	Prueba de hermeticidad (Puntos de Venteo y Prueba de 24 horas)	2 días	lun 11/04/22	mar 12/04/22														
16	Gasificación	1 día	mié 13/04/22	mié 13/04/22														
17	Limpieza y Aseo	45 días	jue 10/02/22	mié 13/04/22														

Jairo J. Cordero Olivera
INGENIERO CIVIL
CIP N° 230690
GYA CONSTRUCCIONES SAC

Tarea		Hito exteTarea		Informe de resumen manual	
División		Tarea inactiva		Resumen manual	
Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
Resumen del proyecto		Tarea manual		Progreso	
Tareas externas		Sólo duración		División	

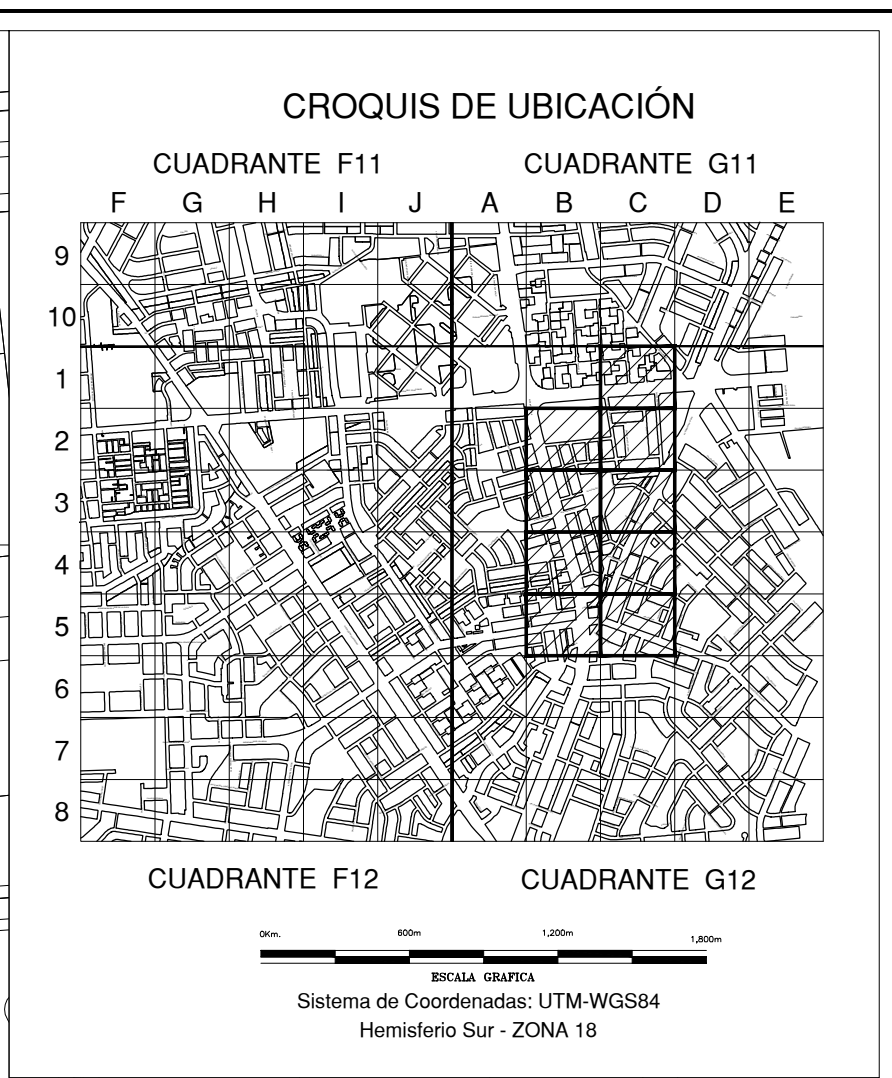

SIMBOLOGIA

WVLU	Conexión con Silleta (TF)	WVLU	Conexión con Tapping Tree (EF)
Tapón	Conexión sin válvula de exceso de flujo	Tapón	Punto de Inicio de Progresiva: 0.00
Reducción	Punto Control Topográfico	Reducción	Punto de salida de cable de detección en acometida
Tronadura AC-PE	Punto de salida de cable de detección en acometida	Tronadura AC-PE	Zona de protección mecánica de la red
ERP	Tramo con tapado diferente a la típica	ERP	
Triducto		Triducto	
Punto de emplante		Punto de emplante	
Gabinete		Gabinete	

TIPO DE LINEA

TUBERIA PE #200mm	PE200
TUBERIA PE #160mm	PE160
TUBERIA PE #110mm	PE110
TUBERIA PE #90mm	PE90
TUBERIA PE #63mm	PE63
TUBERIA PE #32mm	PE32
TUBERIA PE #20mm	PE20
TUBERIA PE (CON GAS)	PE

LISTA DE METRADOS

Ø TUBERIA	LONGITUD
Ø 20 mm	6084.57
Ø 32 mm	1623.3
Ø 63 mm	1623.3
Ø 90 mm	327.62
Ø 110 mm	327.62
Ø 160 mm	327.62
Ø 200 mm	327.62
Total	8035.32

Jairo J. Cordero Olvera
INGENIERO CIVIL
CIP N° 230690
GYA CONSTRUCCIONES SAC

LISTA DE REVISIONES

REV.	DESCRIPCION	FECHA	ELABORADO	REVISADO	APPROBADO
1					

REDES DE DISTRIBUCION DE GAS NATURAL EN LIMA Y CALLAO

PLANO MAESTRO

PPE-19-1616-1617-1618-1621-1623) - REDES DE POLIETILENO - SURQUILLO
SRQ - S000700 M000-001-002-005-007

TRUJILLO: 19/05/2022
LIMA: 19/05/2022
CALLAO: 19/05/2022
REVISADO: 19/05/2022
ELABORADO: 19/05/2022
APPROBADO: 19/05/2022
