

★2023-110596★



CÓDIGO DEL PROYECTO: PPE0-21-1086, 1087, 1090-1092

Lima, 19 de Abril de 2023

Señores  
**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES**  
**GERENCIA DE DESARROLLO URBANO**  
Presente. -

Asunto : Solicita autorización para la ejecución de obras del proyecto denominado "SJM - SECTOR 000202 MALLA 000, 001 - SECTOR 000203 MALLA 001 - SECTOR 000205 MALLA 001 - SECTOR 000206 MALLA 002"

Radicado : R2023-020523

De nuestra consideración:

**Gas Natural de Lima y Callao S.A. - Cálidda**, identificada con RUC N° 20503758114, debidamente representada por su apoderado el Señor Roberto Franco Gianoli Hanke, Identificado con DNI N° 10609610, con poderes inscritos en la partida electrónica N° 11352499 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, ante usted respetuosamente, nos presentamos y decimos:

Que, en el marco del proyecto de masificación del servicio público de gas natural promovido por el Gobierno Central (Proyecto Camisea), venimos a solicitar autorización para la ejecución de obras del proyecto denominado "**SJM - SECTOR 000202 MALLA 000, 001 - SECTOR 000203 MALLA 001 - SECTOR 000205 MALLA 001 - SECTOR 000206 MALLA 002**" ubicado en el distrito de **San Juan de Miraflores**, tal como se señala en los planos de ubicación y la memoria descriptiva que se adjuntan.

Conforme a lo señalado en el Art. 81 de Decreto Supremo N° 042-99-EM (Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos), el concesionario de distribución podrá abrir los pavimentos, calzadas y aceras de las vías públicas que se encuentren dentro del área de concesión, previa notificación a la Municipalidad respectiva, quedando obligado a efectuar la reparación que sea menester dentro del plazo otorgado por dicha Municipalidad.

El estudio de Impacto Ambiental del mencionado proyecto ha sido aprobado mediante R.D N°0116-2004-MEM/AAM de fecha 13 de agosto del 2004, expedida por la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y Minas.

En virtud de lo antes expuesto, y de conformidad con lo establecido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad, adjuntamos la siguiente documentación:

1. Plano de Ubicación
2. Planos de planta y perfil
3. Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas
4. Cronograma de Obra

Cálidda  
Calle...  
Teléfono...  
...



Por su parte, informamos la contratación de la empresa **COMERCIALIZADORA S&E PERÚ S.A.C** identificada con RUC N°20511535612 para la elaboración de dichos trabajos contando como responsable por parte de la empresa contratista con el Ingeniero John Campos Castillo, con registro del Colegio de Ingenieros N°48335; asimismo, nuestra representada designa como persona responsable al Ingeniero Raúl García con registro del Colegio de Ingenieros N°64179.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 126° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General, otorgamos poder general para efectos de la tramitación ordinaria de este procedimiento al Señor **EDER MERA LEON** con DNI N° 10214048 Y/O el Sr. **ROBERT VALVERDE ALVARADO** con DNI N° 41195791, a fin de que en nombre y representación de nuestra empresa, pueda realizar las gestiones correspondientes hasta la finalización del proyecto.

Asimismo, señalamos que de acuerdo con el numeral 20.4 del artículo 20° del T.U.O. de la Ley N° 27444, nuestro despacho nos podrá notificar a los siguientes correos electrónicos:

- [casilla.electronica@proveedores.calidda.com.pe](mailto:casilla.electronica@proveedores.calidda.com.pe)
- [Gestion.Permisos@calidda.com.pe](mailto:Gestion.Permisos@calidda.com.pe)
- [emera@meraasesores.com](mailto:emera@meraasesores.com)

#### **POR LO EXPUESTO**

Presentamos la presente comunicación para los fines pertinentes y en el marco de la normativa aplicable.

Atentamente,

Firmado Digitalmente por:  
**ROBERTO FRANCO GIANOLI  
HANKE**  
Fecha: 19/04/2023 16:27:46

**Roberto Franco Gianoli Hanke**  
Sub Gerente Legal



PROYECTO: REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO  
 CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA **S&E** PERU SAC.

# RED DE DISTRIBUCIÓN EN PE PROYECTO


Id	Nombre de tarea	Duración	Diagrama de Gantt	
			T2	T3
1	<b>SAN JUAN DE MIRAFLORES</b>	<b>55 días</b>		
2	<b>ETAPA 01</b>	<b>25 días</b>		
3	SJM - SECTOR 00203 MALLA 000	25 días		
4	SJM - SECTOR 00205 MALLA 001	25 días		
5	SJM - SECTOR 00206 MALLA 002	25 días		
6	<b>PERÍMETRO INTERNO:</b>	<b>25 días</b>		
7	AV. CAMINO REAL – CA S/N – AV. PRINCIPAL – CA S/N – CA S/N	25 días		
8	RECORRIDO INFORMATIVO	1 día		
9	CALICATAS	15 días		
10	CORTE Y DEMOLICIÓN DEL PAVIMENTO	16 días		
11	EXCAVACIÓN	16 días		
12	TENDIDO DE TUBERÍA	16 días		
13	RELLENO Y COMPACTACIÓN	16 días		
14	REPOSICIÓN	16 días		
15	LIMPIEZA DE LA ZONA.	17 días		
16	<b>PRUEBAS Y GASIFICACIONES</b>	<b>5 días</b>		
17	<b>ETAPA 02</b>	<b>30 días</b>		
18	SJM - SECTOR 00202 MALLA 000	30 días		
19	SJM - SECTOR 00202 MALLA 001	30 días		
20	SJM - SECTOR 00203 MALLA 001	30 días		
21	<b>PERÍMETRO INTERNO:</b>	<b>30 días</b>		
22	AV. CAMINO REAL – PJ. 17 DE FEBRERO - AV. INTEGRACION - PJ. 4 - CA. MACHU PICCHU – CA S/N – CA S/N	30 días		
23	<b>PERÍMETRO EXTERNO:</b>	<b>25 días</b>		
24	AV CAMINO REAL SENTIDO SUR-NORTE DESDE ALT CA S/N HASTA ALT AV INTEGRACION	25 días		
25	RECORRIDO INFORMATIVO	1 día		
26	CALICATAS	20 días		
27	CORTE Y DEMOLICIÓN DEL PAVIMENTO	21 días		
28	EXCAVACIÓN	21 días		
29	TENDIDO DE TUBERÍA	21 días		
30	RELLENO Y COMPACTACIÓN	21 días		
31	REPOSICIÓN	21 días		
32	LIMPIEZA DE LA ZONA.	22 días		
33	<b>PRUEBAS Y GASIFICACIONES</b>	<b>5 días</b>		

  
**JOHN ROBINSON  
 CAMPOS CASTILLO**  
 INGENIERO CIVIL  
 REG. S.P. N° 48335

PROYECTO: REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO

Tarea		Inactive Summary	
División		Manual Task	
Hito		Duration-only	
Resumen		Manual Summary Rollup	
Resumen del proyecto		Manual Summary	
Tareas externas		Start-only	
Hito externo		Finish-only	
Inactive Task		Progreso	
Inactive Milestone		Fecha límite	



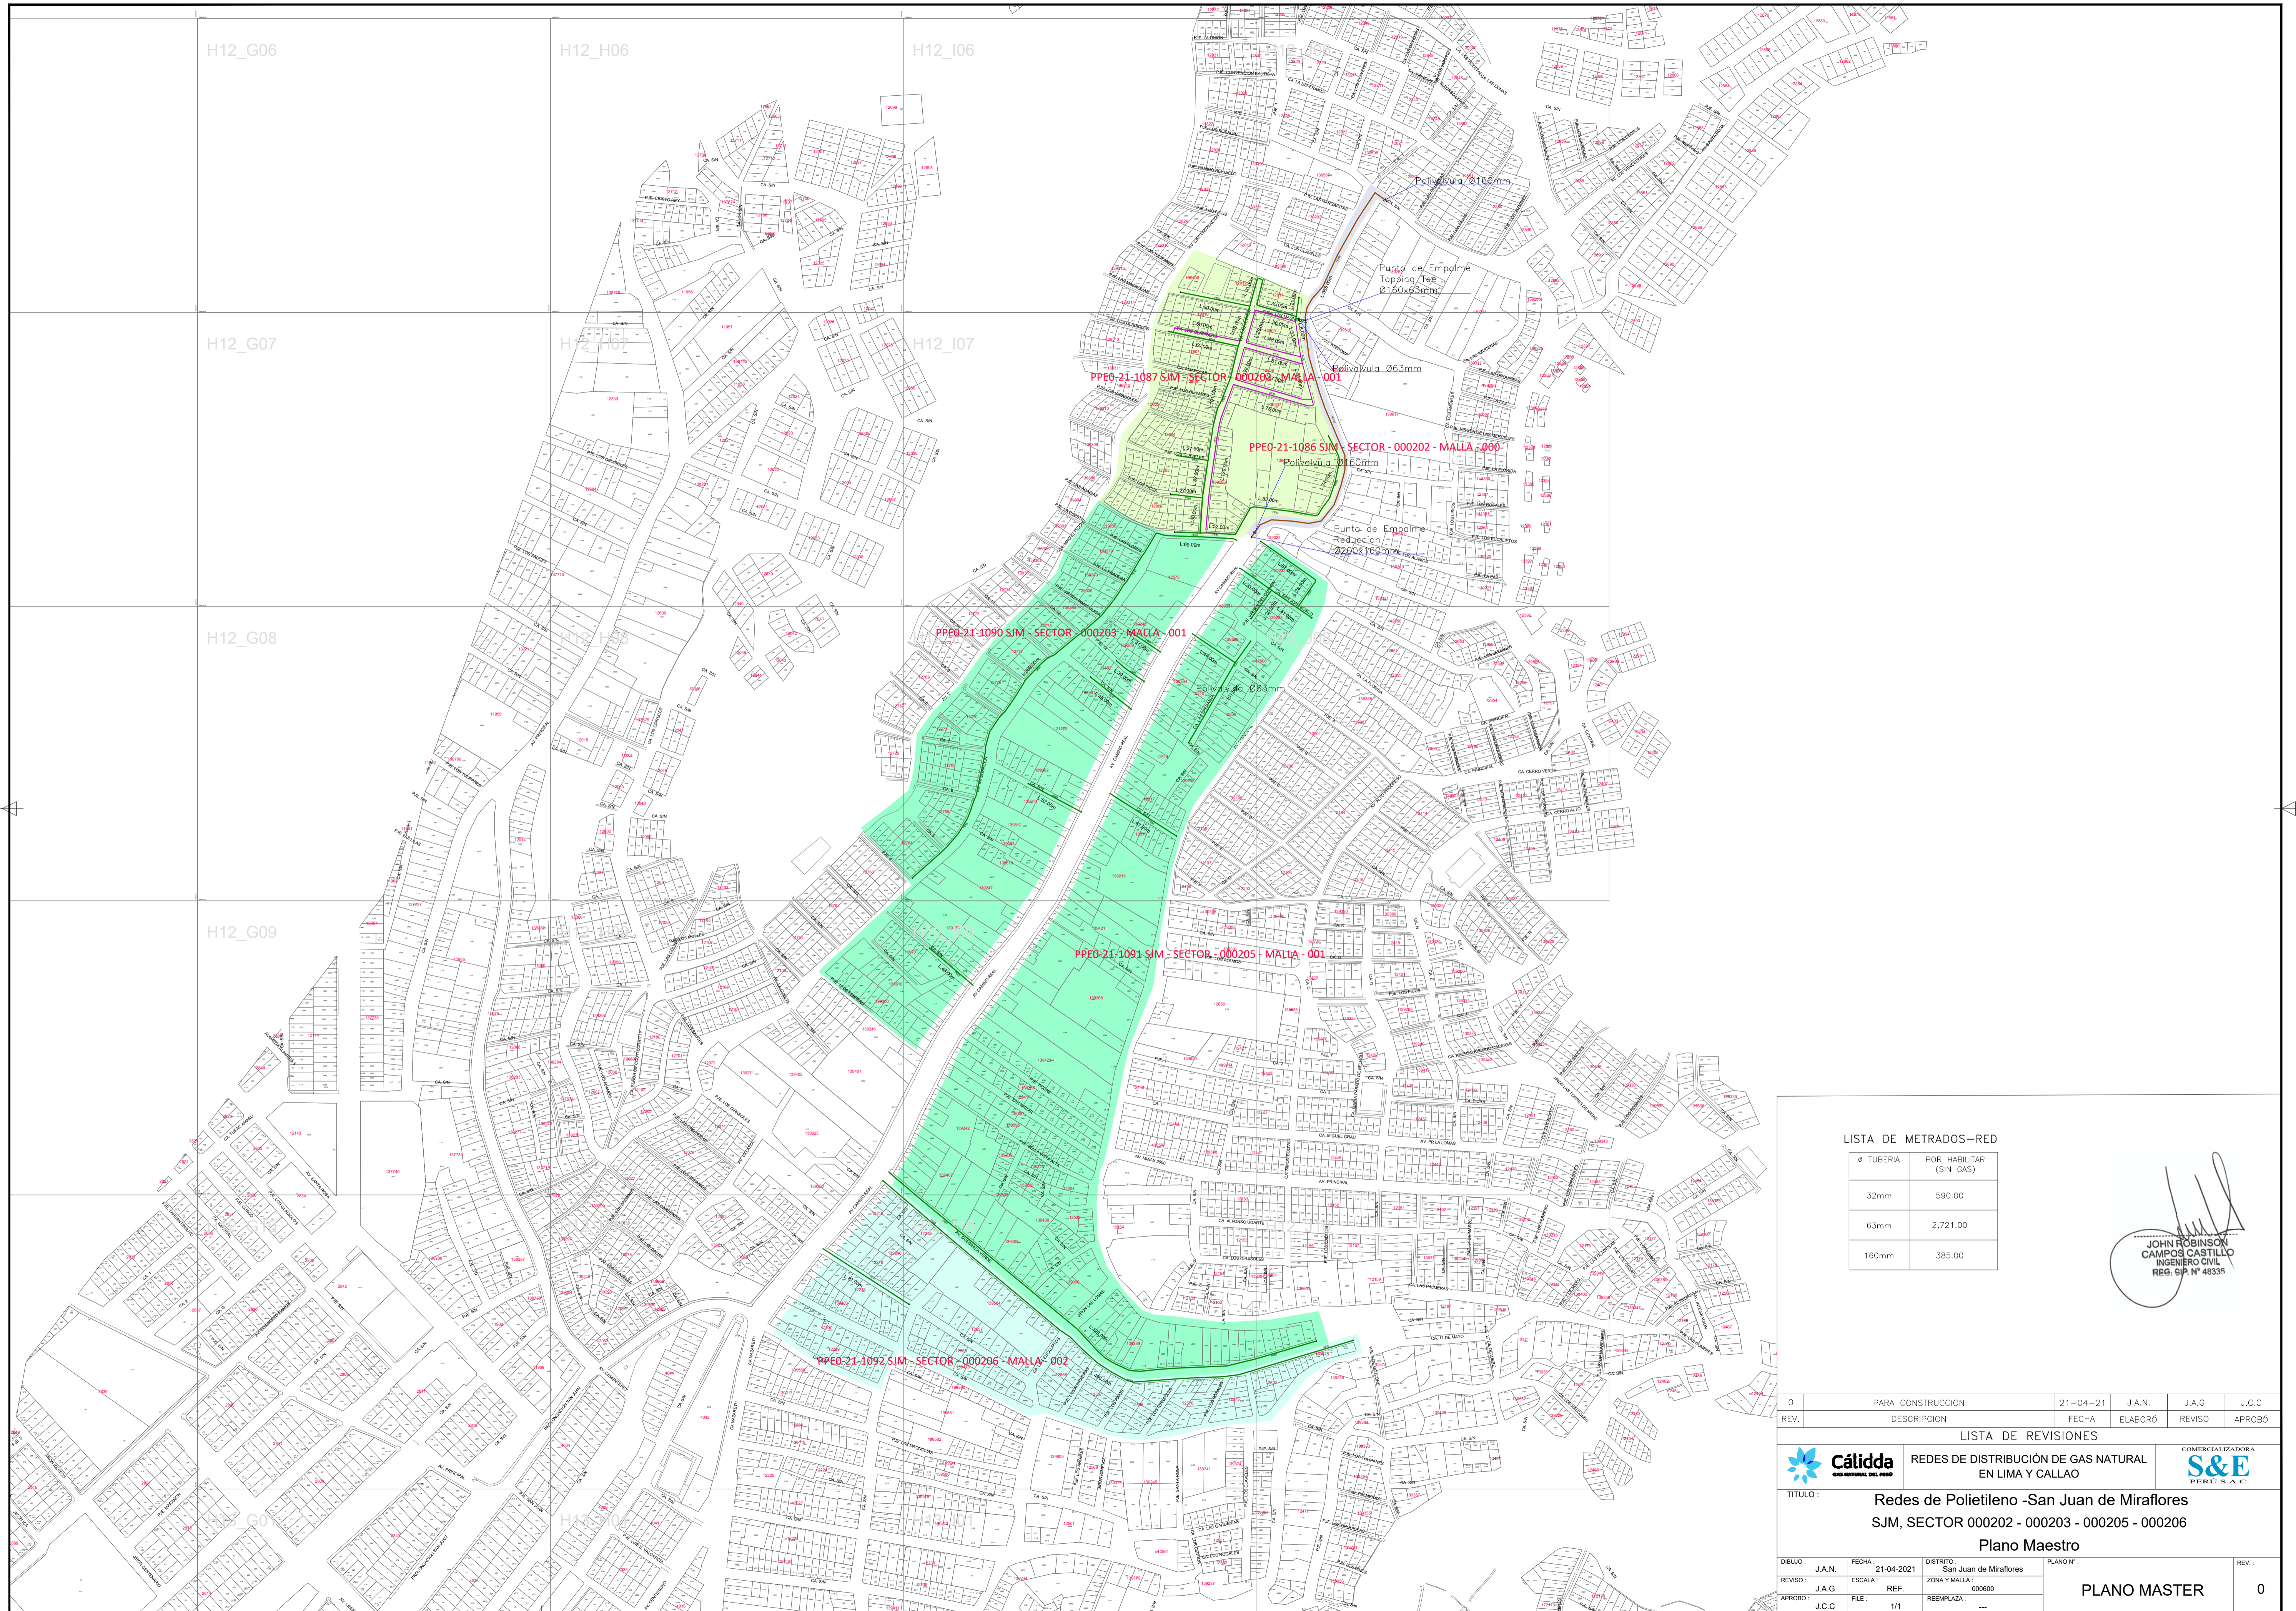

LISTA DE METRADOS-RED

Ø TUBERIA	POR HABITAR (SIN GAS)
32mm	590.00
63mm	2.721.00
160mm	385.00

  
 JOHN ROBINSON  
 CAMPOS CASTILLO  
 INGENIERO CIVIL  
 REG. GIP N° 48335

0	PARA CONSTRUCCION	21-04-21	J.A.N.	J.A.G	J.C.C
REV.	DESCRIPCION	FECHA	ELABORÓ	REVISO	APROBÓ
LISTA DE REVISIONES					
		<b>REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL EN LIMA Y CALLAO</b>			
<b>TITULO: Redes de Polietileno -San Juan de Miraflores</b> <b>SJM, SECTOR 000202 - 000203 - 000205 - 000206</b> <b>Plano Maestro</b>					
DIBUJO:	J.A.N.	FECHA:	21-04-2021	DISTRITO:	San Juan de Miraflores
REVISO:	J.A.G	ESCALA:	REF.	ZONA Y MALLA:	000600
APROBO:	J.C.C	FILE:	1/1	REEMPLAZA:	---
<b>PLANO MASTER</b>					<b>0</b>
