

Re: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EJECUCIÓN DE OBRAS EN LA VIA PÚBLICA: SECTOR 005201 MALLA 001" ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho.

Some content in this message has been blocked because the sender isn't in your Safe senders list. [Show blocked content](#)



InHouseCalidda Hervas <inhousecalidda@hervas.com.pe>

To: Despacho Correspondencia <despacho.correspondencia@proveedores.calidda.com.pe>

Cc: InHouseCalidda 2 Hervas <INHOUSECALIDDA2@hervas.com.pe>; Eder Mira <emira@merasesores.com> **+2 others**

Thu 1/13/2022 8:07 AM



Estimada,



Se ingresó el documento a la casilla virtual.

Saludos,

Atte.

Id	Nombre de tarea	Duración	D-1 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17 D18 D19 D20 D21 D22 D23 D24 D25 D26 D27 D28 D29 D30 D31 D32 D33 D34 D35 D36 D37 D38 D39 D40 D41 D42 D43 D44 D45 D46 D47 D48 D49 D50 D51 D52 D53 D54 D55 D56 D57 D58 D59 D60 D61 D62 D63 D64 D65 D66 D67 D68 D69 D70 D71 D72 D73 D74 D75 D76 D77 D78 D79 D80 D81 D82 D83 D84 D85 D86 D87 D88 D89 D90
1	ACTIVIDADES DE OBRA	90 días	[Barra azul completa]
2	DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	90 días	[Barra azul completa]
3	S JL - SECTOR 005201 MALLA 001	90 días	[Barra azul completa]
4	Inicio de Obra	0 días	[Punto de inicio]
5	Recorrido Informativo y Difusión	90 días	[Barra azul completa]
6	Replanteo de Trazo	90 días	[Barra azul completa]
7	Señalización	90 días	[Barra azul completa]
8	Calicatas	20 días	[Barra azul, días 1-20]
9	Corte y Demolición	85 días	[Barra azul, días 1-85]
10	Excavación	85 días	[Barra azul, días 1-85]
11	Tendido de tubería	85 días	[Barra azul, días 1-85]
12	Relleno y Compactación	80 días	[Barra azul, días 1-80]
13	Acabado vereda y/o pista (Resane)	80 días	[Barra azul, días 1-80]
14	FIN - CONSTRUCCION	0 días	[Punto de fin]
15	Prueba de hermeticidad (Puntos de Venteo y Prueba de 24 horas)	2 días	[Barra azul, días 88-89]
16	Gasificación	1 día	[Barra azul, día 90]
17	Limpieza y Aseo	90 días	[Barra azul completa]
18	Fin de obra	0 días	[Punto de fin]

Tarea	[Barra azul]	Resumen	[Barra azul con flecha]	Tarea resumida	[Barra azul con flecha]	Tareas externas	[Barra gris]	Hito inactivo	[Diamante]	solo duración	[Barra azul con flecha]	solo el comienzo	[Barra azul]	Progreso	[Barra azul con flecha]
División	[Puntos azules]	Resumen del proyecto	[Barra azul con flecha]	Hito resumido	[Diamante]	Hito externo	[Diamante]	Resumen inactivo	[Barra azul con flecha]	Informe de resumen manual	[Barra azul con flecha]	solo fin	[Barra azul]		
Hito	[Diamante]	Agrupar por síntesis	[Barra azul con flecha]	Progreso resumido	[Barra azul con flecha]	Tarea inactiva	[Barra gris]	Tarea manual	[Barra azul con flecha]	Resumen manual	[Barra azul con flecha]	Fecha limite	[Barra azul con flecha]		

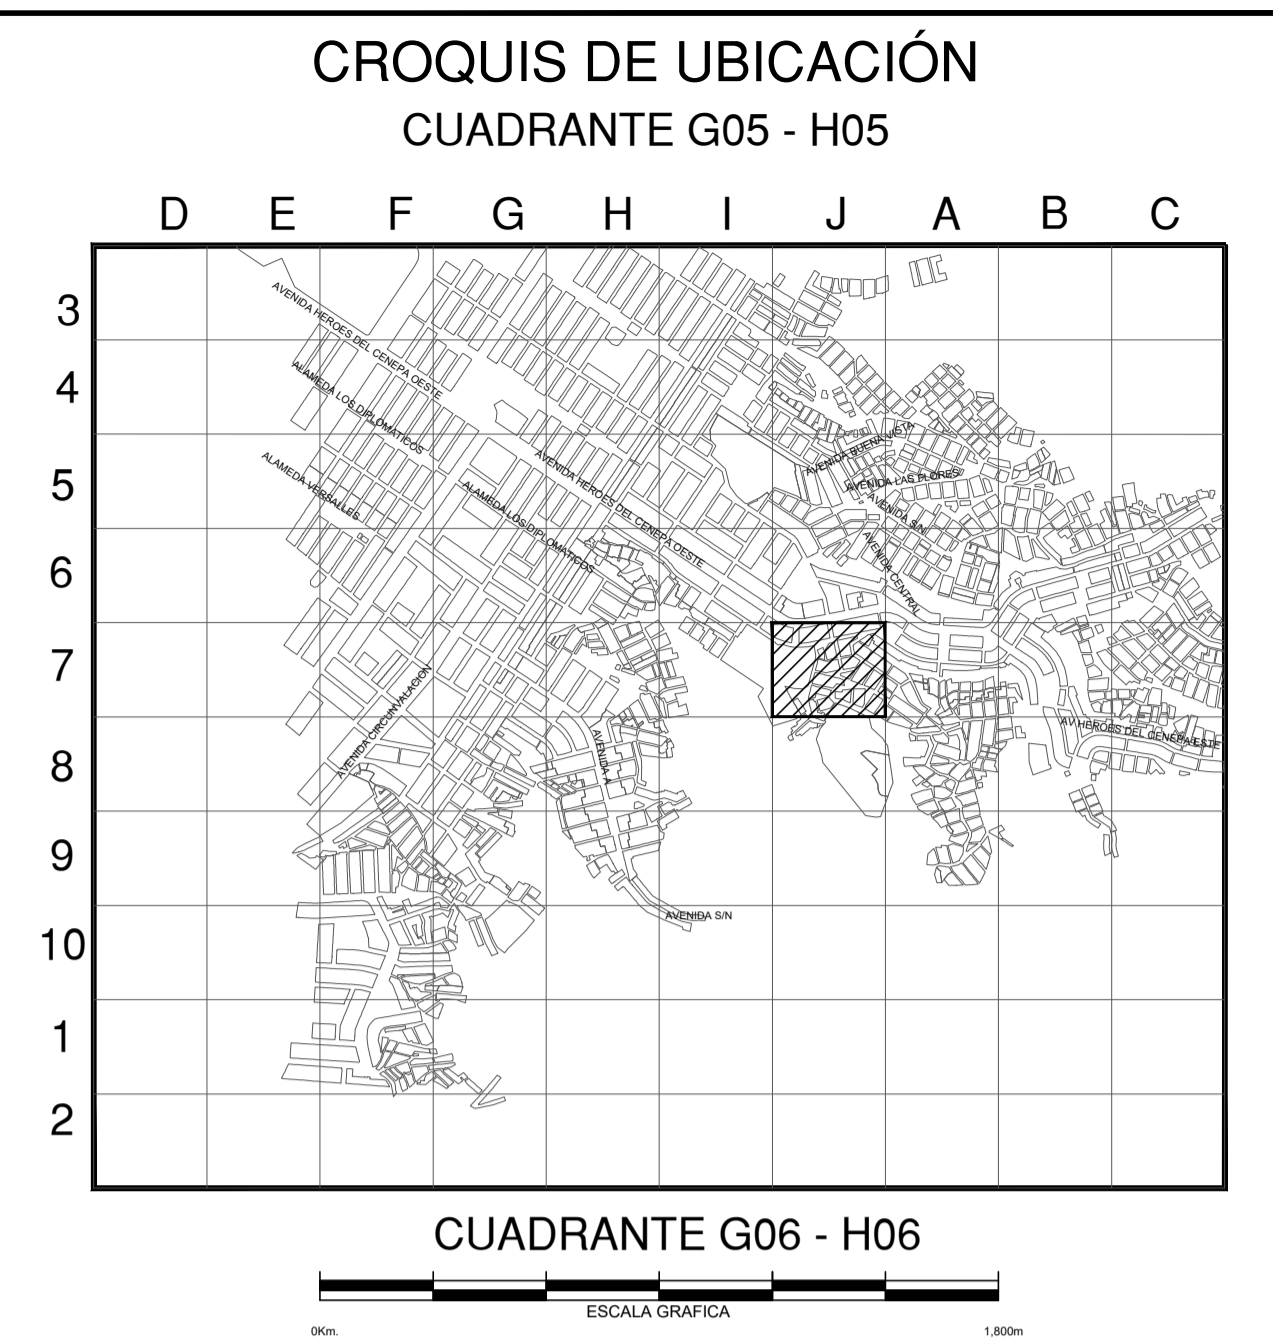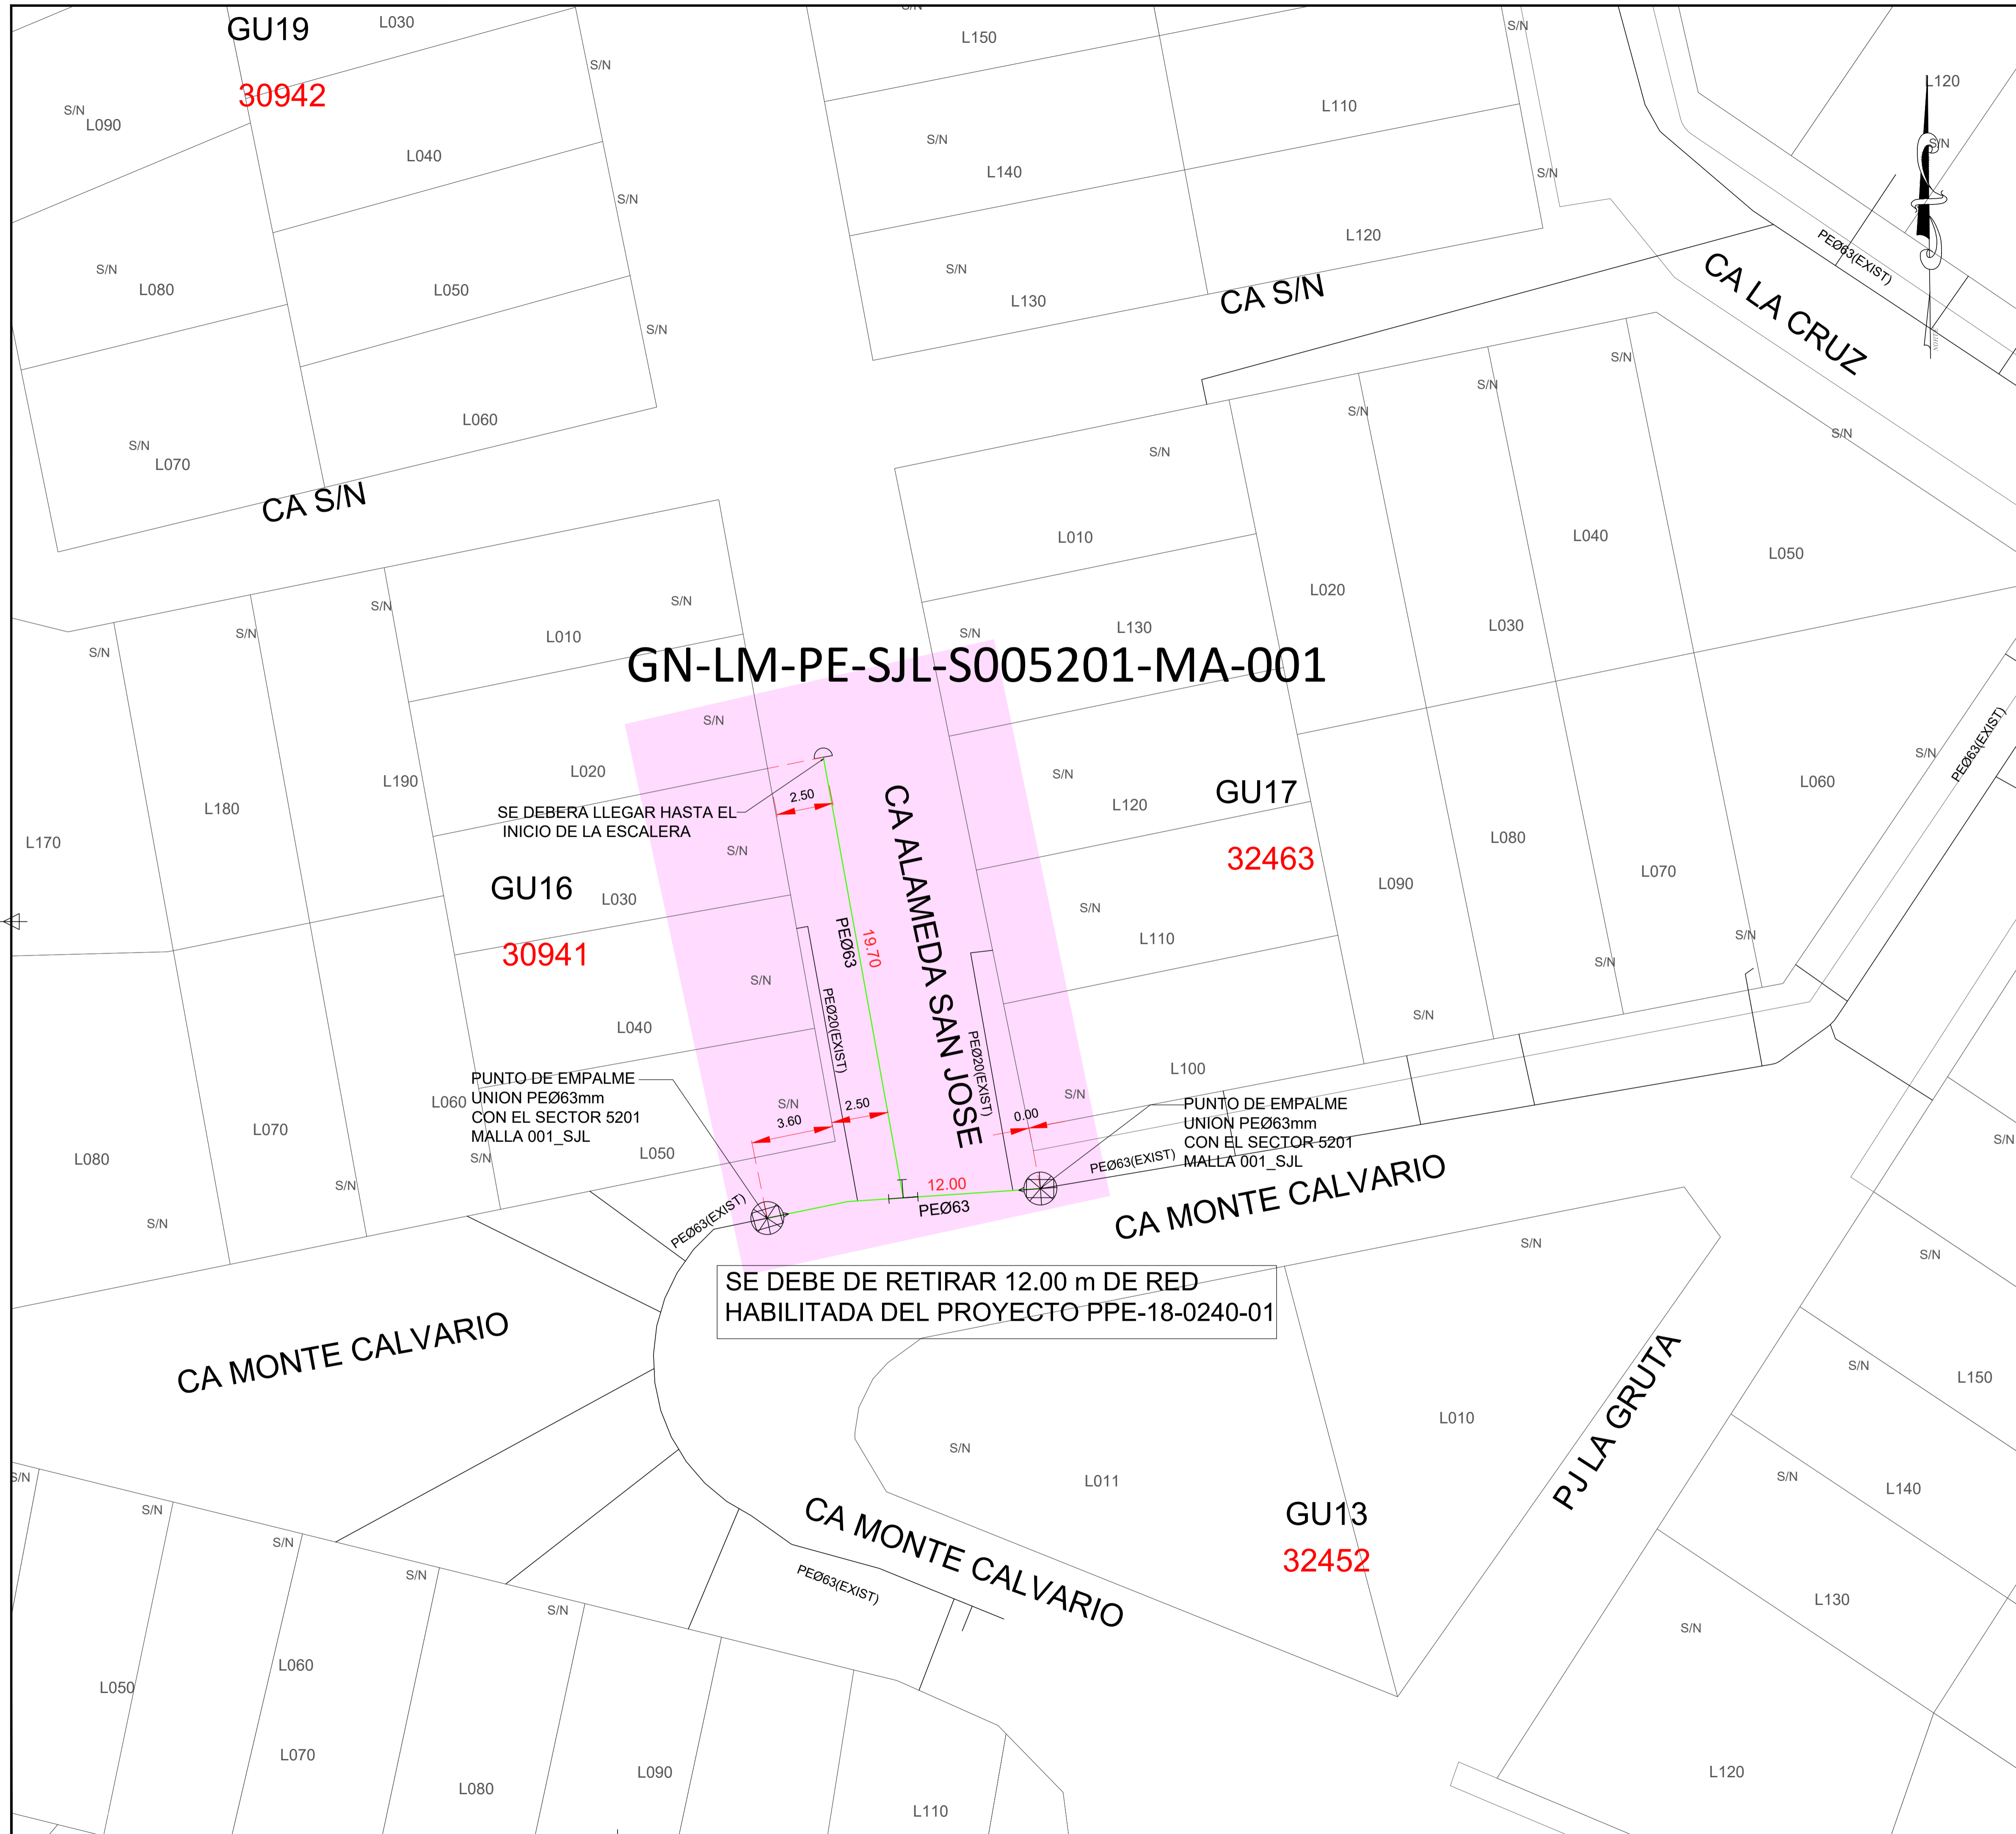

Sistema de Coordenadas: UTM-WGS84
 Hemisferio Sur - ZONA 18

SIMBOLOGIA

Válvula		Conexión con Silleta (TF)	
Tapón		Conexión con Tapping Tee (EF)	
Reducción		Conexión sin válvula de exceso de flujo	
Transición AC-PE		Punto de Inicio de Progressiva: 0.00	
ERP		Punto Control Topográfico	
Triducto		Punto de salida de cable de detección en acometida	
Punto de empalme		Zona de protección mecánica de la red	
Gabinete		Tramo con tapada diferente a la típica	

TIPO DE LINEA

TUBERÍA PE Ø200mm		PE200
TUBERÍA PE Ø160mm		PE160
TUBERÍA PE Ø110mm		PE110
TUBERÍA PE Ø90mm		PE90
TUBERÍA PE Ø63mm		PE63
TUBERÍA PE Ø32mm		PE32
TUBERÍA PE Ø20mm		PE20
TUBERÍA PE (CON GAS)		PE

Distancia mínima a edificaciones consideradas en el trazado : 1m

SJL-SECTOR 005201 MALLA 001

LISTA DE METRADOS

Ø TUBERÍA	LONGITUD
Ø 20 mm	-
Ø 32 mm	-
Ø 63 mm	31.70
Ø 90 mm	-
Ø 110 mm	-
Ø 160 mm	-
Ø 200 mm	-
Total	31.70

Representante Técnico (Contratista)

A	PARA PERMISOS	26/08/2022	YQC	JMGV	CDPM
REV.	DESCRIPCIÓN	FECHA	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ

LISTA DE REVISIONES

	REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL EN LIMA Y CALLAO	
--	---	--

TÍTULO:
 PPE0-21-4767 - REDES DE POLIETILENO - SAN JUAN DE LURIGANCHO
 SJL - SECTOR 005201 MALLA 001
 PLANO MAESTRO

DIBUJO:	YQC	FECHA:	26/08/2022	DISTRITO:	SAN JUAN DE LURIGANCHO	PLANO N°:		REV.:	
REVISO:	JMGV	ESCALA:	S/E	ZONA Y FAMILIA:	SECTOR 005201 MALLA 001				
APROBO:	CDPM	FILE:	1/1	REEMPLAZA:					

PPE0-21-4767-00-PM-01 A
