203-2022-SYE

★2022-103244★

Cálidda

CÓDIGO DEL

N°: 2022-0029993
Remitente:
GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO S.A. - RUC: 20503758114
Recibido: 24/02/2022 - 09:47
N° de Folios: 20
Registrado YNGA YZQUIERDO
Consultas: www.munlima.gob.pe
Teléfonos: (51) 1 - 632 - 1300
Nota: La recepción NO da conformidad al contenido.

Lima, 23 de febrero de 2022

Señores
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
Presente. -

Asunto : Solicita autorización para la ejecución de obras del proyecto denominado "CAR - SECTOR - 000600 - MALLA 009-011, 030"

Radicado : R2022-008473

De nuestra consideración:

Gas Natural de Lima y Callao S.A. - Cálidda, identificada con RUC N° 20503758114, debidamente representada por su apoderado el Señor Roberto Franco Gianoli Hanke, Identificado con DNI N° 10609610, con poderes inscritos en la partida electrónica N° 11352499 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, ante usted respetuosamente, nos presentamos y decimos:

Que, en el marco del proyecto de masificación del servicio público de gas natural promovido por el Gobierno Central (Proyecto Camisea), venimos a solicitar autorización para la ejecución de obras del proyecto denominado ***"CAR - SECTOR - 000600 - MALLA 009-011, 030"*** **ubicado en el distrito de Carabayllo**, tal como se señala en los planos de ubicación y la memoria descriptiva que se adjuntan, las cuales se ejecutarán en las siguientes direcciones:

Av. Santa Maria (Sentido Este-Oeste) Desde Alt. Ca S/N Hasta Ca. Los Alamos.

Conforme a lo señalado en el Art. 81 de Decreto Supremo N° 042-99-EM (Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos), el concesionario de distribución podrá abrir los pavimentos, calzadas y aceras de las vías públicas que se encuentren dentro del área de concesión, previa notificación a la Municipalidad respectiva, quedando obligado a efectuar la reparación que sea menester dentro del plazo otorgado por dicha Municipalidad.

El estudio de Impacto Ambiental del mencionado proyecto ha sido aprobado mediante R.D N°0116-2004-MEM/AAM de fecha 13 de agosto del 2004, expedida por la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y Minas.

En virtud de lo antes expuesto, y de conformidad con lo establecido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad, adjuntamos la siguiente documentación:

1. Plano de Ubicación
2. Planos de planta y perfil
3. Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas
4. Cronograma de Obra

CÁLIDDA
C. Morelli N°
C.C La Rambla, Torre 2,
Teléfono: (51-1) 611-7500
San Borja, Lima, Perú

Por su parte, informamos la contratación de la empresa **COMERCIALIZADORA S&E PERÚ S.A.C** identificada con RUC N°20511535612 para la elaboración de dichos trabajos contando como responsable por parte de la empresa contratista con el Ingeniero John Campos Castillo, con registro del Colegio de Ingenieros N°48335; asimismo, nuestra representada designa como persona responsable al Ingeniero Leyla G. Eugenio Sarmiento, con Registro del Colegio de Ingenieros N° 150305.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 126° del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General, otorgamos poder general para efectos de la tramitación ordinaria de este procedimiento al Señor EDER MERA LEON con DNI N° 10214048 Y/O el Sr. ROBERT VALVERDE ALVARADO con DNI N° 41195791, a fin de que en nombre y representación de nuestra empresa, pueda realizar las gestiones correspondientes hasta la finalización del proyecto.

POR LO EXPUESTO

Presentamos la presente comunicación para los fines pertinentes y en el marco de la normativa aplicable.

Atentamente,

Firmado Digitalmente por:
ROBERTO FRANCO GIANOLI
HANKE
Fecha: 23/02/2022 15:23:02

Roberto Franco Gianoli Hanke
Sub Gerente Legal

CÁLIDDA
C. Morelli 150
C.C La Rambla Torre 2,
Teléfono: (51-1) 611-7500
San Borja, Lima, Perú

PROYECTO: REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO

CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA S&E PERU SAC.

RED DE DISTRIBUCIÓN EN PE

PROYECTO

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1	**CARABAYLLO**	**20 días**	**lun 28/02/22**	**vie 25/03/22**
2	**PPE0-21-0748CAR - SECTOR - 000600 - MALLA - 009**	20 días	lun 28/02/22	vie 25/03/22
3	**PPE0-21-0749CAR - SECTOR - 000600 - MALLA - 010**	20 días	lun 28/02/22	vie 25/03/22
4	**PPE0-21-0750CAR - SECTOR - 000600 - MALLA - 011**	20 días	lun 28/02/22	vie 25/03/22
5	**PPE0-21-1565CAR - SECTOR - 000600 - MALLA - 030**	**20 días**	**lun 28/02/22**	**vie 25/03/22**
6	**PUNTOS DE EXCAVACION PARA TRABAJOS DE PRUEBA Y GASIFICACION**	**20 días**	**lun 28/02/22**	**vie 25/03/22**
7	**HORARIO DIURNO - Interferencia: 01 carril**	**20 días**	**lun 28/02/22**	**vie 25/03/22**
8	RECORRIDO INFORMATIVO	1 día	lun 28/02/22	lun 28/02/22
9	CALICATAS	5 días	lun 28/02/22	vie 4/03/22
10	CORTE Y DEMOLICIÓN DEL PAVIMENTO	9 días	lun 28/02/22	jue 10/03/22
11	EXCAVACIÓN	8 días	mar 1/03/22	jue 10/03/22
12	**PRUEBAS Y GASIFICACIONES**	**7 días**	**vie 11/03/22**	**lun 21/03/22**
13	LIMPIEZA FINAL	4 días	mar 22/03/22	vie 25/03/22

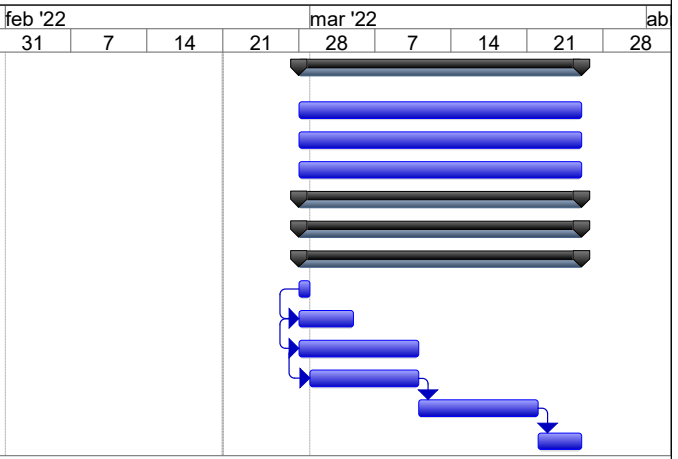

PROYECTO: REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO

Tarea		Hito externo		Manual Summary Rollup	
División		Inactive Task		Manual Summary	
Hito		Inactive Milestone		Start-only	
Resumen		Inactive Summary		Finish-only	
Resumen del proyecto		Manual Task		Progreso	
Tareas externas		Duration-only		Fecha límite	

JOHN ROBINSON CAMPOS CASTILLO
INGENIERO CIVIL
REG. CIP. N° 48335

PUNTO DE EXCAVACION

PUNTO DE EXCAVACION

PUNTO DE EXCAVACION

PUNTO DE EXCAVACION

PUNTO DE EXCAVACION

SIMBOLOGÍA

Válvula		Conexión con Silleta (TF)	
Tapón		Conexión con Tapping Tee (EF)	
Reducción		Conexión sin válvula de exceso de flujo	
Transición AC–PE		Punto de Incio de Progresiva: 0.00	
ERP		Punto Control Topográfico	
Triducto		Punto de salida de cable de detección en acometida	
Punto de empalme		Zona de protección mecánica de la red	
Gabinete		Tramo con tapada diferente a la típica	

TIPO DE LINEA

TUBERÍA PE ø200mm	PE200
TUBERÍA PE ø160mm	PE160
TUBERÍA PE ø110mm	PE110
TUBERÍA PE ø90mm	PE90
TUBERÍA PE ø32mm	PE32
TUBERÍA PE ø32mm	PE32
TUBERÍA PE ø20mm	PE20
TUBERÍA PE (CON GAS)	PE

Distancia mínima a edificaciones consideradas en el trazado : 1m

PUNTOS DE EXCAVACION PARA TRABAJOS DE PRUEBA Y GASIFICACION L=1.00mX1.00m

JOHN ROBINSON CAMPOS CASTILLO
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 48335

REV.	DESCRIPCION	FECHA	ELABORÓ	REVISO	APROBÓ
0	PARA CONSTRUCCION	10–11–21	J.A.N.	J.A.G.	J.C.C

LISTA DE REVISIONES

Cálidda GAS NATURAL DEL PERÚ

REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL EN LIMA Y CALLAO

COMERCIALIZADORA S&E PERÚ S.A.C

TITULO :

Redes de Polietileno - Carabayllo

CAR, SECTOR 000600 MALLAS 009, 010, 011, 030

Plano Maestro

DIBUJO : J.A.N.	FECHA : 10-11-2021	DISTRITO : Carabayllo	PLANO N° : PLANO MASTER	REV. : 0
REVISO : J.A.G.	ESCALA : REF.	ZONA Y MALLA : 000600-009,010,011,030		
APROBO : J.C.C	FILE : 1/1	REEMPLAZA : ---		
