

★2022-125481★



CÓDIGO DEL PROYECTO: PPE0-21-2254, 2255, 1535, 1536

Lima, 14 de Noviembre de 2022

Señores  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC  
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Presente. -



F:u1

Asunto : Solicita autorización para la ejecución de obras del proyecto denominado "PAC - SECTOR - 001201 - MALLA - 006, 007, 015, 016"

10:29

Radicado : R2022-061027

De nuestra consideración:

**Gas Natural de Lima y Callao S.A. - Cálidda**, identificada con RUC N° 20503758114, debidamente representada por su apoderado el Señor Roberto Franco Gianoli Hanke, Identificado con DNI N° 10609610, con poderes inscritos en la partida electrónica N° 11352499 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, ante usted respetuosamente, nos presentamos y decimos:

Que, en el marco del proyecto de masificación del servicio público de gas natural promovido por el Gobierno Central (Proyecto Camisea), venimos a solicitar autorización para la ejecución de obras del proyecto denominado "**PAC - SECTOR - 001201 - MALLA - 006, 007, 015, 016**" ubicado en el distrito de Pachacamac, tal como se señala en los planos de ubicación y la memoria descriptiva que se adjuntan.

Conforme a lo señalado en el Art. 81 de Decreto Supremo N° 042-99-EM (Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos), el concesionario de distribución podrá abrir los pavimentos, calzadas y aceras de las vías públicas que se encuentren dentro del área de concesión, previa notificación a la Municipalidad respectiva, quedando obligado a efectuar la reparación que sea menester dentro del plazo otorgado por dicha Municipalidad.

El estudio de Impacto Ambiental del mencionado proyecto ha sido aprobado mediante R.D N°0116-2004-MEM/AAM de fecha 13 de agosto del 2004, expedida por la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y Minas.

En virtud de lo antes expuesto, y de conformidad con lo establecido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad, adjuntamos la siguiente documentación:

1. Plano de Ubicación
2. Planos de planta y perfil
3. Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas
4. Cronograma de Obra



DEAL 7

Por su parte, informamos la contratación de la empresa **COMERCIALIZADORA S&E PERÚ S.A.C** identificada con RUC N°20511535612 para la elaboración de dichos trabajos contando como responsable por parte de la empresa contratista con el Ingeniero John Campos Castillo, con registro del Colegio de Ingenieros N°48335; asimismo, nuestra representada designa como persona responsable al Ingeniero Raúl García con registro del Colegio de Ingenieros N°64179.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 126° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General, otorgamos poder general para efectos de la tramitación ordinaria de este procedimiento al Señor EDER MERA LEON con DNI N° 10214048 Y/O el Sr. ROBERT VALVERDE ALVARADO con DNI N° 41195791, a fin de que en nombre y representación de nuestra empresa, pueda realizar las gestiones correspondientes hasta la finalización del proyecto.

Asimismo, señalamos que de acuerdo con el numeral 20.4 del artículo 20° del TUO de la Ley N° 27444, vuestro despacho nos podrá notificar a los siguientes correos electrónicos:

- [casilla.electronica@proveedores.calidda.com.pe](mailto:casilla.electronica@proveedores.calidda.com.pe)
- [Gestion.Permisos@calidda.com.pe](mailto:Gestion.Permisos@calidda.com.pe)
- [emera@meraasesores.com](mailto:emera@meraasesores.com)

#### **POR LO EXPUESTO**


Presentamos la presente comunicación para los fines pertinentes y en el marco de la normativa aplicable.

Atentamente,

Firmado Digitalmente por:  
ROBERTO FRANCO GIANOLI  
HANKE  
Fecha: 14/11/2022 17:01:51

**Roberto Franco Gianoli Hanke**  
Sub Gerente Legal



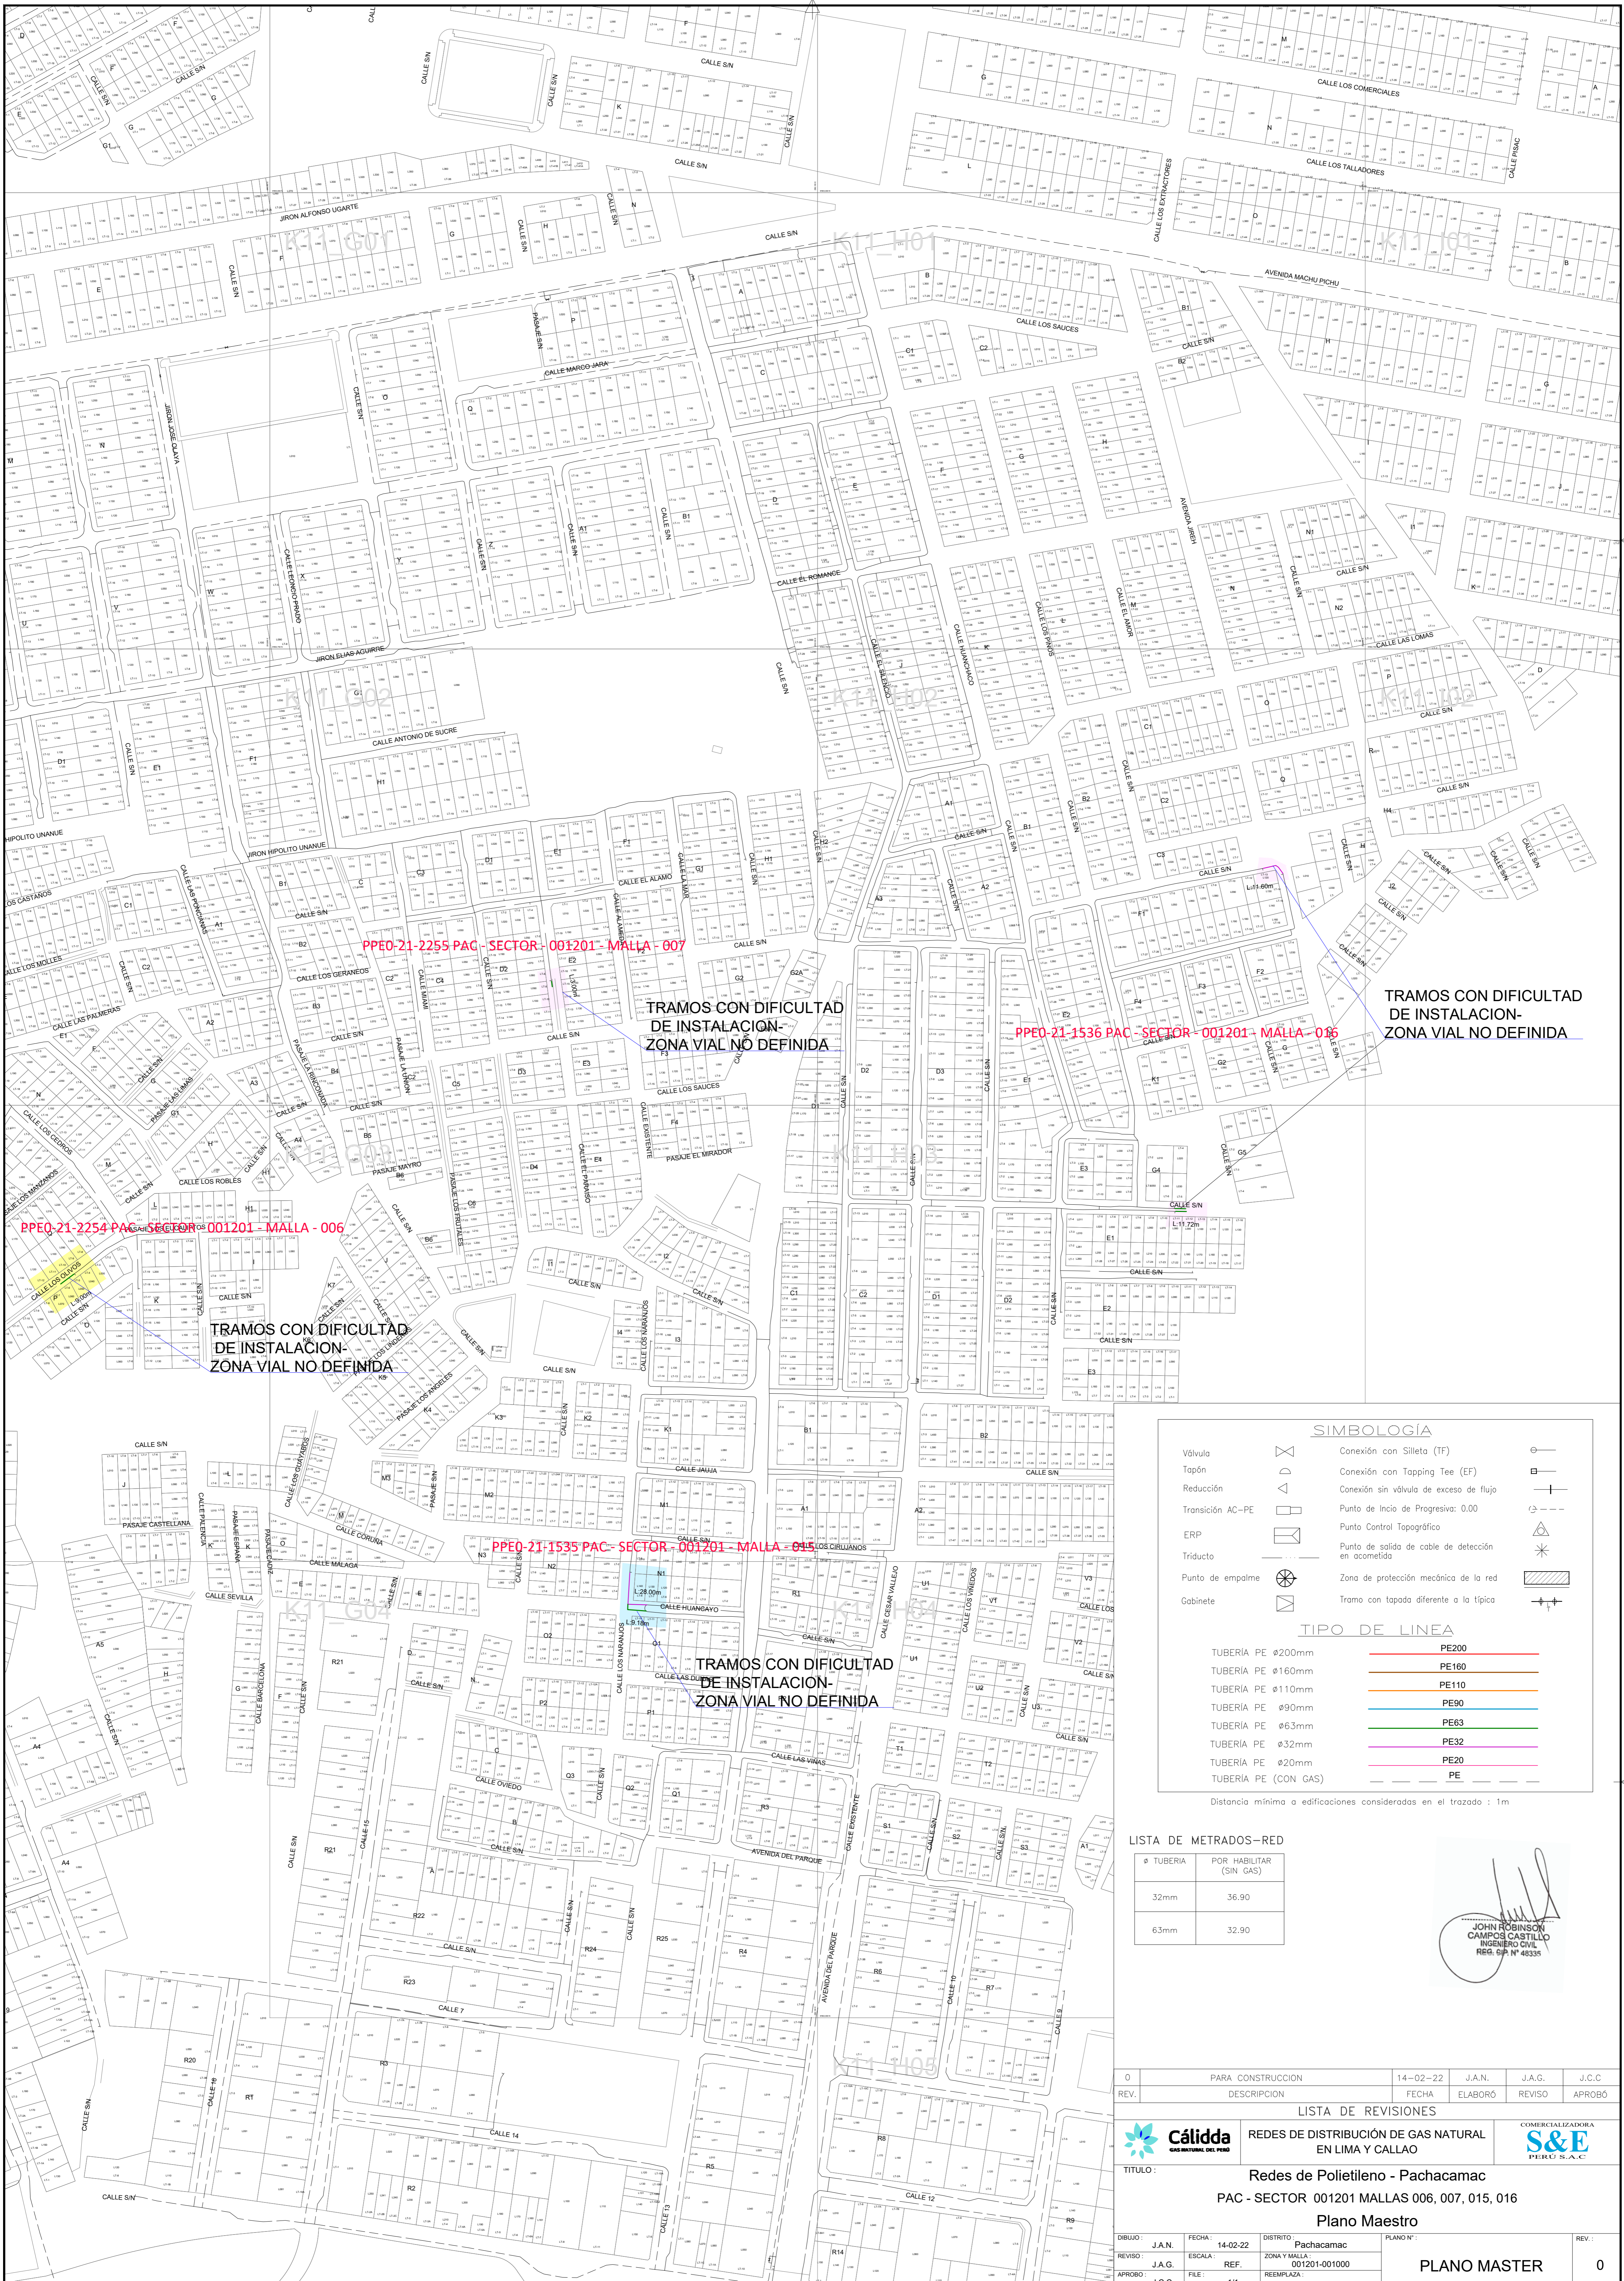

PPEQ-21-2255 PAC-SECTOR-001201-MALLA-007

TRAMOS CON DIFICULTAD DE INSTALACION-ZONA VIAL NO DEFINIDA

PPEQ-21-1536 PAC-SECTOR-001201-MALLA-015

TRAMOS CON DIFICULTAD DE INSTALACION-ZONA VIAL NO DEFINIDA

PPEQ-21-2254 PAC-SECTOR-001201-MALLA-006

TRAMOS CON DIFICULTAD DE INSTALACION-ZONA VIAL NO DEFINIDA

PPEQ-21-1535 PAC-SECTOR-001201-MALLA-015

TRAMOS CON DIFICULTAD DE INSTALACION-ZONA VIAL NO DEFINIDA

### SIMBOLOGIA

Válvula		Conexión con Silleta (TF)	
Tapón		Conexión con Tapping Tee (EF)	
Reducción		Conexión sin válvula de exceso de flujo	
Transición AC-PE		Punto de Inicio de Progresiva: 0.00	
ERP		Punto Control Topográfico	
Triducto		Punto de salida de cable de detección en acometida	
Punto de empalme		Zona de protección mecánica de la red	
Gabinete		Tramo con tapado diferente a la típica	

### TIPO DE LINEA

TUBERIA PE ø200mm	PE200
TUBERIA PE ø160mm	PE160
TUBERIA PE ø110mm	PE110
TUBERIA PE ø90mm	PE90
TUBERIA PE ø63mm	PE63
TUBERIA PE ø32mm	PE32
TUBERIA PE ø20mm	PE20
TUBERIA PE (CON GAS)	PE

Distancia mínima a edificaciones consideradas en el trazado : 1m

#### LISTA DE METRADOS-RED

ø TUBERIA	POR HABITAR (SIN GAS)
32mm	36.90
63mm	32.90

JOHN ROBINSON  
CAMPOS CASTILLO  
INGENIERO CIVIL  
REG. EN N° 48335

0	PARA CONSTRUCCION	14-02-22	J.A.N.	J.A.G.	J.C.C
REV.	DESCRIPCION	FECHA	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ

### LISTA DE REVISIONES

COMERCIALIZADORA	
<b>S&amp;E</b>	PERU S.A.C

TITULO: **Redes de Polietileno - Pachacamac**  
**PAC - SECTOR 001201 MALLAS 006, 007, 015, 016**  
**Plano Maestro**

DIBUJO:	J.A.N.	FECHA:	14-02-22	DISTRITO:	Pachacamac	PLANO N°:	
REVISO:	J.A.G.	ESCALA:	1:400	ZONA Y MALLA:	001201-001000	REV.:	0
APROBÓ:	J.C.C	FILE:	1/1	REEMPLAZA:			

**PLANO MASTER**


PROYECTO: REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO

CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA **S&E** PERU SAC.

# RED DE DISTRIBUCIÓN EN PE

## PROYECTO PAC

Id	Nombre de tarea	Duración	2023			
			T4	T1	T2	
1	<b>PACHACAMAC</b>	<b>45 días</b>				
2	<b>PAC - SECTOR - 001201 - MALLAS - 006, 007, 015, 016</b>	<b>45 días</b>				
3	<b>PERIMETRO EXTERNO</b>	<b>45 días</b>				
4	CALLE LOS OLIVOS FRENTE A MZ P (141759) ALT LOTES L050 A L060	45 días				
5	CALLE EL PARAÍSO FRENTE A MZ D2 ALT LOTE L090	45 días				
6	CALLE HUANCAYO FRENTE A MZ O1 (141739 L020) A CALLE LOS NARANJOS FRENTE A MZ N1 (141738) ALT LOTE L140 CON CALLE HUANCAYO FRENTE A MZ N1 (141738) ALT LOTE L130	45 días				
7	CALLE S/N FRENTE A MZ E1 (141695) ALT LOTE L080-L090	45 días				
8	CALLE S/N FRENTE MZ F1 141679 ALT LOTE L120 A CALLE LOS NARANJOS FRENTE A MZ N1 (141738) ALT LOTE L010	<b>45 días</b>				
9	RECORRIDO INFORMATIVO	2 días				
10	CALICATAS	20 días				
11	CORTE Y DEMOLICIÓN DEL PAVIMENTO	33 días				
12	EXCAVACIÓN	33 días				
13	TENDIDO DE TUBERÍA	33 días				
14	RELLENO Y COMPACTACIÓN	33 días				
15	REPOSICIÓN	33 días				
16	LIMPIEZA DE LA ZONA.	33 días				
17	<b>PRUEBAS Y GASIFICACIONES</b>	<b>7 días</b>				

  
**JOHN ROBINSON CAMPOS CASTILLO**  
 INGENIERO CIVIL  
 REG. SIP: N° 48335

PROYECTO: REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO

Tarea		Hito externo		Manual Summary Rollup	
División		Inactive Task		Manual Summary	
Hito		Inactive Milestone		Start-only	
Resumen		Inactive Summary		Finish-only	
Resumen del proyecto		Manual Task		Progreso	
Tareas externas		Duration-only		Fecha límite	

## Cargo de Recepción


 Firmado digitalmente por:  
 ventanillavirtual.osinergrmin.gob.pe  
 Motivo: Cargo de  
 Recepción  
 Fecha: 14/12/2022 20:13:00-0500

Su documento ha sido ingresado satisfactoriamente, por favor tome nota del número de expediente generado para realizar el seguimiento correspondiente.

Número de expediente: 202200261157 Fecha y hora de presentación: 14/12/2022 20:12

RUC: 20503758114

Nombre/Razón social: GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO S.A.

Correo electrónico: Casilla.Electronica@proveedores.calidda.com.pe

Nro. telefónico: 986180934

Documento: CARTA - s/n Nro. Folios: 7

Asunto: Comunicamos la variación a las obras previstas en el Plan Quinquenal de Inversiones y/o Plan Anual para el año 2022

Anexos: SI

Tipo	Documento	Nombre	Folio	Peso
Documento Principal	ComunicamosCuartaVariaciAn_14122022200523.pdf	Comunicamos la variación a las obras previstas en el Plan Quinquenal de Inversiones y/o Plan Anual para el año 2022	7	225 Kb
Anexo	Anexo1-Denegatoriadepermisos_1412202200534.zip	Anexo 1 - Denegatoria de permisos	1	39 Mb
Anexo	Anexo2-Demoradepermisos_14122022200558.zip	Anexo 2 - Demora de permisos	1	1 Mb
Anexo	Anexo3-ActuaciAndeTerceros_14122022200734.zip	Anexo 3 - Actuación de Terceros	1	6 Mb
Anexo	Anexo4-DetalledeProyectosareemplazarydereemplazo_14122022200905.xlsx	Anexo 4 - Detalle de Proyectos a reemplazar y de reemplazo	1	15 Kb
Anexo	Anexo5-Planosdezonasdereemplazo_14122022201233.zip	Anexo 5 - Planos de zonas de reemplazo	1	1 Mb

Usted podrá hacer el seguimiento de su trámite a través de <https://consultaexpedientes.osinergrmin.gob.pe/consulta-docs/>, de tener alguna consulta puede efectuarla a través de: [ventanillavirtual@osinergrmin.gob.pe](mailto:ventanillavirtual@osinergrmin.gob.pe)

**ATENCIÓN:** Usted se encuentra afiliado al Sistema de Notificaciones Electrónicas del Osinergrmin - SNE, cualquier notificación se realizará por ese medio, exceptuando las Solicitudes de Acceso a la Información Pública, cuya atención se realizará por el canal seleccionado.

En caso el cliente registrado en el formulario virtual corresponda a un tercero (persona natural o jurídica distinta al solicitante del trámite), el Osinergrmin creará una casilla electrónica de oficio al solicitante en la cual se realizará toda notificación.

Para ingresar a su casilla electrónica, actualizar sus datos y/o revisar sus notificaciones, sírvase ingresar al siguiente link: <https://notificaciones.osinergrmin.gob.pe/>

## Cargo de Recepción

---

**NOTA IMPORTANTE:**

Para fines del cómputo de plazos, los documentos presentados los sábados, domingos y feriados o cualquier otro día inhábil, se consideran presentadas al primer día hábil siguiente.

El cargo de recepción del expediente no significa aceptación, aprobación o autorización al ejercicio de alguna actividad sujeta a supervisión o fiscalización del Osinergmin, resultando de aplicación lo dispuesto en los numerales 33.2 y 136.6 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Lima, 14 de diciembre de 2022

Señores,

**ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA - OSINERGMIN**

Calle Bernardo Monteagudo N° 222, Magdalena del Mar.

**Presente.** -

Atención : Luis Enrique Grajeda Puelles  
Gerente de Regulación Tarifaria

Asunto : Comunicamos la variación a las obras previstas en el Plan  
Quinquenal de Inversiones y/o Plan Anual para el año 2022

Referencia : Decreto Supremo N° 001-2022-EM

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, nos es grato saludarlos y al mismo tiempo informarles que nuestra representada viene ejecutando las inversiones en infraestructura del Sistema de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos, consideradas en el Plan Quinquenal y Plan Anual para el año 2022. Lo expuesto, en cumplimiento de la Resolución de Consejo Directivo N° 079-2022-OS/CD que aprobó el Plan Quinquenal de Inversiones 2022-2026 y de la Resolución de Consejo Directivo N° 175-2022-OS/CD que aprobó la actualización del Plan Anual 2022.

Asimismo, mediante Decreto Supremo N° 001-2022-EM se dictaron modificaciones e incorporaciones para la ejecución de obras y el cumplimiento del Plan Quinquenal de Inversiones y Planes Anuales para la prestación del servicio de distribución de gas natural por red de ductos.

En virtud de lo anterior, se dispuso la modificación del artículo 63 d) del Texto Único Ordenado del Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos (en adelante, "TUO del Reglamento de Distribución"), donde se estableció que se podrá efectuar variaciones a las obras previstas en el Plan Anual y Quinquenal cuando: (i) exista denegatoria o retrasos en la emisión de los permisos, autorizaciones u opiniones técnicas por parte de las autoridades competentes, por causas no

imputables al Concesionario; o, (ii) existan actuaciones de terceros que impidan la ejecución de un determinado proyecto.

Teniendo en cuenta los supuestos de variación descritos, cumplimos con informar que los siguientes proyectos que forman parte del Plan Quinquenal de Inversiones y/o Plan Anual para el año 2022, no podrán ser ejecutados por Cálidda debido a que durante el presente periodo y pese a las gestiones realizadas: (i) hemos sido notificados con diversas resoluciones a través de las cuales las municipalidades distritales correspondientes denegaron los permisos respectivos para ejecutar los proyectos descritos a continuación; así como también tenemos expedientes donde no hemos obtenido respuesta a nuestra solicitud de autorización habiéndose superado el plazo legal<sup>1</sup>; y, (ii) existen actuaciones de terceros que nos impiden la ejecución de los proyectos, específicamente, oposición de la misma población de la zona por donde estaba previsto el tendido de redes, a pesar de contar con los permisos municipales respectivos<sup>2</sup>:

<b>Código Proyecto</b>	<b>Nombre Del Proyecto</b>	<b>Total (m)</b>	<b>Municipalidad</b>	<b>Causal de variación</b>	<b>N° de Oficio/Resolución</b>
PPE0-21-1099	GN-LM-PE-CHO-S002800-MA-002	<b>103</b>	Chorrillos	Denegatoria de permisos	Carta N° 619-2022-MDCH-GDU-SOP
PPE0-21-1100	GN-LM-PE-CHO-S002800-MA-003	<b>44</b>	Chorrillos	Denegatoria de permisos	Carta N° 619-2022-MDCH-GDU-SOP

<sup>1</sup> **Artículo 63 d.-** El Concesionario podrá efectuar variaciones a las obras previstas en el Plan Quinquenal y el Plan Anual, en los siguientes supuestos:

(...)

- Luego de transcurridos treinta (30) días hábiles desde la presentación de la solicitud de emisión del mencionado permiso, autorización u opinión técnica; únicamente en caso de que no se cuente con un plazo establecido por la entidad de la administración pública para la emisión del permiso, autorización u opinión técnica requerida por el Concesionario.

<sup>2</sup> Cabe precisar que las mallas descritas en el cuadro, para los casos de denegatorias de permisos, están recogidas en los oficios emitidos por las municipalidades distritales (**Anexo 1**), mientras que la demora de permisos se constata con la solicitud de autorización y cartas reiterativas presentadas ante las municipalidades correspondientes (**Anexo 2**); por otro lado, para los casos de afectación de terceros, las mallas y el sustento se encuentran en los informes emitidos por nuestras empresas contratistas (**Anexo 3**).



PPE0-21-1318	GN-LM-PE-LRN-S001100-MA-000	<b>325</b>	Lurín	Denegatoria de permisos	Carta N° 067-2022-GDU/MDL
PPE0-21-2161	GN-LM-PE-LRN-S000800-MA-002	<b>12</b>	Lurín	Denegatoria de permisos	Carta N° 067-2022-GDU/MDL
PPE0-21-1322 (Tramo 1)	GN-LM-PE-LRN-S001200-MA-008	<b>24</b>	Lurín	Denegatoria de permisos	Carta N° 067-2022-GDU/MDL
PPE0-21-1322 (Tramo 2)	GN-LM-PE-LRN-S001200-MA-008	<b>186</b>	Lurín	Denegatoria de permisos	Carta N° 067-2022-GDU/MDL
PPE0-21-2152	GN-LM-PE-LRN-S000300-MA-004	<b>203</b>	Lurín	Denegatoria de permisos	Carta N° 067-2022-GDU/MDL
PPE0-21-0929	GN-LM-PE-SRO-S000900-MA-002	<b>19</b>	Santa Rosa	Denegatoria de permisos	Carta N° 058-2022-SOPPU-GDU/MDSR
PPE0-21-0895	GN-LM-PE-SRO-S000300-MA-002	<b>78</b>	Santa Rosa	Denegatoria de permisos	Carta N° 059-2022-SOPPU-GDU/MDSR
PPE0-21-0936	GN-LM-PE-SRO-S001100-MA-002	<b>12</b>	Santa Rosa	Denegatoria de permisos	Carta N° 062-2022-SOPPU-GDU/MDSR
PPE0-21-3373	GN-LM-PE-SMP-S007400-MA-014	<b>94</b>	San Martín de Porres	Denegatoria de permisos	Carta N° 330-2022-SGLHPU-GDU/MDSMP
PPE0-21-1326	GN-LM-PE-VMT-S008300-MA-006	<b>99</b>	Villa María del Triunfo	Denegatoria de permisos	Oficio N° 137-2022-SGPUCOPHU-GDU/MVMT
PPE0-21-2675	GN-LM-PE-VMT-S003500-MA-003	<b>57</b>	Villa María del Triunfo	Denegatoria de permisos	Oficio N° 249-2022-SGPUCOPHU-GDU/MVMT
PPE0-21-1330 (Tramo 1)	GN-LM-PE-VMT-S002400-MA-005	<b>139</b>	Villa María del Triunfo	Denegatoria de permisos	Oficio N° 248-2022-

					SGPUCOPHU-GDU/MVMT
PPE0-21-1330 (Tramo 2)	GN-LM-PE-VMT-S002400-MA-005	<b>19</b>	Villa María del Triunfo	Denegatoria de permisos	OFICIO N° 116-2022-SGPUCOPHU-GDU/MVMT
PPE0-21-1331	GN-LM-PE-VMT-S002500-MA-002	<b>64</b>	Villa María del Triunfo	Denegatoria de permisos	OFICIO N° 116-2022-SGPUCOPHU-GDU/MVMT
PPE0-21-1535	GN-LM-PE-PAC-S001201-MA-015	<b>37</b>	Pachacamac	Denegatoria de permisos	Carta N° 74-2022/SGPOP
PPE0-21-1536	GN-LM-PE-PAC-S001201-MA-016	<b>22</b>	Pachacamac	Denegatoria de permisos	Carta N° 74-2022/SGPOP
PPE0-21-2254	GN-LM-PE-PAC-S001201-MA-006	<b>8</b>	Pachacamac	Denegatoria de permisos	Carta N° 74-2022/SGPOP
PPE0-21-2267	GN-LM-PE-PAC-S001903-MA-003	<b>95</b>	Pachacamac	Denegatoria de permisos	Carta N° 72-2022/SGPOP
PPE0-21-2221	GN-LM-PE-PAC-S000300-MA-004	<b>67</b>	Pachacamac	Denegatoria de permisos	Carta N° 73-2022/SGPOP
PPE0-21-1997	GN-LM-PE-CAR-S000701-MA-006	<b>18</b>	Carabayllo	Denegatoria de permisos	Resolución de Sub Gerencia N° 1107-2022
PPE0-21-0772	GN-LM-PE-CAR-S000900-MA-005	<b>131</b>	Carabayllo	Denegatoria de permisos	Resolución de Sub Gerencia N° 1108-2022-SOP-GDUR-MDC
PPE0-21-0585	GN-LM-PE-VEN-S003900-MA-006	<b>296</b>	Ventanilla	Denegatoria de permisos	Carta N° 448-2022- MPC-GGDU
PPE0-21-2664	GN-LM-PE-VMT-S000200-MA-006	<b>44</b>	Villa María del Triunfo	Demora de permisos	Carta N° 2022-122972

					Carta reiterativa N° 2022-126223
PPE0-21-2177	GN-LM-PE-LRN- S001300-MA-011	<b>43</b>	Lurín	Afectación por terceros	Informe de nuestra contratista PA PERU
PPE0-21-0793	GN-LM-PE-CAR- S000901-MA-011	<b>233</b>	Carabayllo	Afectación por terceros	Informe de nuestra contratista GYA
PPE0-21-2078	GN-LM-PE-CIE- S000100-MA-005	<b>1,949</b>	Cieneguilla	Afectación por terceros	Acta de acuerdo elaborada nuestra contratista ALFACO
PPE0-21-2079	GN-LM-PE-CIE- S000100-MA-006	<b>4,791</b>	Cieneguilla	Afectación por terceros	Acta de acuerdo elaborada nuestra contratista ALFACO
<b>TOTAL</b>		<b>9,212</b>			

En vista de que tal escenario representa para Cálidda el impedimento de llevar a cabo la ejecución de las inversiones indicadas y encontrándonos inmersos en las causales antes descritas solicitamos a vuestro Despacho la variación del Plan Quinquenal de Inversiones y/o Plan Anual para el año 2022 de los proyectos referidos, los cuales serán reemplazados por aquellos detallados en el documento Excel adjunto a la presente comunicación como **Anexo 4** y que se encuentran graficados en el plano contenido en el **Anexo 5**.

Dichos proyectos, tal como se detalla en el documento Excel adjunto, cumplen con las condiciones establecidas en el artículo 63 d) del TUO del Reglamento de Distribución, lo cual significa que:

- (i) Se ejecutará el mismo monto de inversión o un monto mayor al destinado para la zona geográfica inicial en el Plan Quinquenal de Inversiones para el año 2022.
- (ii) Se atenderá el mismo o un mayor número de consumidores residenciales proyectados en la zona geográfica inicial. Los usuarios por atender


pertenecen a los mismos o menores niveles socioeconómicos de la zona geográfica inicial, conforme a lo determinado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI.

En base a lo expuesto, y en el marco de la respuesta recibida a nuestra primera variación por parte del Osinergmin mediante Oficio N°9705-2022-OS/DSR, cumplimos con informar para conocimiento la variación del Plan Quinquenal de Inversiones para el año 2022 conforme a lo detallado en la presente solicitud y sus respectivos anexos.

Por último, es preciso indicarles que a pesar de la presente solicitud de variación mantenemos nuestro compromiso de continuar realizando nuestros mayores esfuerzos para destrabar los proyectos que están siendo reemplazados y que sea viable su ejecución, con la finalidad de suministrar gas natural a la mayor cantidad de ciudadanos que se encuentren dentro de nuestra área de concesión.

Sin otro particular, quedamos de ustedes.

Atentamente,



**Roberto Franco Gianoli Hanke**  
**Apoderado Legal**

**Anexos:**

- Anexo 1** : Cargos de las denegatorias de permisos.
- Anexo 2** : Copia del cargo de solicitud de autorización y carta reiterativa presentada ante las municipalidades correspondientes.
- Anexo 3** : Informes elaborados por nuestros contratistas.
- Anexo 4** : Documento Excel con el detalle de los proyectos dejados de ejecutar y los proyectos que cumplen con las condiciones de variación del Plan Quinquenal de Inversiones para el año 2022.
- Anexo 5** : Planos de los distritos donde se grafican los proyectos que se reemplazarán y los propuestos como variación.



CÁLIDDA  
C. Morelli 150  
C.C La Rambla, Torre 2,  
Teléfono: (51-1) 611-7500  
San Borja, Lima, Perú

