

CÓDIGO DEL PROYECTO: **RPEU-21-0895**



Lima, 21 de octubre de 2022

Señores
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
Presente. -

Asunto: Solicita autorización para la ejecución de obras del proyecto "SRO - SECTOR - 000300 - MALLA - 002"

Radicado : R2022-056626

De nuestra consideración:

Gas Natural de Lima y Callao S.A. - Cálidda, identificada con RUC N° 20503758114, debidamente representada por su apoderado el Señor Roberto Franco Gianoli Hanke, Identificado con DNI N° 10609610, con poderes inscritos en la partida electrónica N° 11352499 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, ante usted respetuosamente, nos presentamos y decimos:

Que, en el marco del proyecto de masificación del servicio público de gas natural promovido por el Gobierno Central (Proyecto Camisea), venimos a solicitar autorización para la ejecución de obras del proyecto denominado "**SRO - SECTOR - 000300 - MALLA - 002**" ubicado en el distrito de Santa Rosa, tal como se señala en los planos de ubicación y la memoria descriptiva que se adjuntan.

Conforme a lo señalado en el Art. 81 de Decreto Supremo N° 042-99-EM (Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos), el concesionario de distribución podrá abrir los pavimentos, calzadas y aceras de las vías públicas que se encuentren dentro del área de concesión, previa notificación a la Municipalidad respectiva, quedando obligado a efectuar la reparación que sea menester dentro del plazo otorgado por dicha Municipalidad.

El estudio de Impacto Ambiental del mencionado proyecto ha sido aprobado mediante R.D N°0116-2004-MEM/AAM de fecha 13 de agosto del 2004, expedida por la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y Minas.

En virtud de lo antes expuesto, y de conformidad con lo establecido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad, adjuntamos la siguiente documentación:

1. Plano de Ubicación
2. Planos de planta y perfil
3. Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas
4. Cronograma de Obra

CÁLIDDA
C. Morelli 150
C.C La Rambla, Torre 2.
Teléfono: (51-1) 611-7500
San Borja, Lima, Perú

Por su parte, informamos la contratación de la empresa **P.A PERU SAC**, empresa identificada con RUC. N° 20549011196, para la elaboración de dichos trabajos contando como responsable por parte de la empresa contratista con la Ingeniera Diana Cayo Rivas, con registro del Colegio de Ingenieros N°122261; asimismo, nuestra representada designa como persona responsable al Ingeniero Raúl García con registro del Colegio de Ingenieros N°64179.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 126° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General, otorgamos poder general para efectos de la tramitación ordinaria de éste procedimiento al Señor Sergio Dennis Chacón Bruno identificado con DNI N° 46731029 y/o Yelina Quispe Curicon DNI N° 70474960, a fin que en nombre y representación de nuestra empresa, pueda revisar el expediente, realizar las gestiones necesarias orientadas a la obtención de los permisos y en su oportunidad proceder al recojo de la autorización que corresponda.

Asimismo, señalamos que de acuerdo al numeral 20.4 del artículo 20° del TUO de la Ley N° 27444, vuestro despacho nos podrá notificar a los siguientes correos electrónicos:

- casilla.electronica@proveedores.calidda.com.pe
- Gestion.Permisos@calidda.com.pe
- nataly.aldana@profesionalesasociados.pe
- jose.garrido@profesionalesasociados.pe

POR TANTO:



A usted señor Gerente, mucho agradeceremos se sirva disponer lo necesario a efecto se nos proporcione la autorización solicitada, por corresponder a derecho.

Atentamente,

Firmado Digitalmente por:
ROBERTO FRANCO GIANOLI
HANKE
Fecha: 24/10/2022 10:41:42

Roberto Franco Gianoli Hanke
Sub Gerente Legal



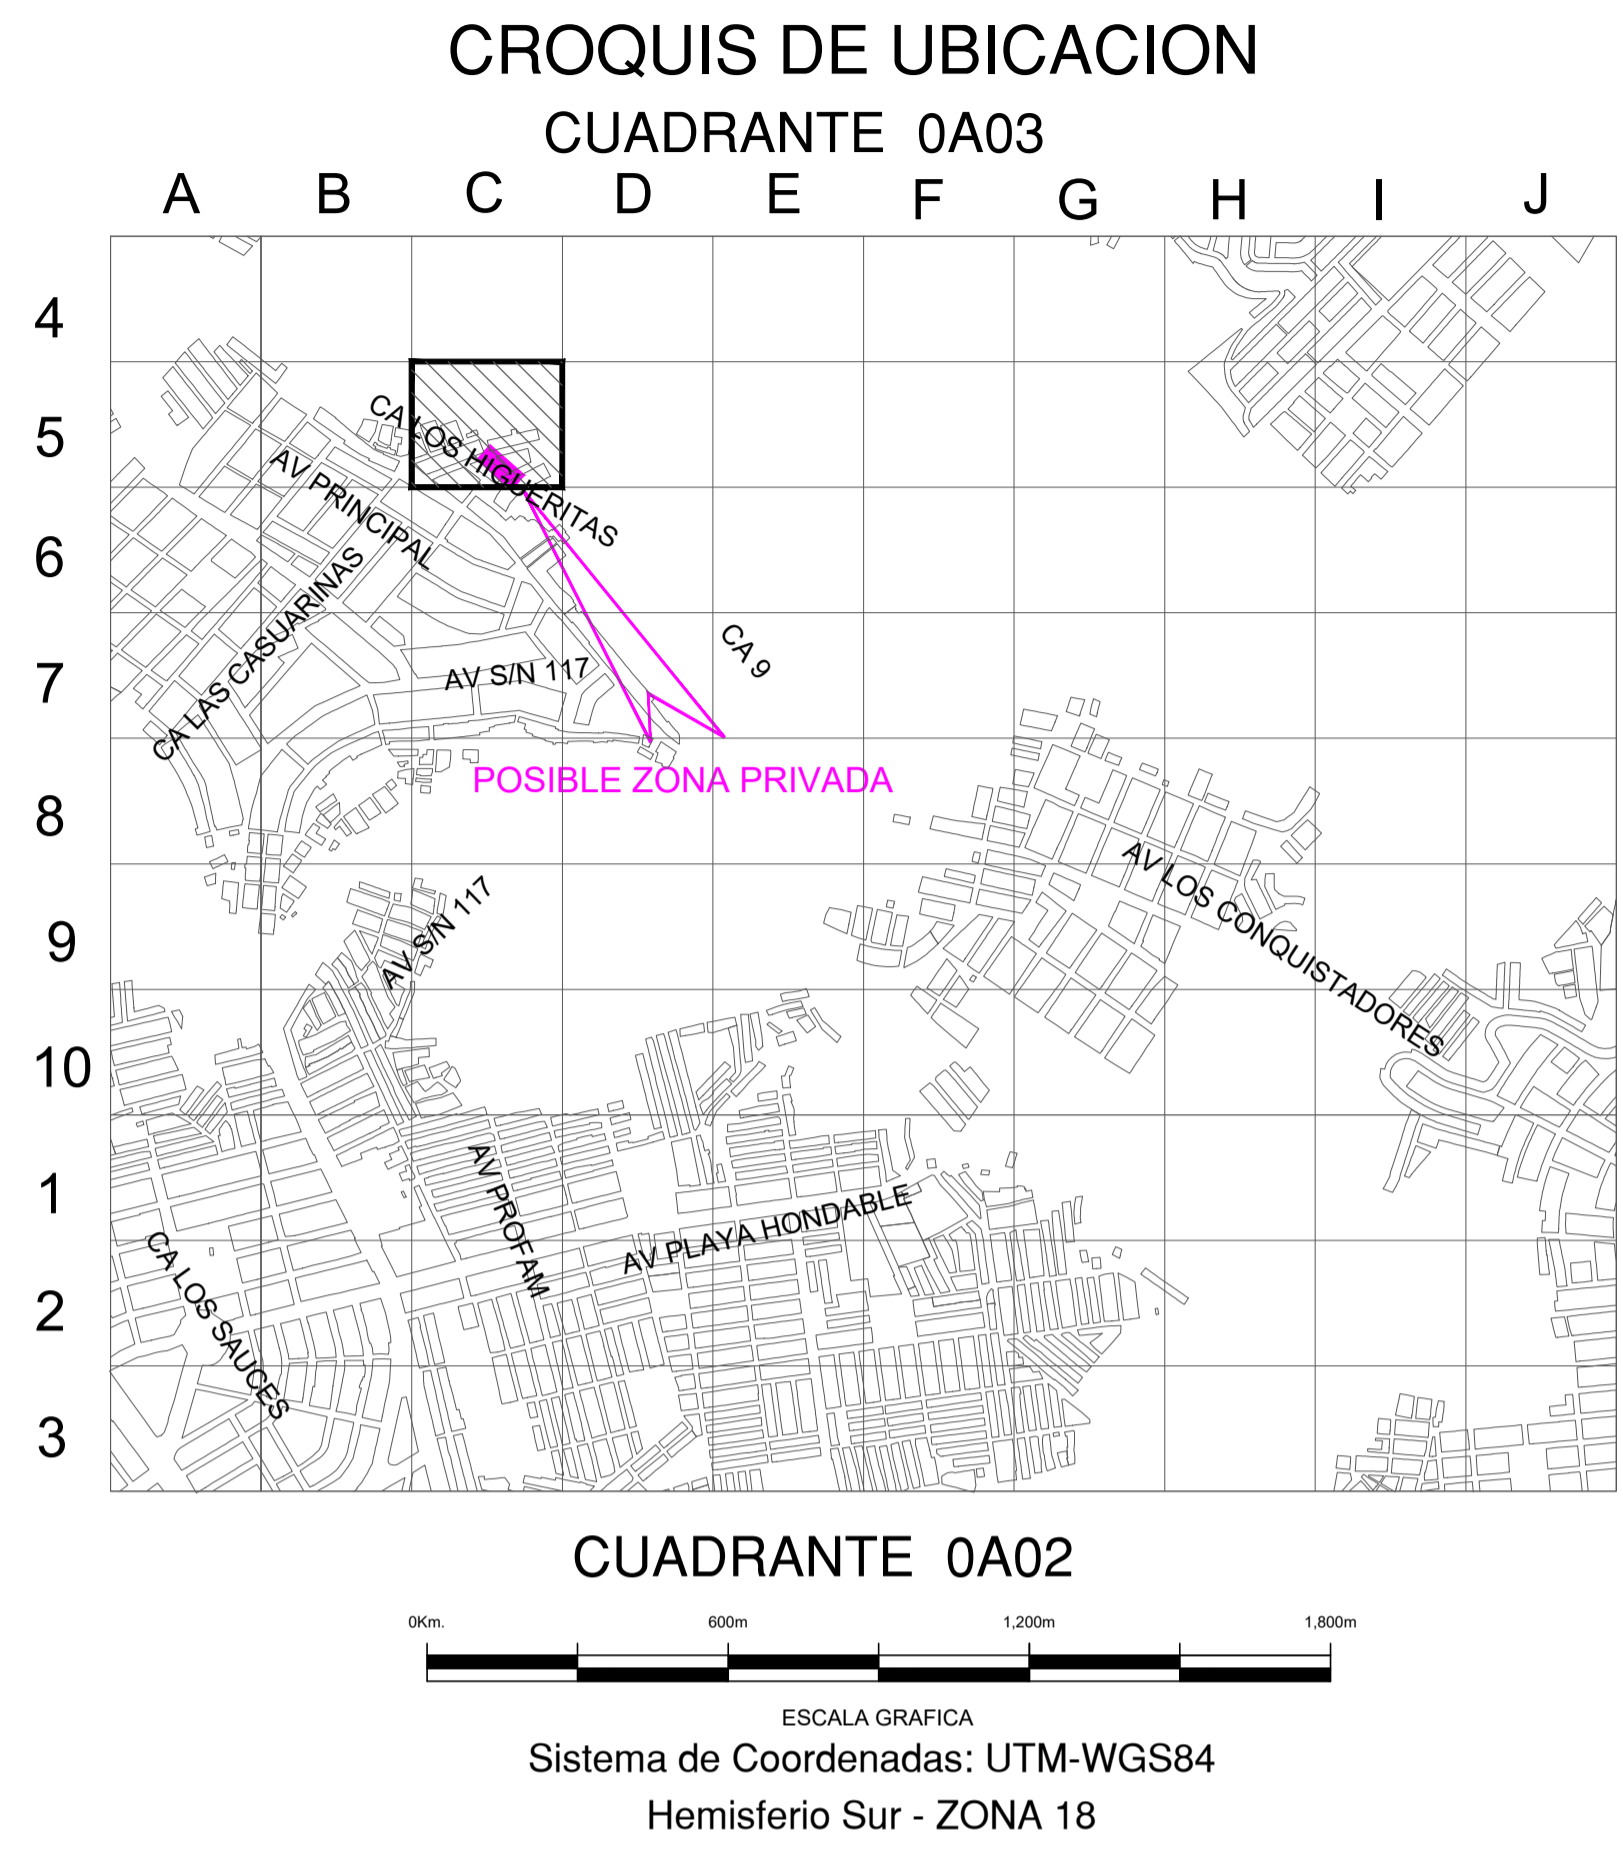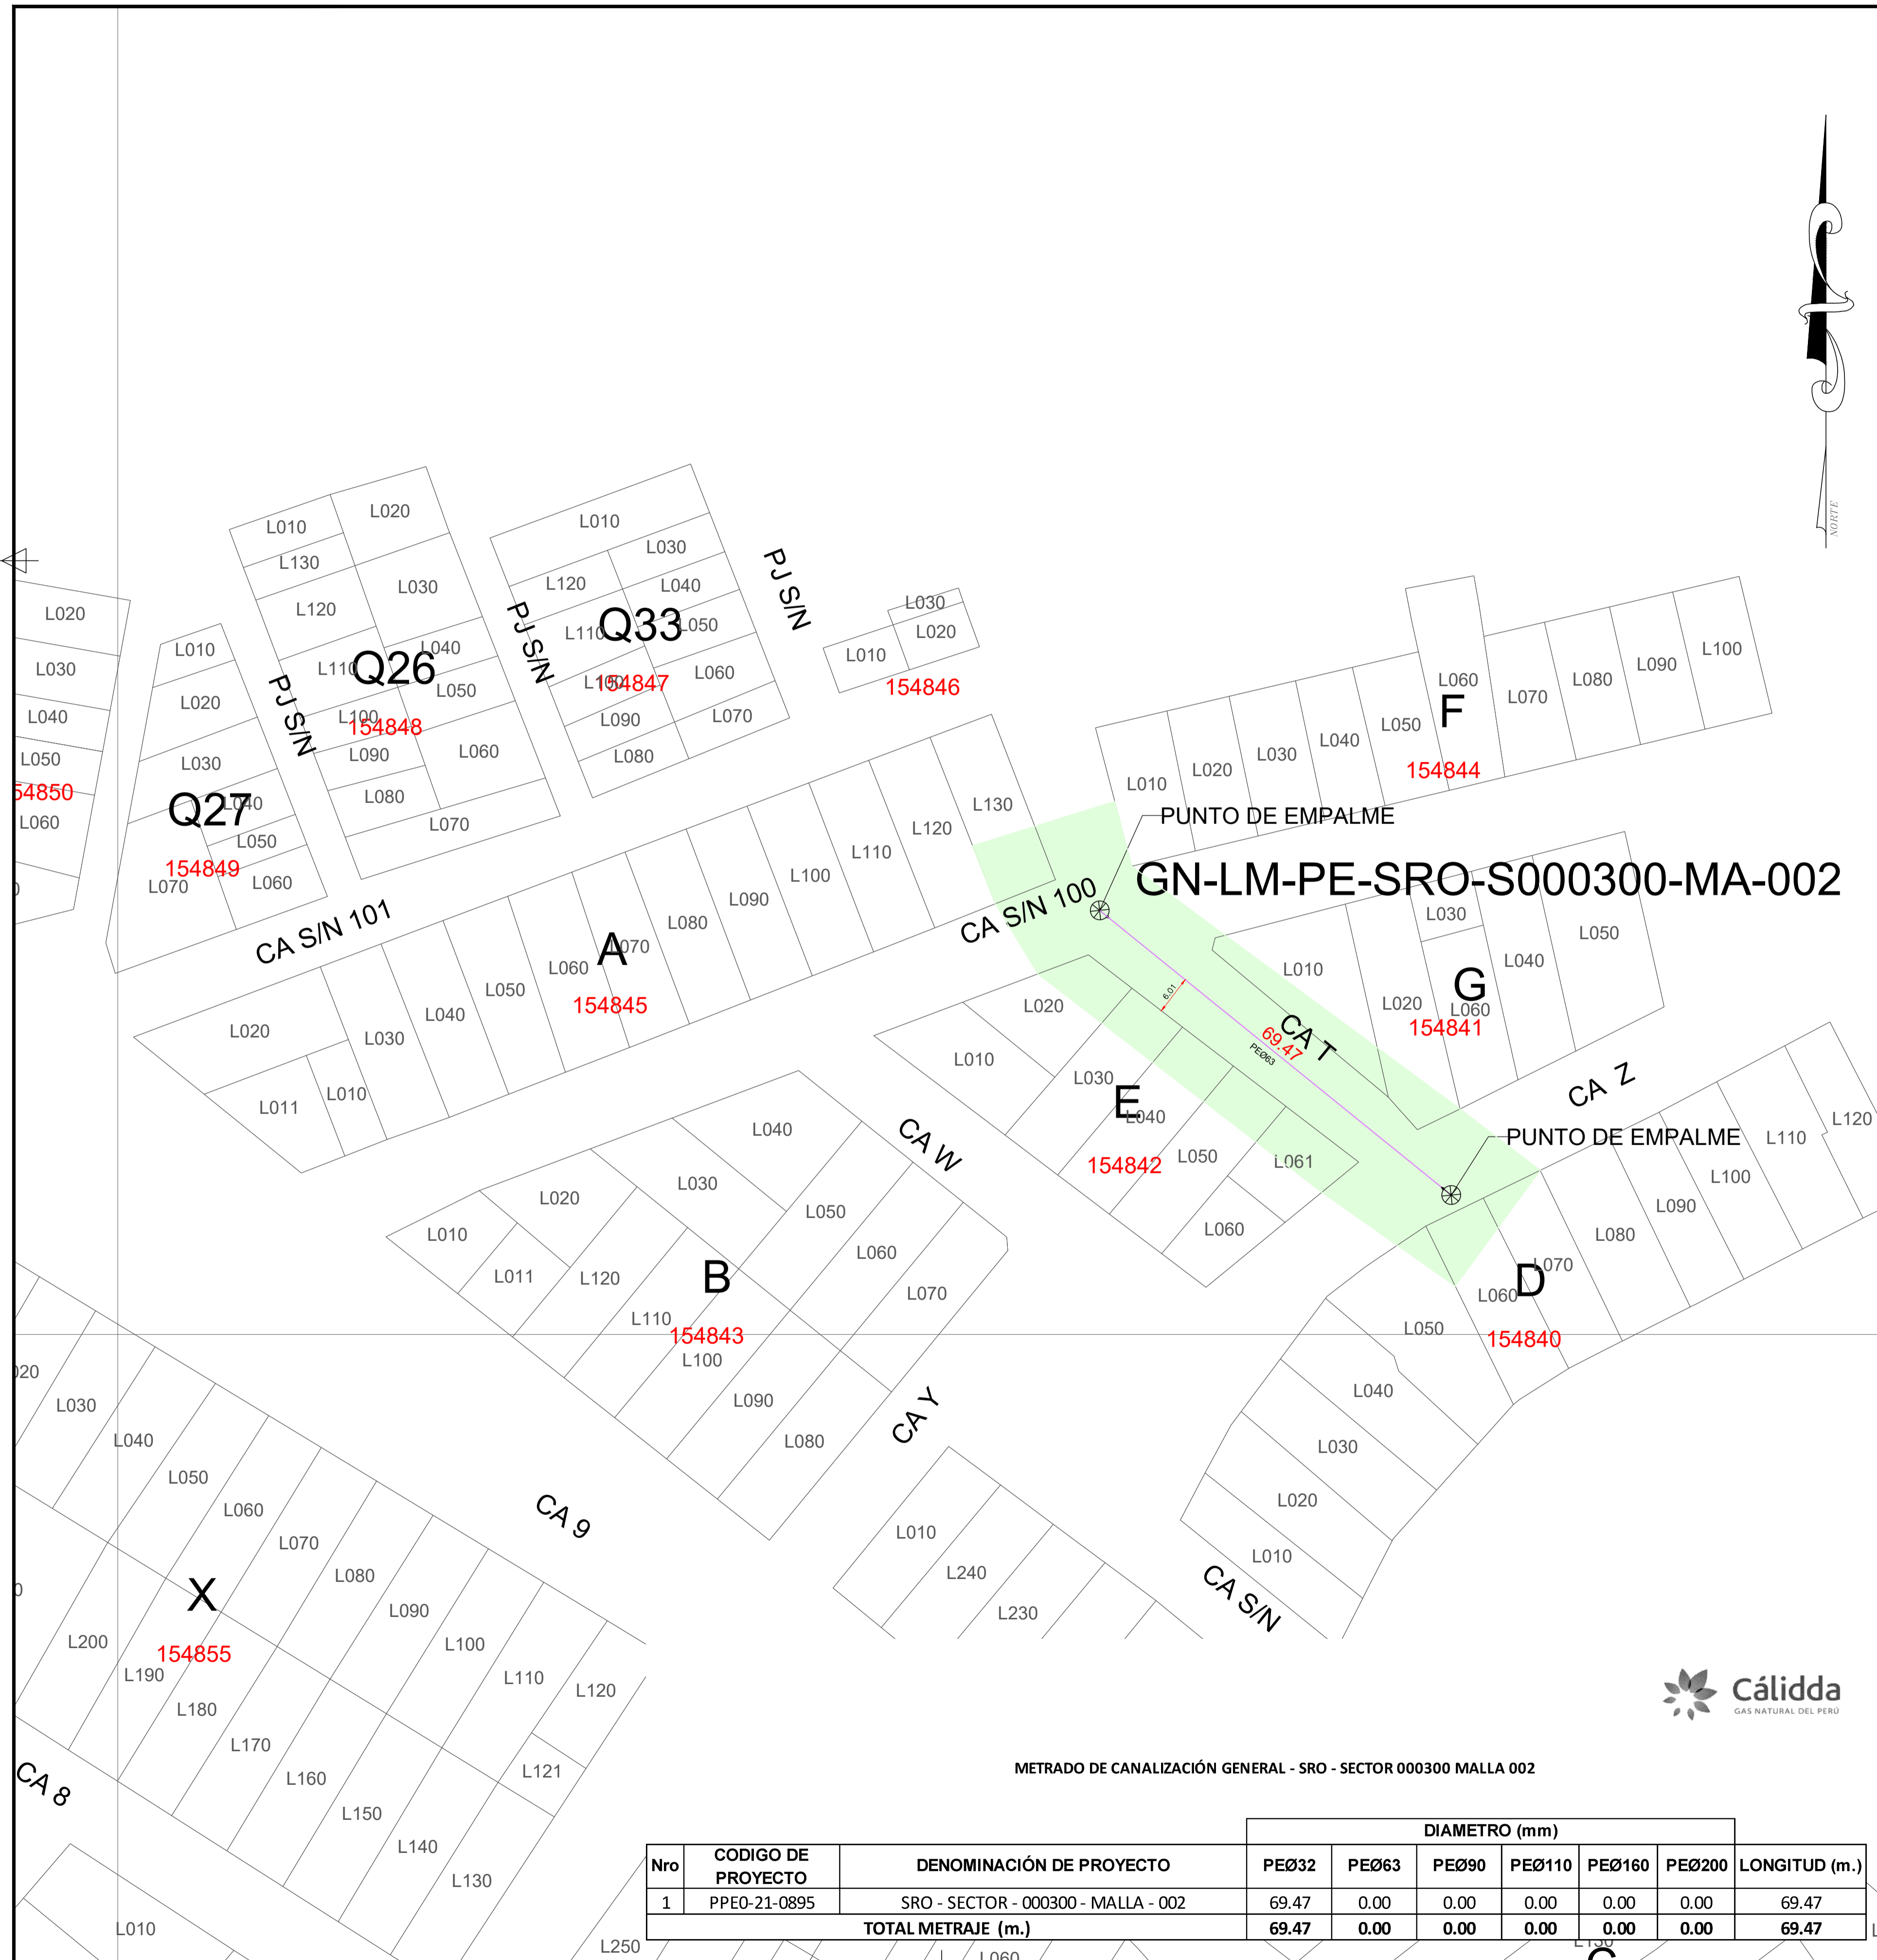

SRO - SECTOR 000300 MALLA 002

SIMBOLOGIA	
Válvula	Conexión con Sillita (TF)
Tapón	Conexión con Tapping Tee (ET)
Reducción	Conexión sin válvula de exceso de flujo
Transición AC-PE	Punto de Inicio de Progreso: 0.00
ERP	Punto Control Topográfico
Triducto	Punto de salida de cable de detección en superficie
Punto de empalme	Zona de protección mecánica de la red
Cableado	Tubo con tapado diferente a los típicos

TIPO DE LINEA	
TUBERIA PE #200mm	PE200
TUBERIA PE #150mm	PE150
TUBERIA PE #110mm	PE110
TUBERIA PE #90mm	PE90
TUBERIA PE #63mm	PE63
TUBERIA PE #50mm	PE50
TUBERIA PE #25mm	PE25
TUBERIA PE (CON GAS)	PE

Representante Técnico
(Contratista)

A	PARA PERMISO	14/10/2022	SDCB	JMGV	CDPM
REV.	DESCRIPCIÓN	FECHA	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ

LISTA DE REVISIONES

**REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL
EN LIMA Y CALLAO**

TITULO : PPE0-21-0895 - REDES DE POLIETILENO - SANTA ROSA
SRO-SECTOR 000300 MALLA 002
PLANO MAESTRO

DIBUJO : SDCB	FECHA : 14/10/2022	DISTRITO : SANTA ROSA	PLANO N° :	REV. :
REVISO : JMGV	ESCALA : 1/750	ZONA Y MALLA : SECTOR 000300 MALLA 002	PPE0-21-0895-00-PM-01	A
APROBO : CDPM	FILE : 1/1	REEMPLAZA : ---		

METRADO DE CANALIZACIÓN GENERAL - SRO - SECTOR 000300 MALLA 002


Nro	CODIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN DE PROYECTO	DIAMETRO (mm)						LONGITUD (m.)
			PEØ32	PEØ63	PEØ90	PEØ110	PEØ160	PEØ200	
1	PPE0-21-0895	SRO - SECTOR - 000300 - MALLA - 002	69.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.47
TOTAL METRAJE (m.)			69.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.47



CRONOGRAMA DE OBRA

PROYECTO: "SRO - SECTOR 000300 MALLA 002"

DISTRITO: SANTA ROSA

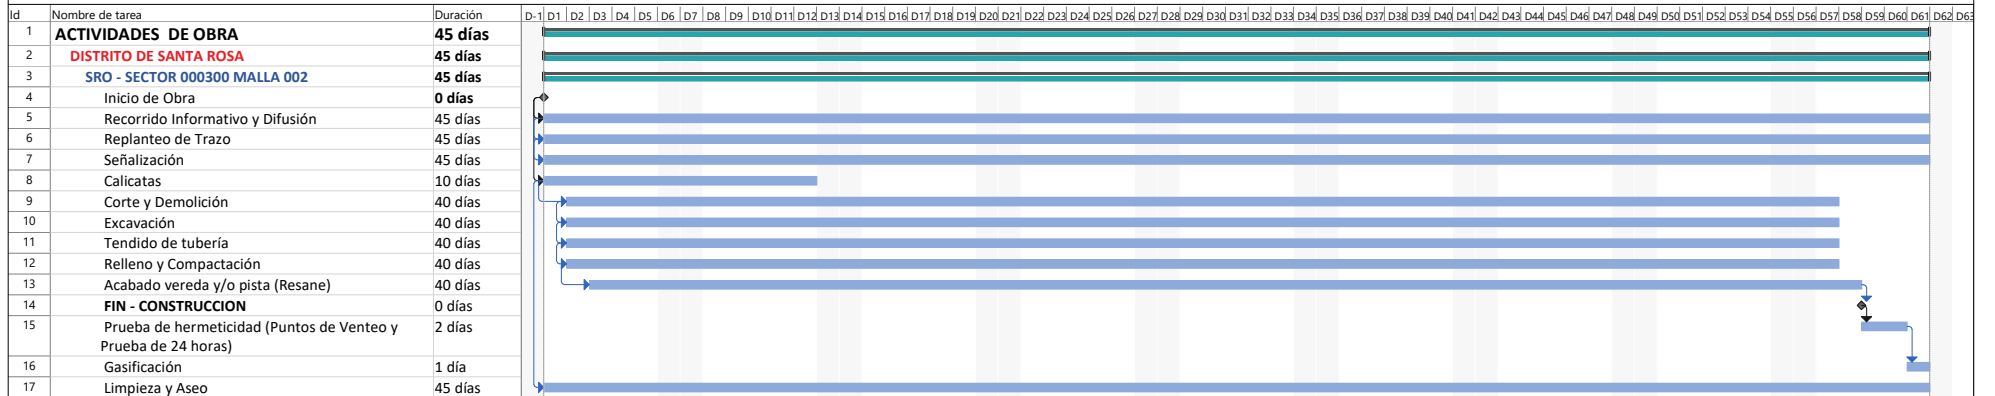

Tarea	[Barra azul]	Resumen del proyecto	[Barra gris]	Tarea manual	[Barra azul con línea superior]	solo el comienzo	[Cuadro azul]	Fecha límite	[Flecha verde]
División	[Puntos azules]	Tarea inactiva	[Barra blanca]	solo duración	[Barra azul con línea inferior]	solo fin	[Cuadro azul con línea superior]	Progreso	[Barra azul con línea superior]
Hito	[Diamante negro]	Hito inactivo	[Diamante gris]	Informe de resumen manual	[Barra azul con línea superior e inferior]	Tareas externas	[Barra gris]	Progreso manual	[Barra azul con línea inferior]
Resumen	[Barra verde]	Resumen inactivo	[Barra blanca]	Resumen manual	[Barra azul con línea superior e inferior]	Hito externo	[Diamante gris]		

Cargo de Recepción


 Firmado digitalmente por:
 ventanillavirtual.osinergrmin.gob.pe
 Motivo: Cargo de
 Recepción
 Fecha: 14/12/2022 20:13:00-0500

Su documento ha sido ingresado satisfactoriamente, por favor tome nota del número de expediente generado para realizar el seguimiento correspondiente.

Número de expediente: 202200261157 Fecha y hora de presentación: 14/12/2022 20:12

RUC: 20503758114

Nombre/Razón social: GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO S.A.

Correo electrónico: Casilla.Electronica@proveedores.calidda.com.pe

Nro. telefónico: 986180934

Documento: CARTA - s/n Nro. Folios: 7

Asunto: Comunicamos la variación a las obras previstas en el Plan Quinquenal de Inversiones y/o Plan Anual para el año 2022

Anexos: SI

Tipo	Documento	Nombre	Folio	Peso
Documento Principal	ComunicamosCuartaVariaciAn_14122022200523.pdf	Comunicamos la variación a las obras previstas en el Plan Quinquenal de Inversiones y/o Plan Anual para el año 2022	7	225 Kb
Anexo	Anexo1-Denegatoriadepermisos_1412202200534.zip	Anexo 1 - Denegatoria de permisos	1	39 Mb
Anexo	Anexo2-Demoradepermisos_14122022200558.zip	Anexo 2 - Demora de permisos	1	1 Mb
Anexo	Anexo3-ActuaciAndeTerceros_14122022200734.zip	Anexo 3 - Actuación de Terceros	1	6 Mb
Anexo	Anexo4-DetalledeProyectosareemplazarydereemplazo_14122022200905.xlsx	Anexo 4 - Detalle de Proyectos a reemplazar y de reemplazo	1	15 Kb
Anexo	Anexo5-Planosdezonasdereemplazo_14122022201233.zip	Anexo 5 - Planos de zonas de reemplazo	1	1 Mb

Usted podrá hacer el seguimiento de su trámite a través de <https://consultaexpedientes.osinergrmin.gob.pe/consulta-docs/>, de tener alguna consulta puede efectuarla a través de: ventanillavirtual@osinergrmin.gob.pe

ATENCIÓN: Usted se encuentra afiliado al Sistema de Notificaciones Electrónicas del Osinergrmin - SNE, cualquier notificación se realizará por ese medio, exceptuando las Solicitudes de Acceso a la Información Pública, cuya atención se realizará por el canal seleccionado.

En caso el cliente registrado en el formulario virtual corresponda a un tercero (persona natural o jurídica distinta al solicitante del trámite), el Osinergrmin creará una casilla electrónica de oficio al solicitante en la cual se realizará toda notificación.

Para ingresar a su casilla electrónica, actualizar sus datos y/o revisar sus notificaciones, sírvase ingresar al siguiente link: <https://notificaciones.osinergrmin.gob.pe/>

Cargo de Recepción

NOTA IMPORTANTE:

Para fines del cómputo de plazos, los documentos presentados los sábados, domingos y feriados o cualquier otro día inhábil, se consideran presentadas al primer día hábil siguiente.

El cargo de recepción del expediente no significa aceptación, aprobación o autorización al ejercicio de alguna actividad sujeta a supervisión o fiscalización del Osinergmin, resultando de aplicación lo dispuesto en los numerales 33.2 y 136.6 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Lima, 14 de diciembre de 2022

Señores,

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA - OSINERGMIN

Calle Bernardo Monteagudo N° 222, Magdalena del Mar.

Presente. -

Atención : Luis Enrique Grajeda Puelles
Gerente de Regulación Tarifaria

Asunto : Comunicamos la variación a las obras previstas en el Plan
Quinquenal de Inversiones y/o Plan Anual para el año 2022

Referencia : Decreto Supremo N° 001-2022-EM

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, nos es grato saludarlos y al mismo tiempo informarles que nuestra representada viene ejecutando las inversiones en infraestructura del Sistema de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos, consideradas en el Plan Quinquenal y Plan Anual para el año 2022. Lo expuesto, en cumplimiento de la Resolución de Consejo Directivo N° 079-2022-OS/CD que aprobó el Plan Quinquenal de Inversiones 2022-2026 y de la Resolución de Consejo Directivo N° 175-2022-OS/CD que aprobó la actualización del Plan Anual 2022.

Asimismo, mediante Decreto Supremo N° 001-2022-EM se dictaron modificaciones e incorporaciones para la ejecución de obras y el cumplimiento del Plan Quinquenal de Inversiones y Planes Anuales para la prestación del servicio de distribución de gas natural por red de ductos.

En virtud de lo anterior, se dispuso la modificación del artículo 63 d) del Texto Único Ordenado del Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos (en adelante, "TUO del Reglamento de Distribución"), donde se estableció que se podrá efectuar variaciones a las obras previstas en el Plan Anual y Quinquenal cuando: (i) exista denegatoria o retrasos en la emisión de los permisos, autorizaciones u opiniones técnicas por parte de las autoridades competentes, por causas no

imputables al Concesionario; o, (ii) existan actuaciones de terceros que impidan la ejecución de un determinado proyecto.

Teniendo en cuenta los supuestos de variación descritos, cumplimos con informar que los siguientes proyectos que forman parte del Plan Quinquenal de Inversiones y/o Plan Anual para el año 2022, no podrán ser ejecutados por Cálidda debido a que durante el presente periodo y pese a las gestiones realizadas: (i) hemos sido notificados con diversas resoluciones a través de las cuales las municipalidades distritales correspondientes denegaron los permisos respectivos para ejecutar los proyectos descritos a continuación; así como también tenemos expedientes donde no hemos obtenido respuesta a nuestra solicitud de autorización habiéndose superado el plazo legal¹; y, (ii) existen actuaciones de terceros que nos impiden la ejecución de los proyectos, específicamente, oposición de la misma población de la zona por donde estaba previsto el tendido de redes, a pesar de contar con los permisos municipales respectivos²:

Código Proyecto	Nombre Del Proyecto	Total (m)	Municipalidad	Causal de variación	N° de Oficio/Resolución
PPE0-21-1099	GN-LM-PE-CHO-S002800-MA-002	103	Chorrillos	Denegatoria de permisos	Carta N° 619-2022-MDCH-GDU-SOP
PPE0-21-1100	GN-LM-PE-CHO-S002800-MA-003	44	Chorrillos	Denegatoria de permisos	Carta N° 619-2022-MDCH-GDU-SOP

¹ **Artículo 63 d.-** El Concesionario podrá efectuar variaciones a las obras previstas en el Plan Quinquenal y el Plan Anual, en los siguientes supuestos:

(...)

- Luego de transcurridos treinta (30) días hábiles desde la presentación de la solicitud de emisión del mencionado permiso, autorización u opinión técnica; únicamente en caso de que no se cuente con un plazo establecido por la entidad de la administración pública para la emisión del permiso, autorización u opinión técnica requerida por el Concesionario.

² Cabe precisar que las mallas descritas en el cuadro, para los casos de denegatorias de permisos, están recogidas en los oficios emitidos por las municipalidades distritales (**Anexo 1**), mientras que la demora de permisos se constata con la solicitud de autorización y cartas reiterativas presentadas ante las municipalidades correspondientes (**Anexo 2**); por otro lado, para los casos de afectación de terceros, las mallas y el sustento se encuentran en los informes emitidos por nuestras empresas contratistas (**Anexo 3**).

PPE0-21-1318	GN-LM-PE-LRN-S001100-MA-000	325	Lurín	Denegatoria de permisos	Carta N° 067-2022-GDU/MDL
PPE0-21-2161	GN-LM-PE-LRN-S000800-MA-002	12	Lurín	Denegatoria de permisos	Carta N° 067-2022-GDU/MDL
PPE0-21-1322 (Tramo 1)	GN-LM-PE-LRN-S001200-MA-008	24	Lurín	Denegatoria de permisos	Carta N° 067-2022-GDU/MDL
PPE0-21-1322 (Tramo 2)	GN-LM-PE-LRN-S001200-MA-008	186	Lurín	Denegatoria de permisos	Carta N° 067-2022-GDU/MDL
PPE0-21-2152	GN-LM-PE-LRN-S000300-MA-004	203	Lurín	Denegatoria de permisos	Carta N° 067-2022-GDU/MDL
PPE0-21-0929	GN-LM-PE-SRO-S000900-MA-002	19	Santa Rosa	Denegatoria de permisos	Carta N° 058-2022-SOPPU-GDU/MDSR
PPE0-21-0895	GN-LM-PE-SRO-S000300-MA-002	78	Santa Rosa	Denegatoria de permisos	Carta N° 059-2022-SOPPU-GDU/MDSR
PPE0-21-0936	GN-LM-PE-SRO-S001100-MA-002	12	Santa Rosa	Denegatoria de permisos	Carta N° 062-2022-SOPPU-GDU/MDSR
PPE0-21-3373	GN-LM-PE-SMP-S007400-MA-014	94	San Martín de Porres	Denegatoria de permisos	Carta N° 330-2022-SGLHPU-GDU/MDSMP
PPE0-21-1326	GN-LM-PE-VMT-S008300-MA-006	99	Villa María del Triunfo	Denegatoria de permisos	Oficio N° 137-2022-SGPUCOPHU-GDU/MVMT
PPE0-21-2675	GN-LM-PE-VMT-S003500-MA-003	57	Villa María del Triunfo	Denegatoria de permisos	Oficio N° 249-2022-SGPUCOPHU-GDU/MVMT
PPE0-21-1330 (Tramo 1)	GN-LM-PE-VMT-S002400-MA-005	139	Villa María del Triunfo	Denegatoria de permisos	Oficio N° 248-2022-

					SGPUCOPHU-GDU/MVMT
PPE0-21-1330 (Tramo 2)	GN-LM-PE-VMT-S002400-MA-005	19	Villa María del Triunfo	Denegatoria de permisos	OFICIO N° 116-2022-SGPUCOPHU-GDU/MVMT
PPE0-21-1331	GN-LM-PE-VMT-S002500-MA-002	64	Villa María del Triunfo	Denegatoria de permisos	OFICIO N° 116-2022-SGPUCOPHU-GDU/MVMT
PPE0-21-1535	GN-LM-PE-PAC-S001201-MA-015	37	Pachacamac	Denegatoria de permisos	Carta N° 74-2022/SGPOP
PPE0-21-1536	GN-LM-PE-PAC-S001201-MA-016	22	Pachacamac	Denegatoria de permisos	Carta N° 74-2022/SGPOP
PPE0-21-2254	GN-LM-PE-PAC-S001201-MA-006	8	Pachacamac	Denegatoria de permisos	Carta N° 74-2022/SGPOP
PPE0-21-2267	GN-LM-PE-PAC-S001903-MA-003	95	Pachacamac	Denegatoria de permisos	Carta N° 72-2022/SGPOP
PPE0-21-2221	GN-LM-PE-PAC-S000300-MA-004	67	Pachacamac	Denegatoria de permisos	Carta N° 73-2022/SGPOP
PPE0-21-1997	GN-LM-PE-CAR-S000701-MA-006	18	Carabayllo	Denegatoria de permisos	Resolución de Sub Gerencia N° 1107-2022
PPE0-21-0772	GN-LM-PE-CAR-S000900-MA-005	131	Carabayllo	Denegatoria de permisos	Resolución de Sub Gerencia N° 1108-2022-SOP-GDUR-MDC
PPE0-21-0585	GN-LM-PE-VEN-S003900-MA-006	296	Ventanilla	Denegatoria de permisos	Carta N° 448-2022- MPC-GGDU
PPE0-21-2664	GN-LM-PE-VMT-S000200-MA-006	44	Villa María del Triunfo	Demora de permisos	Carta N° 2022-122972

					Carta reiterativa N° 2022-126223
PPE0-21-2177	GN-LM-PE-LRN- S001300-MA-011	43	Lurín	Afectación por terceros	Informe de nuestra contratista PA PERU
PPE0-21-0793	GN-LM-PE-CAR- S000901-MA-011	233	Carabayllo	Afectación por terceros	Informe de nuestra contratista GYA
PPE0-21-2078	GN-LM-PE-CIE- S000100-MA-005	1,949	Cieneguilla	Afectación por terceros	Acta de acuerdo elaborada nuestra contratista ALFACO
PPE0-21-2079	GN-LM-PE-CIE- S000100-MA-006	4,791	Cieneguilla	Afectación por terceros	Acta de acuerdo elaborada nuestra contratista ALFACO
TOTAL		9,212			

En vista de que tal escenario representa para Cálidda el impedimento de llevar a cabo la ejecución de las inversiones indicadas y encontrándonos inmersos en las causales antes descritas solicitamos a vuestro Despacho la variación del Plan Quinquenal de Inversiones y/o Plan Anual para el año 2022 de los proyectos referidos, los cuales serán reemplazados por aquellos detallados en el documento Excel adjunto a la presente comunicación como **Anexo 4** y que se encuentran graficados en el plano contenido en el **Anexo 5**.

Dichos proyectos, tal como se detalla en el documento Excel adjunto, cumplen con las condiciones establecidas en el artículo 63 d) del TUO del Reglamento de Distribución, lo cual significa que:

- (i) Se ejecutará el mismo monto de inversión o un monto mayor al destinado para la zona geográfica inicial en el Plan Quinquenal de Inversiones para el año 2022.
- (ii) Se atenderá el mismo o un mayor número de consumidores residenciales proyectados en la zona geográfica inicial. Los usuarios por atender


pertenecen a los mismos o menores niveles socioeconómicos de la zona geográfica inicial, conforme a lo determinado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI.

En base a lo expuesto, y en el marco de la respuesta recibida a nuestra primera variación por parte del Osinergmin mediante Oficio N°9705-2022-OS/DSR, cumplimos con informar para conocimiento la variación del Plan Quinquenal de Inversiones para el año 2022 conforme a lo detallado en la presente solicitud y sus respectivos anexos.

Por último, es preciso indicarles que a pesar de la presente solicitud de variación mantenemos nuestro compromiso de continuar realizando nuestros mayores esfuerzos para destrabar los proyectos que están siendo reemplazados y que sea viable su ejecución, con la finalidad de suministrar gas natural a la mayor cantidad de ciudadanos que se encuentren dentro de nuestra área de concesión.

Sin otro particular, quedamos de ustedes.

Atentamente,



Roberto Franco Gianoli Hanke
Apoderado Legal

Anexos:

- Anexo 1** : Cargos de las denegatorias de permisos.
- Anexo 2** : Copia del cargo de solicitud de autorización y carta reiterativa presentada ante las municipalidades correspondientes.
- Anexo 3** : Informes elaborados por nuestros contratistas.
- Anexo 4** : Documento Excel con el detalle de los proyectos dejados de ejecutar y los proyectos que cumplen con las condiciones de variación del Plan Quinquenal de Inversiones para el año 2022.
- Anexo 5** : Planos de los distritos donde se grafican los proyectos que se reemplazarán y los propuestos como variación.



CÁLIDDA
C. Morelli 150
C.C La Rambla, Torre 2,
Teléfono: (51-1) 611-7500
San Borja, Lima, Perú

